

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV West-Vlaanderen, Jan Breydelstraat 98, 8530 HARELBEKE
T: 056 70 54 05, E: btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

Verslagnummer:	0166-160927-03	Datum van het onderzoek :	27/09/2016
		Extra controle datums	

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : RONNY BERNAERT
IEPERSTRAAT 39 A
8840 STADEN

Visualisatie van de installatie


EIGENAAR : RONNY BERNAERT
Adres : IEPERSTRAAT 39 A
8840 STADEN

OPDRACHTGEVER : SERREYN KRIS
Adres : IEPERSTRAAT 72
8610 KORTEMARK

INSTALLATEUR : SERREYN KRIS
Adres : IEPERSTRAAT 72
8610 KORTEMARK

BTW of IK : 0651545040

EAN :	Teller nr.	2478199	Index :
-------	------------	---------	---------

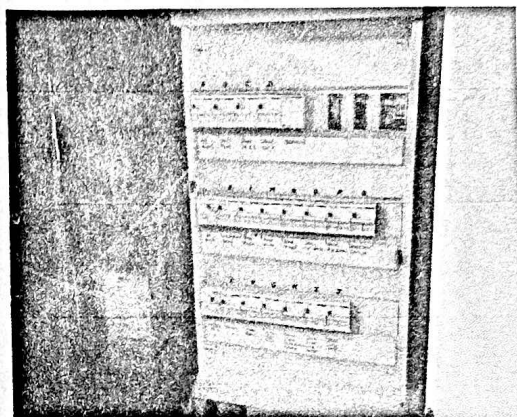

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Nieuwe Installatie /	Type der Lokalen :	wooneenheid
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	2 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	40 A
Type van de aardelektrode:	Baren	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	17
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA:	5 Ohm	RI tot	5 MOhm
-----	-------	--------	--------

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

Geen

Besluit

De installatie is conform.

De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.

De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/09/2041 (art. 271 AREI) alsook voor de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,

0166 DIMITRI VANDENBUSSCHE

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de elgen testinrichting;
 - de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.






STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 27/09/2041.

STAP 4

BTV West-Vlaanderen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Schema's

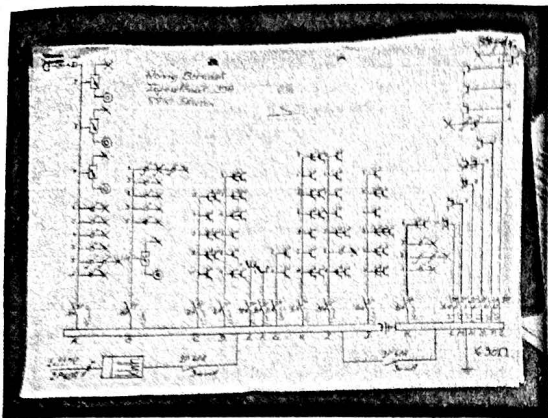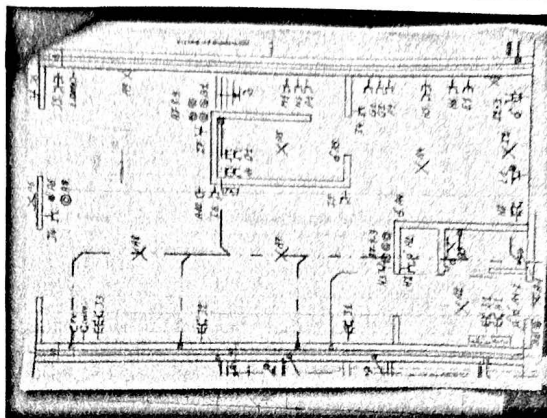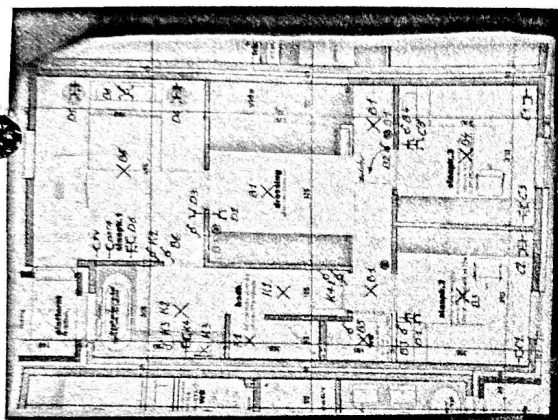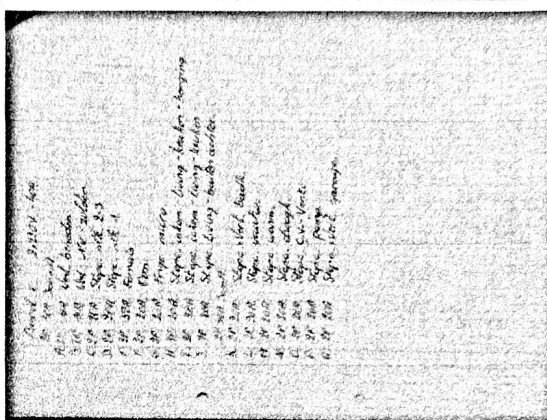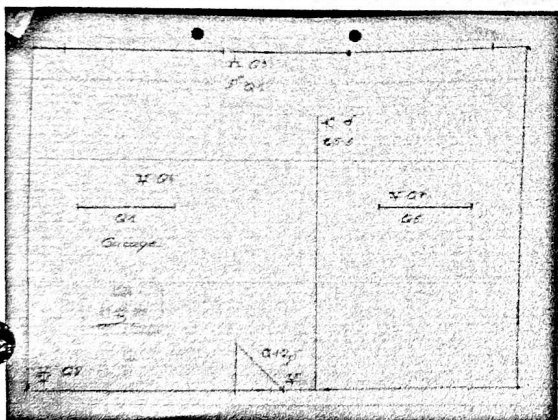

Naam aanvrager*	SERREYN KRIS		
Adres	IEPERSTRAAT 72		
(Postcode + gemeente)	8610	KORTEMARK	
BTW-nummer	0651545040	(*ontvangt de factuur van de keuring)	E-mail: kris.serreyn@gmail.com
Aanvrager wenst formulier te ontvangen:	per e-mail		

Keurder	Dimitri Vandenbussche	Bedrijf	BTV
Telefoon	+32 56 70 54 05	Adres	Neerveldstraat 109 bus 6
Badge nr.	10118		1200 Brussel

Gekeurde installatie			
Klant/titularis	BERNAERT RONNY	Watermeter nr.	150448797
Adres	IEPERSTRAAT 39A	Klantnr	
	8840 STADEN	Telefoon	
	<small>(indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)</small>		
Datum keuring	27/09/2016	Exploitant	De Watergroep West-Vlaanderen
De keuring betreft een	eengezinswoning		
Het betreft een	basiskeuring met inventarisatie renovatie		
De aanvrager geeft toestemming om het keuringsattest digitaal over te maken aan de exploitant: ja			

Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK	Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK
1. Uitvoeringsplan	Aanwezig		OK	18. Bidet	Nt Voorzien		
2. Toestellenlijst	Aanwezig		OK	19. Handsproeier bidet/WC	Nt Voorzien		
3. Centrale beveiliging	Aanwezig	EA	OK	20. Keukenkraan	Aanwezig	AA	OK
4. Tweedecircuitwater aanwezig	Aanwezig			21. Handsproeier keukenkraan	Nt Voorzien		
5. Bijvulling tweedecircuitwater	Nt Voorzien			22. Lavabo	Aanwezig	AA	OK
6. Wanverbinding	Nt Voorzien			23. Handwasbakje	Aanwezig	AA	OK
7. Bijvulling CV	Aanwezig	CA	OK	24. Uitgietbak	Nt Voorzien		
8. Warmwaterproductie op CV	Aanwezig	EA	OK	25. Zonneboiler/paneel	Nt Voorzien		
9. Waterverwarmingstoestellen	Nt Voorzien			26. Zwembadverwarming	Nt Voorzien		
10. Waterbehandeling	Nt Voorzien			27. Zwembadbijvulling	Nt Voorzien		
11. Kraan voor slangaansluiting	Aanwezig	BEL	OK	28. Urinoir	Nt Voorzien		
12. Bad: uitloop kraan	Aanwezig	AA	OK	29. Afvoer beveiliging(en)toestel(len)	Aanwezig	Y	OK
13. Handsproeier badkraan	Aanwezig	EB	OK	30.			
14. Automatische badspoeling	Nt Voorzien			31.			
15. Douche met vaste kop	Nt Voorzien			32.			
16. Douche met handsproeier	Aanwezig	BEL	OK	33. Drukverhoging	Nt Voorzien		
17. WC	Aanwezig	RW	OK	Pictogrammen	Nt Voorzien		

Opmerkingen

GEEN

☐ om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvulsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken!

CONFORMITEITSVERKLARING

De binneninstallatie is: **conform**

PRIVÉWATERAFVOER

De privéwaterafvoer is: geen attest aanwezig

Belangrijk: deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor de toestellen en installatie, die opgenomen werden in het uitvoeringsplan en in de lijst van toestellen, en geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht.

Keuringsattest Nr.: HB-1044500

Ref 1: 166/160927/04

Ref 2:

V.U.: AquaFlanders vzw - uitgave 01/01/2012
