

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 29/10/2024

Inspecteur: Laurens Vandeputte

Mentor:

Installateur: Gianni Vervaeke

ID-label:

B.T.W. nr.:-

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102
BT

Serienummer: 23120873

Datum verslag: 29/10/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Roeselaarsestraat
Huisnummer 8
Busnummer
Postcode 8890
Gemeente Moorslede
Land België

Eigenaar

Naam Gianni Vervaeke
Straatnaam Roeselaarsestraat
Huisnummer 8
Busnummer
Postcode 8890
Gemeente Moorslede
Land België

Installateur

Naam Gianni Vervaeke
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -


Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: : 6153195

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

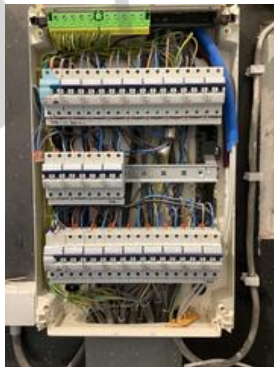

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor
01/06/2023?

Ja

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 20


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 3,94 MΩ

RE: 13,08 Ω

OK

OK

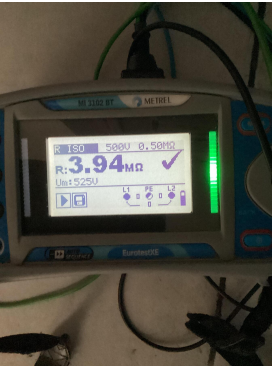

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63	-	-	A	20	OK	OK
30	63	-	-	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	C	16		2	1,5
1	C	16	Reserve	2	-
15	C	20		2	2,5
1	C	25		2	4

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	Directe aanraking	NOK	Indirecte aanraking	NOK
Aansluitingen	NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	NOK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)	gegevens ontbreken zoals : adres & installateur
I4.01 Hoofdequipotentiaal verbindingen dienen verwezenlijkt worden, ontbreken, zijn niet geel-groen, onvolledig, <6mm². (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.1. en 5.1.6.2)	water en gas
I6.01 Een verzegelbare differentieelstroombeschermingsinrichting dient geplaatst te worden aan het begin van de installatie. (Boek 1 Onderafdeling 4.2.4.3.)	aftakdoos aanwezig voor het door verbinden van de teller naar het verdeelbord. aftakdoos is niet verzegelbaar, aftakkingen voor hoofddiff zijn hierdoor mogelijk. Hoofddiff zelf werd verzegeld.
I8.07 Leidingen zijn te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.2. en 5.2.9.)	Elektrische leidingen te scheiden van niet-elektrische leidingen. minstens 2cm afstand. (kelder)
I8.08 De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen, kabelgoten geïnstalleerd worden. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.9.3. en 5.2.9.6.)	VOB draden correct in te brengen in aftakdoos.
I9.02 Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (Boek 1 Onderafdeling 1.4.1.3.)	aftakdoos moet gemonteerd worden zoals bedoeld. (kelder)
nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.	
Nota: De installateur verklaart dat de aanvang van de installatie van voor 01/06/2023 gestart is.	
Nota: situatieschema kon niet worden opgenomen in het verslag.	

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken tegenover dit Boek worden vastgesteld tijdens de gelijkvormigheidscontrole mag in gebruik worden genomen.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 13:54 tot 14:40


De inspecteur Laurens Vandeputte




Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

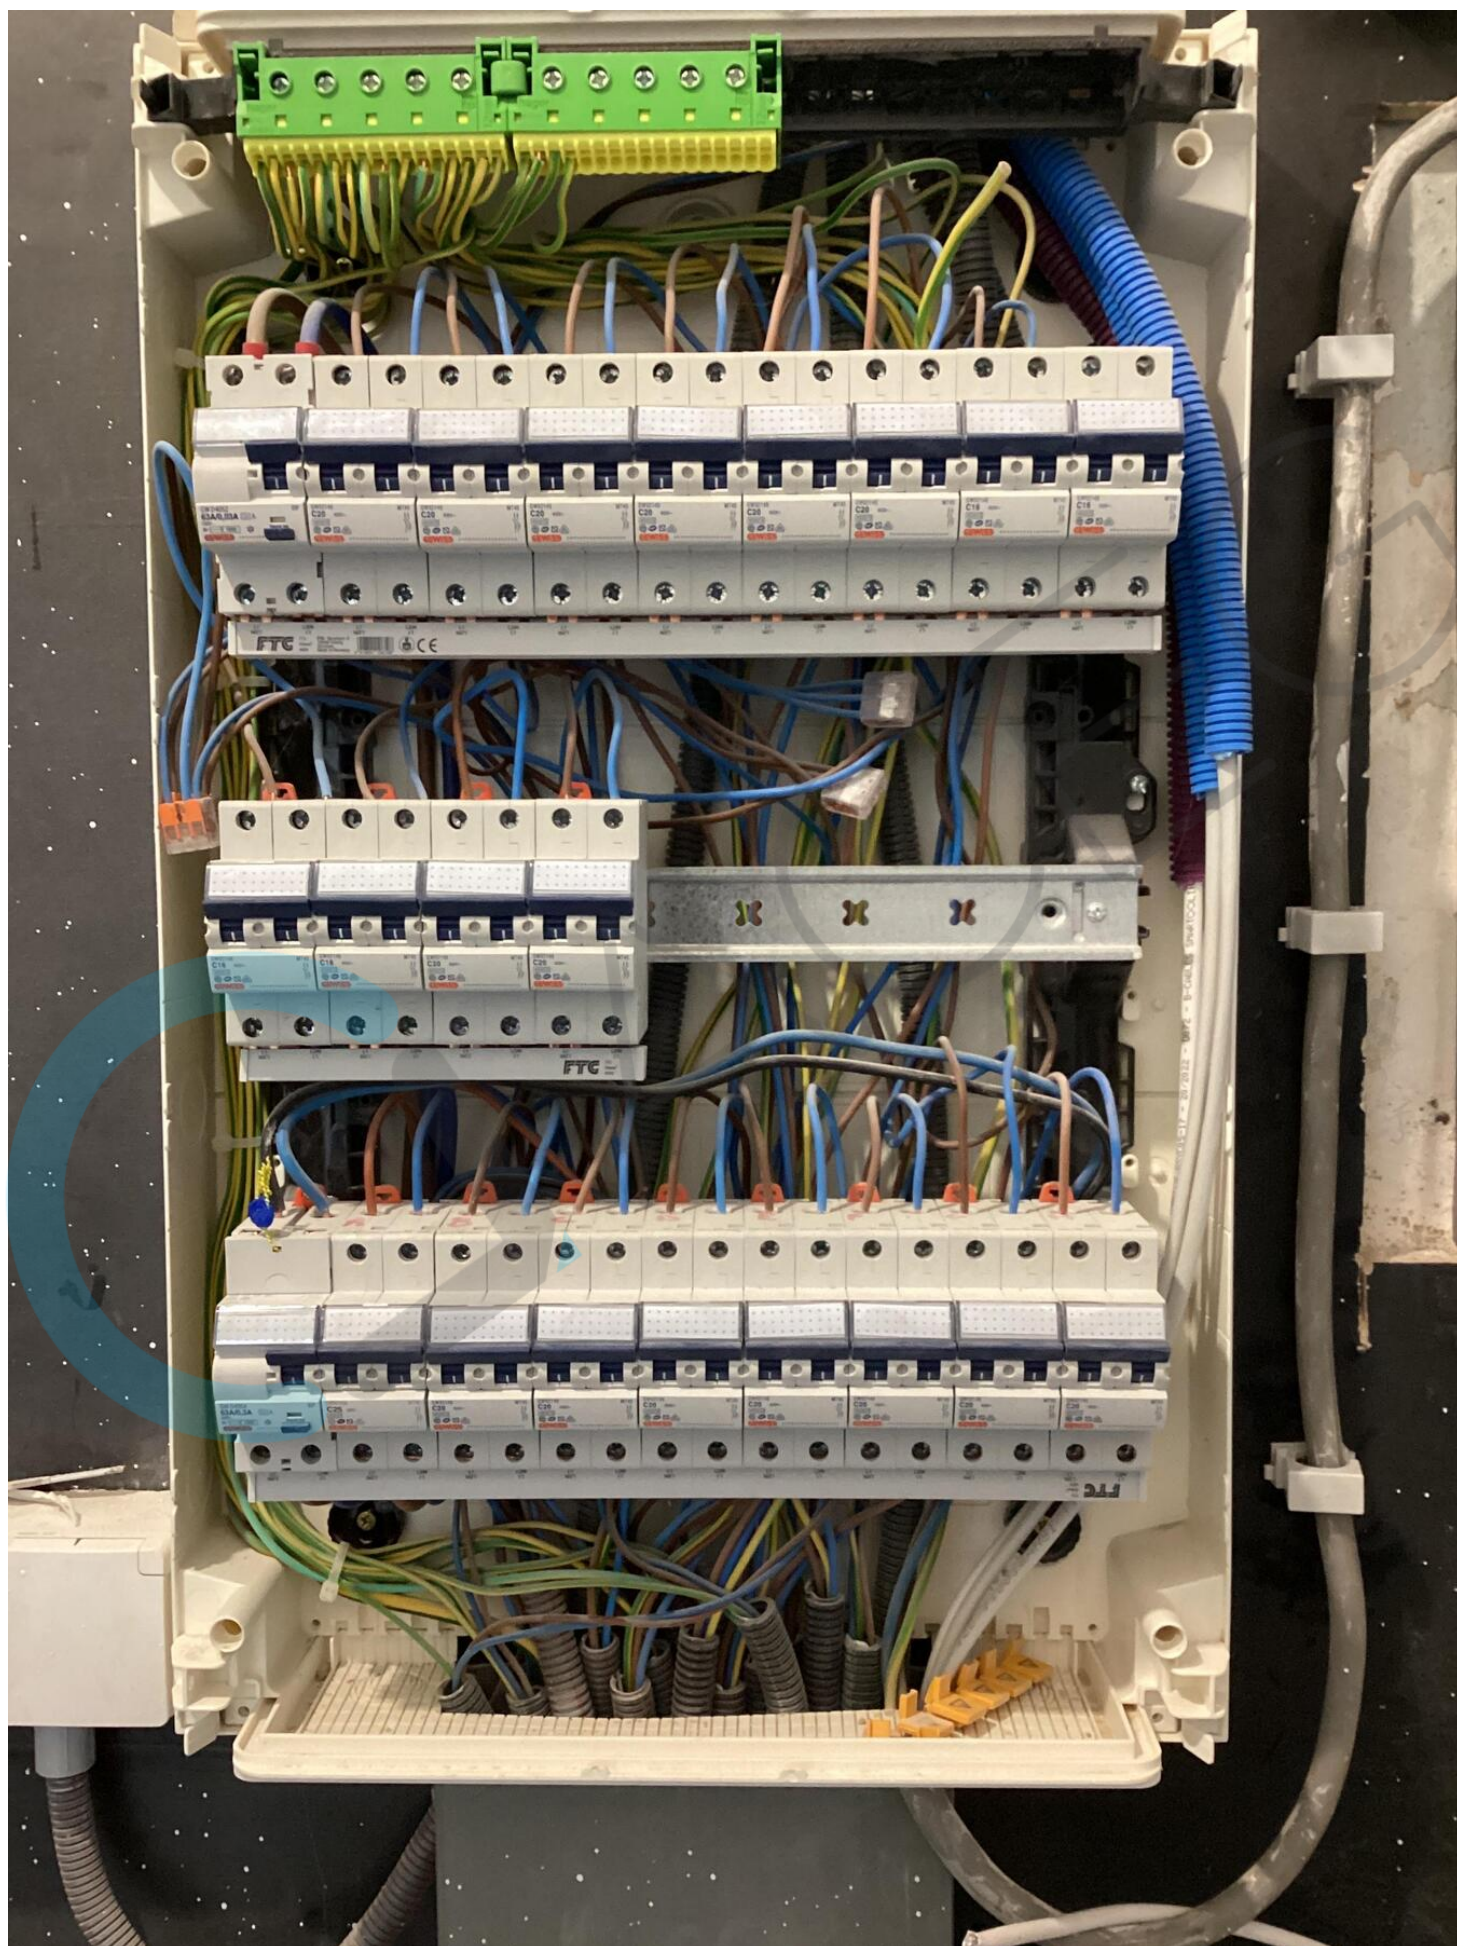


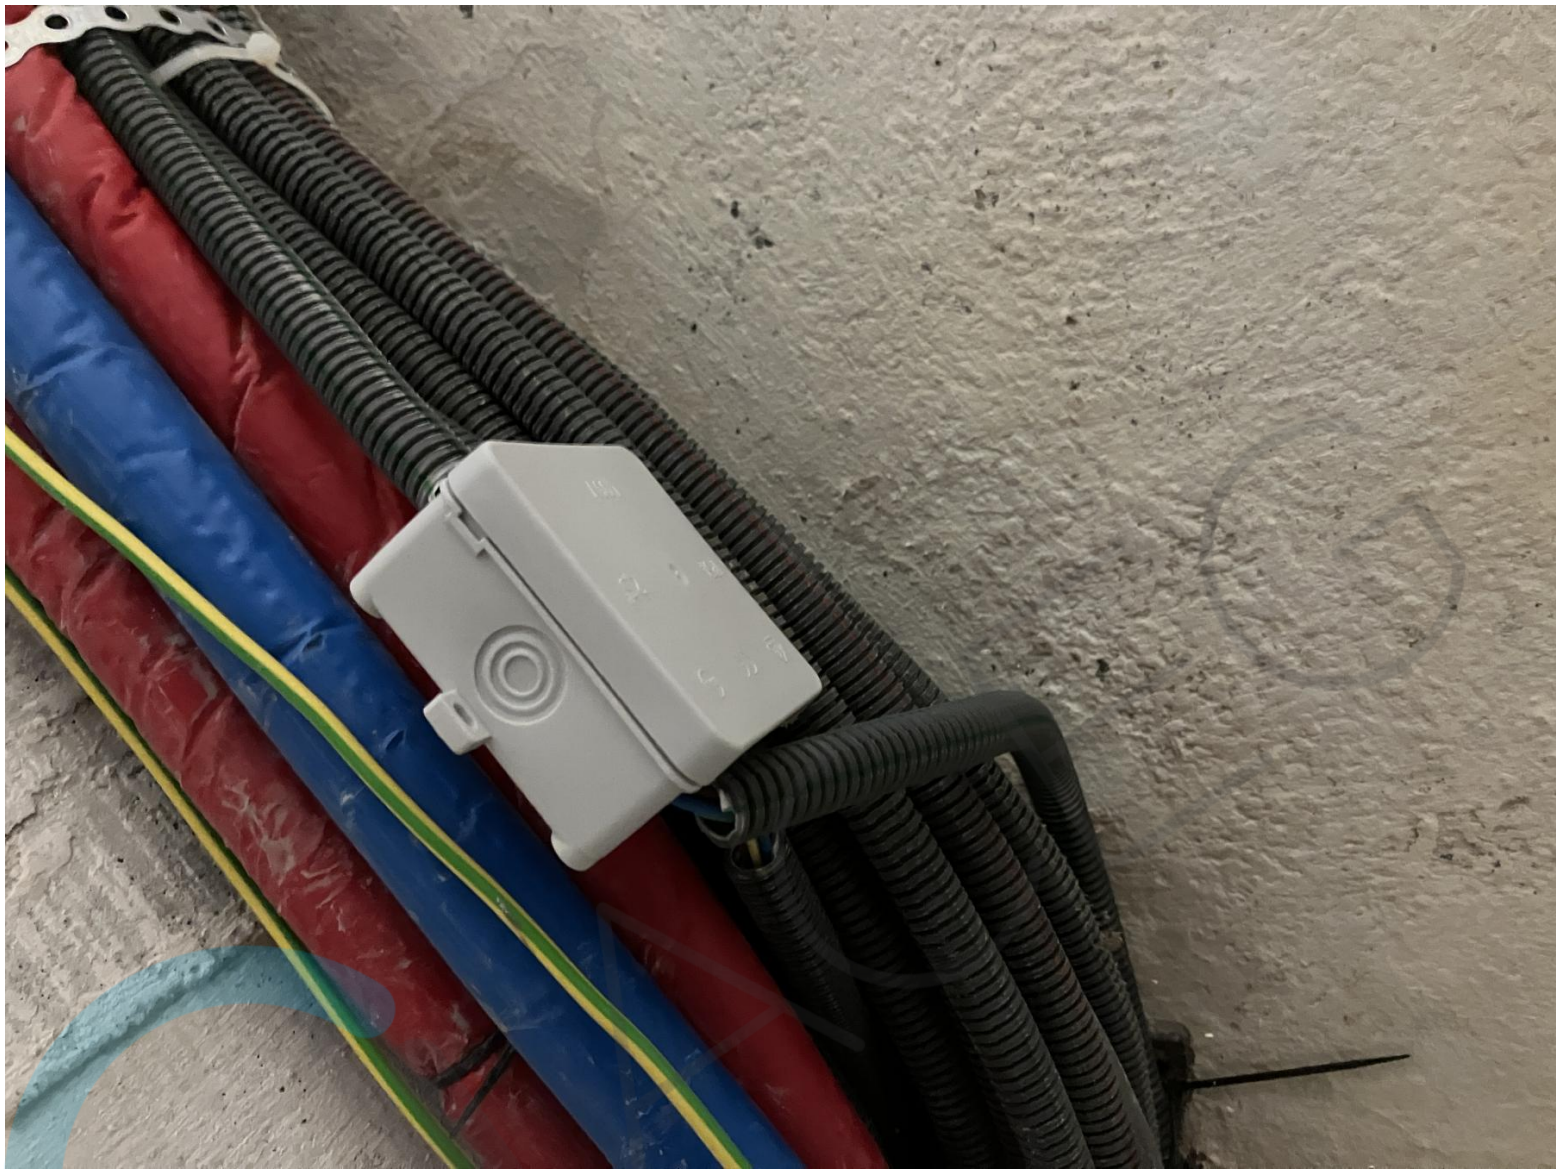








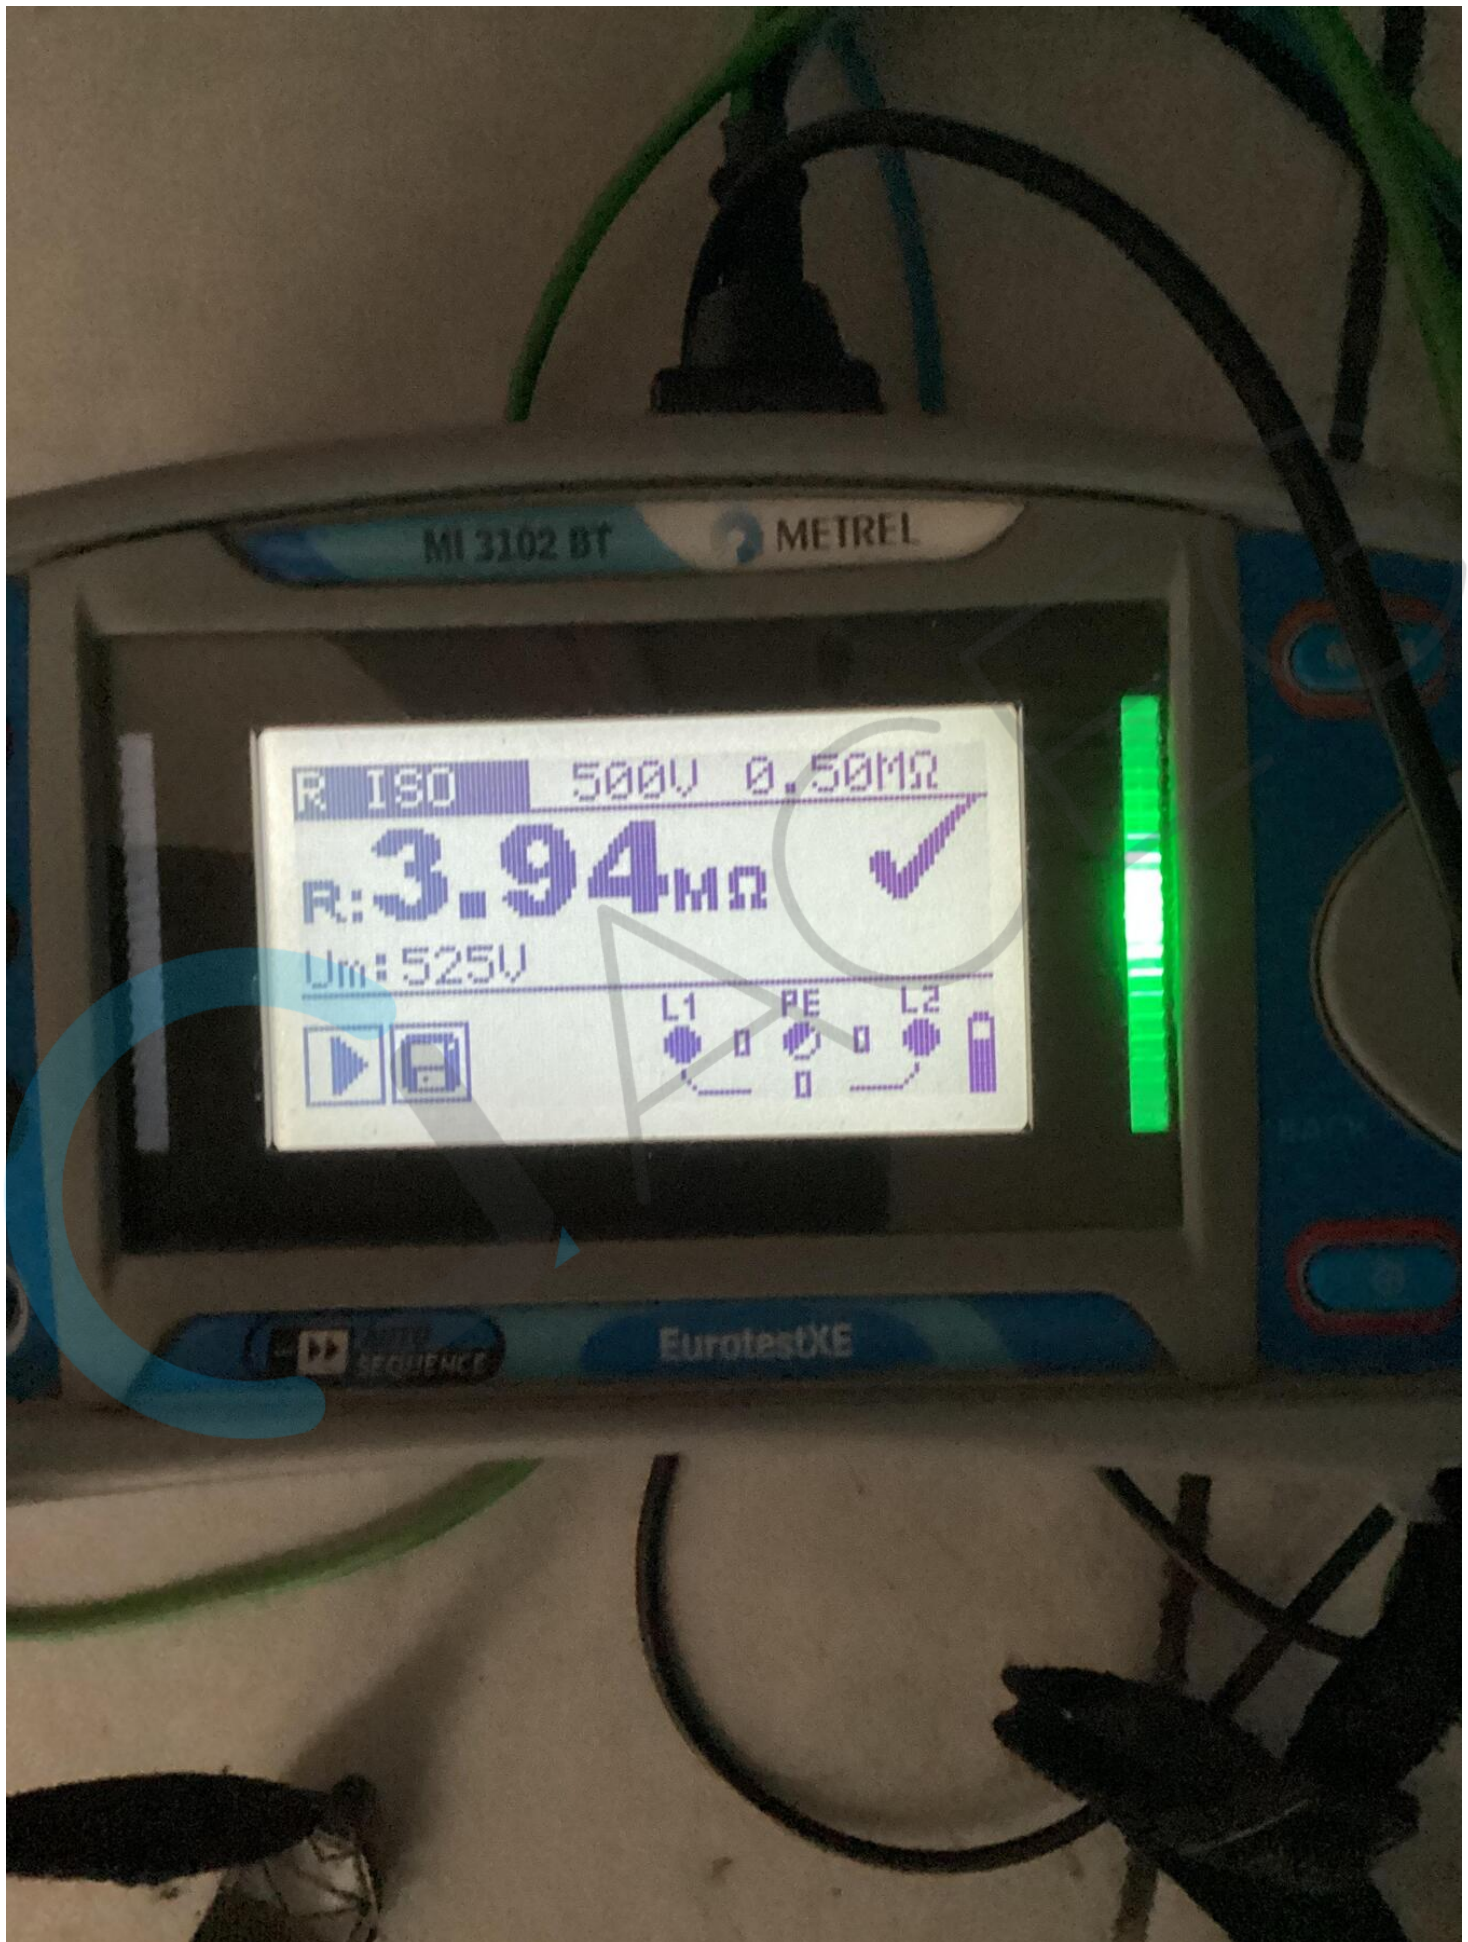

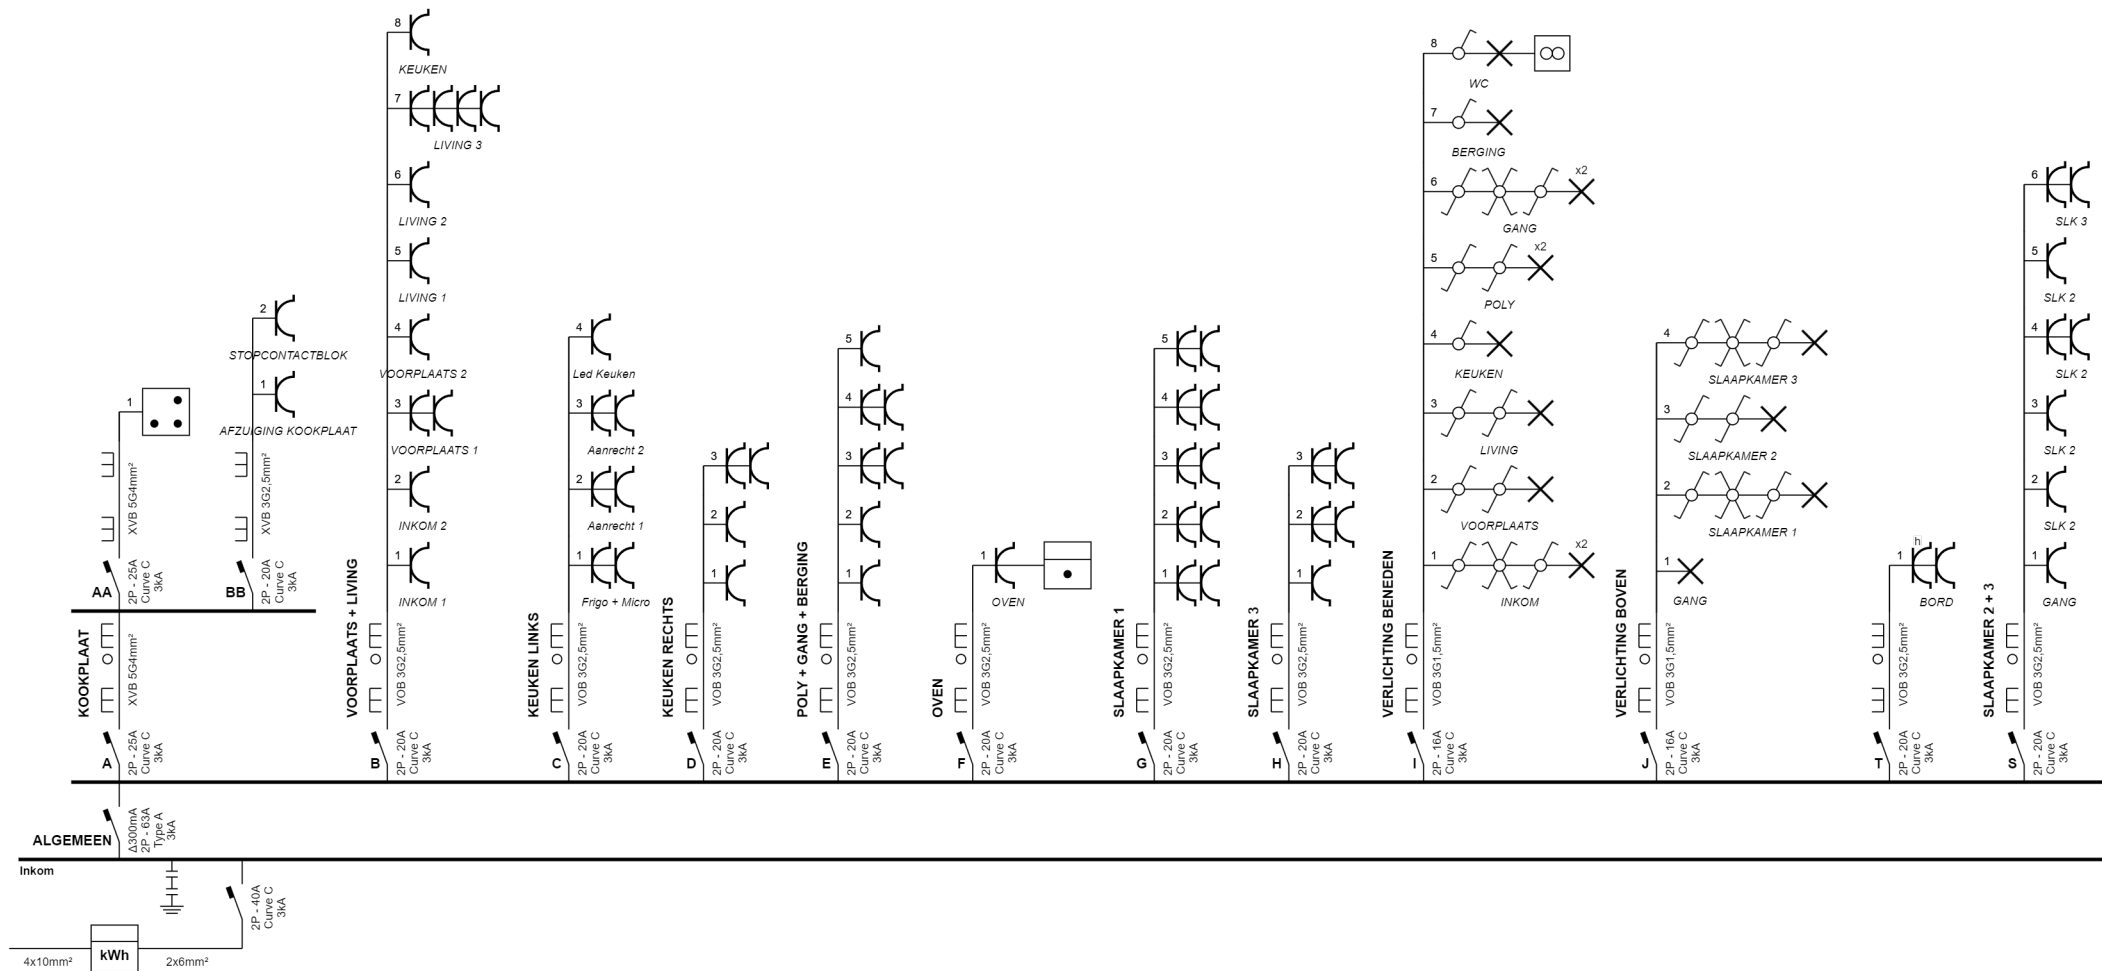


Erkend Organisme

Plaats van de elektrische installatie
Gianni Vervaeke
Roeselaarsestraat 8
8890 Moorslede
e-mail: gianni.vervaeke@gmail.com

Installateur
idem

pagina. 1/2
Eendraadschema

Aanvang elektriciteit
installatie dateert van
voor 1/06/2023

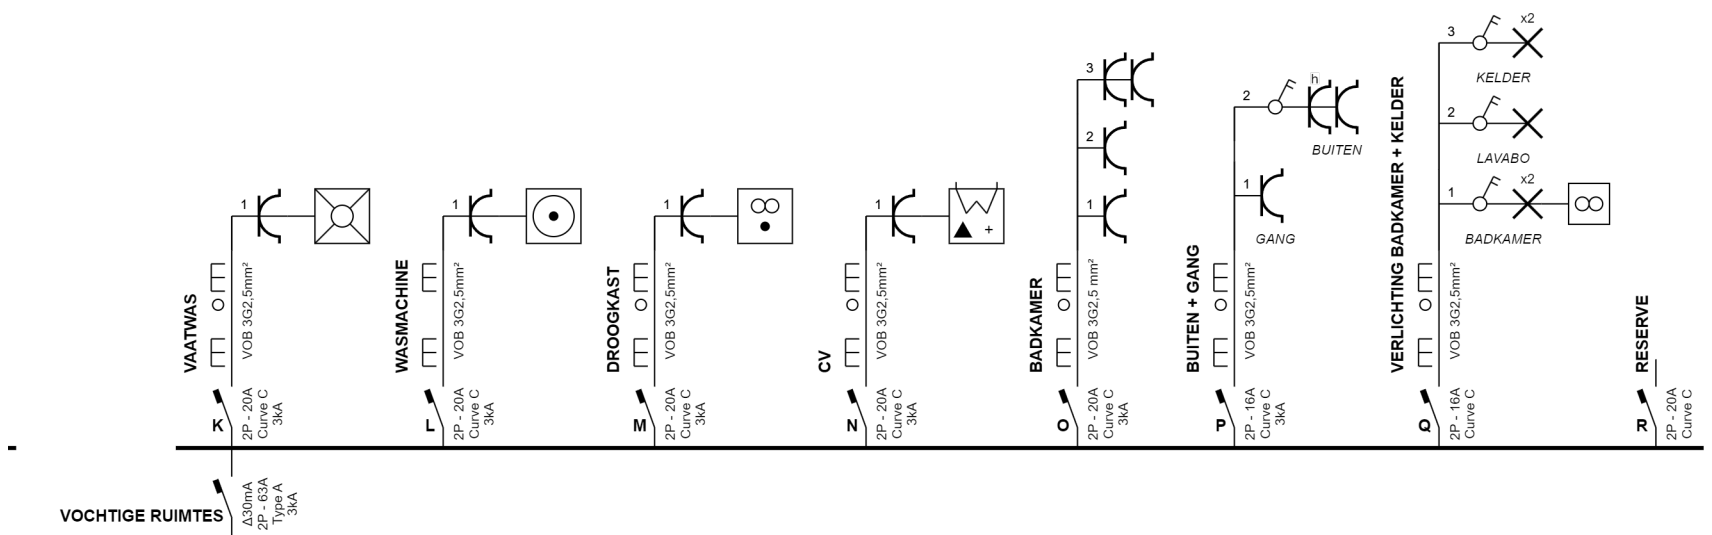

Erkend Organisme	Plaats van de elektrische installatie Gianni Vervaeke Roeselaarsestraat 8 8890 Moorslede e-mail: gianni.vervaeke@gmail.com	Installateur idem	pagina. 2/2 Eendraadschema Aanvang elektriciteit installatie dateert van voor 1/06/2023
Getekend met https://www.eendraadschema.goethals-jacobs.be			
