

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 22/05/2026

Inspecteur: Luc De Schutter

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 18460126

Datum verslag: 22/05/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kapelsesteenweg
Huisnummer 258
Busnummer
Postcode 2930
Gemeente BRASSCHAAT
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam Kapelsesteenweg
Huisnummer 258
Busnummer
Postcode 2930
Gemeente BRASSCHAAT
Land België

Installateur

Naam Enveco
BTW nr. BE 0840 010 595
Telefoonnummer 0473 89 31 20
E-mail natascha@envecoprojects.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820071764151

Teller Nr. : 1SAG1100780883



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Aantal kringen: 19

Meter / bord verbinding: 10 mm²



Max beveiliging: 50 A

Ri algemeen: 1,498 MΩ

RE: 9,93 Ω

OK

OK

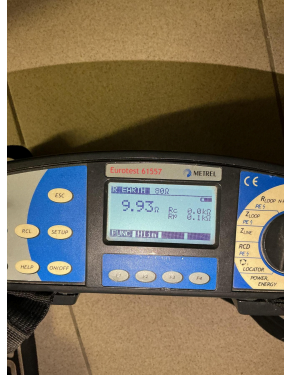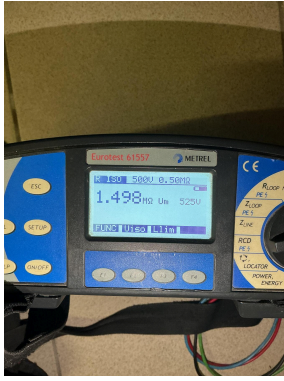

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	19	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	B	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
15	C	20		2	2,5
3	C	16		2	1,5
1	C	6		2	1,5
1	C	32	Laadpaal	2	6

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I1.04 Situatieschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I6.03 De nominale stroomsterkte van de algemene en/of bijkomende differentieelschakelaar dient aangepast te zijn aan de overstroombeveiliging. (Boek 1 Afdeling 4.4.1.)

Gevoelige diff is 40A

N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 22/5/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:02 tot 12:53

De inspecteur Luc De Schutter

Luc De Schutter
ACEG VZW - #263

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.


De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

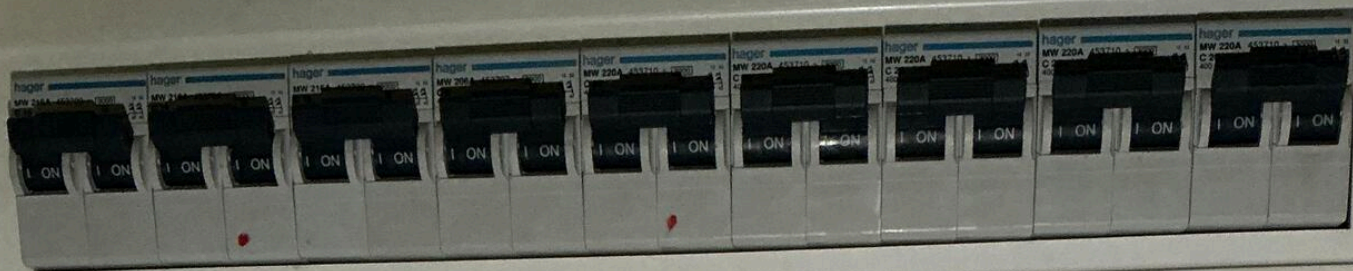

A LICHT BOVEN ZOLDER 1HK009	B LICHT STUDIO BUREAU BEL KITCHENETTE BUITEN VOOR ADAPTER 25 KANT	C LICHT GARAGE WASPLAATS KEUKEN WOONKAMER	D ALARM	E STOP SLAAPKAMERS 1 2 CV	F STOP SLAAPKAMERS 3 4 AUTMATICHE POEKT	G STOP GARAGE WASPLAATS 1 KEUKEN TV	H STOP BUREAU 5 STUKS	I STOP STUDIO 4ST BUREAU 4ST
---	---	--	------------	---------------------------------------	--	--	--------------------------------	---------------------------------------



J STOP WOONKAMER 1HK009	K TOILETHUIS	L STOP KITCHENETTE	M STOP KEUKEN	N OVEN	O OVEN						
----------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--



S HOOFDVERLIJBS STROOMSCHA- KELAAR	T VERLIJBSSTROOM SCHA- KELAAR P Q R S	P BAOKAMERS	Q WASMACHINE	R DROOGKAST	T VAARWASSER
---	---	----------------	-----------------	----------------	-----------------

