

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: GEEN@GEEN.BE



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 5361203
Voorl. verslagnr.:
Datum: 03/04/2020

Klant / Opdrachtgever:
Julien Van Hoecke
Diestsesteenweg 370
3202 RILLAAR

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: gedeeltelijk vernieuwd Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: JULIEN VAN HOECKE DIESTSESTEENWEG 370 RILLAAR 3202
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/278
Datum onderzoek: 03/04/2020 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/04/2045 Onderzoeker: FAES KRISTOF
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: / Teller nr.: 5449073 Stand I: 50218 Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: bestaand Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 10 mm² spreidingswaarde: 25,5 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende diff.: 2p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 52,1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 16

Zie schema's voor beschrijving installatie.

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N Aansluiting DNB nieuwe teller: 1 x 230V + N Max 40A.

I Geen inbreuken.

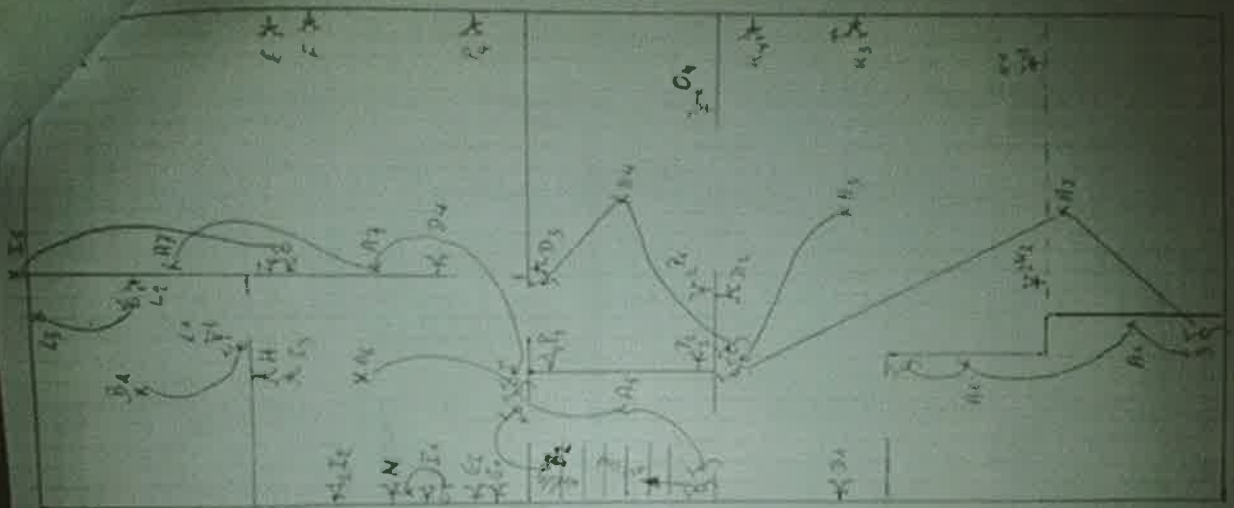
BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,




De Agent-onderzoeker



Von Hoecke Julian
Diestenbaumweg 370
Pilsen

[illegible]

Von Hoecke Julia
Directionenweg 370
Rippe an

<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5
<p>  </p>		V08 2,5

Diff 100 mg / 40 A

de eigenaar
 van Hoecke Julia

Dienkosterweg 370
3202 Rillau.

Felix Kristof
GSM 0495230 004
info@landocb.be
OCB www.ocb.be

3/04/2020

