

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Limburg, KOERSELSESTEENWEG 226, 3582 KOERSEL
T: 011 42 18 34, E: btv.limburg@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0535-180529-09 Datum van het onderzoek : 29/05/18
Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:


ADRES INSTALLATIE : LARS HEUTS
BEVERPAD 17
3620 LANAKEN

EIGENAAR : LARS HEUTS
Adres : BEVERPAD 17
3620 LANAKEN

OPDRACHTGEVER : EURINVESCO
Adres : VAN DIJCKLAAN 12
3500 HASSELT

INSTALLATEUR : /
Adres :

Visualisatie van de installatie

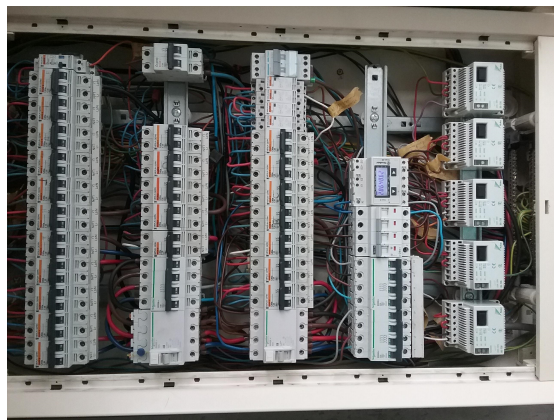

EAN : 541449206004267125 **Teller nr.** 97425681 **Index :**

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Type der Lokalen :	wooneenheid
Begin werken fundering: Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning : 3x400V + N	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 16 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	50 A
Type van de aardelektrode: Lus	Alg. schakelaar: type :	4p 63A/300mA
Aantal borden : 2	Aantal eindstroombanen :	47
Uitwendige invloedsfactoren : /	Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 271,
Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA: 14 Ohm RI tot >0,5 MOhm

BESCHRIJVING:

1 x differentieel 63A 300mA 4p
1 x differentieel 63A 30mA 4p
5 x automaat 16A 2p
19 x automaat 20A 2p
1 x automaat 32A 2p
1 x automaat 16A 4p zonnepanelen
2 x automaat 20A 4p
1 x automaat 40A 2p voeding bord 2

Bord 2 garage keukendeur
3 x differentieel 40A 30mA 2p
1 x differentieel 63A 30mA 4p
1 x differentieel 40A 30mA 4p
3 x automaat 10A 2p
6 x automaat 16A 2p
12 x automaat 20A 2p
1 x automaat 32A 2p

VASTGESTELDE INBREUKEN

- 1 Het ééndraadsschema ontbreekt (art. 16 AREI).
- 2 Het situatieschema ontbreekt (MB 27/7/1981).
- 3 De IP-graad van het bord is niet in overeenstemming met de aanwezige uitwendige invloedsfactoren (art. 225, 234 AREI).
- 4 Stopcontacten met rand aarding zijn verboden in België o.a bij alarm
- 5 Het gebruik van geleiders van het type VOB, zonder bijkomende afscherming is niet toegestaan (art. 207, 210 AREI).o.a transfo onder alarm
- 6 De verbindingen dienen te gebeuren in borden, in aftakdozen, aan de klemmen van stopcontacten, schakelaars of in de verlichtingstoestellen (art. 207 AREI).o.a transfo onder alarm in bord in bouwen
- 7 Soepele kabels voor vaste aansluitingen is verboden o.a stopcontacten bij alarm
- 8 De waarde van de beveiliging tegen overbelasting is niet in overeenstemming met de leiding of verbruiker stroomafwaarts (art. 116, 118 AREI).o.a soepele kabels 0,75mm voor stopcontacten bij alarm
- 9 De isolatiewaarde per kring dient tenminste 0,50 Mohm (1000 x Utest) te zijn, installatie van voor 1/10/1981 - 1/1/1983 of na 1/7/2000 (art. 20 AREI).o.a bord 1 automaat 20A 2p / 1ste rij 1ste + 2de van rechts
- 10 kleurcodes respecteren voor aansluiting draden. o.a bord 2 : geel groen mag niet gebruikt worden als actieve geleider.

NOTA'S

- 1 Dit verslag kan gebruikt worden voor de verkoop van de woning.
- 2 Pv installatie behoort niet tot de controle
- 3 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.

BESLUIT

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 29-05-2019.

De agent-onderzoeker,
0535 STEVEN KRMASEK

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS DE INSTALLATIE NIET-CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de inbreuken die vastgesteld zijn. Tref de nodige dringende maatregelen.

STAP 2

Indien nodig laat u bijstaan door een installateur en bespreek met hem de inbreuken. Doe de nodige aanpassingen.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 29-05-2019.

STAP 4

BTV Limburg staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
