



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 23-3383-166



N 146426

010-INSP

Resi code:

☐ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West-Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>C. De</u> <u>P. De</u>	Naam, voornaam : <u>P. De</u>
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>P. De</u>
BTW nr.: BE <u>073723326</u>	Post nr. + Stad : <u>866 P. De</u>
	Tel. : <u>1</u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☒ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ Wooneenheid ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☒ Huishoudelijke werkeenheden ☐ Art 88 ☐ Art ... ☒ Gemeenschappelijke delen ☐ Art ... ☐ Art ... ☒ Werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	
☐ Art 276 : verzwarende ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN <u>541449860007387138</u> ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst kWh meter nr.: <u>34638232</u> meterstand dag : <u>25</u> nacht : <u>21</u> ☐ kWh excl. nacht meter : Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr. : meterstand : Gegevens installatie	Ontworpen voor U_n : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐ Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> x <u>20</u> mm ² - Type : <u>2x23</u> Type aardelektrode : ☒ aardingslus ☐ pen / baar ☐ Beschrijving installatie ☒ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A <u>100</u> mA Aantal borden : <u>1</u> Aantal eindstroombanen : <u>10</u>
-------------------	---	---	--

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's	☒ Aardingsweerstand : <u>200</u> Ω ☒ Algemeen isolatieniveau : <u>1</u> M Ω ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test diff.
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden	

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☐ Nihil	<u>geen inbreuken vastgesteld</u>	Visum DNB of aangestelde :
Inbreuken Bestaande installatie ☐ Nihil		
Opmerkingen ☐ Nihil	<u>verlichting mag te plaatsen</u>	

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Albert Buit Agent nr. 300 Datum : 06/09/2015

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 1 ☒ Eëndraadsschema(s) : 1 ☐


De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

06/09/2015 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtrekkingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

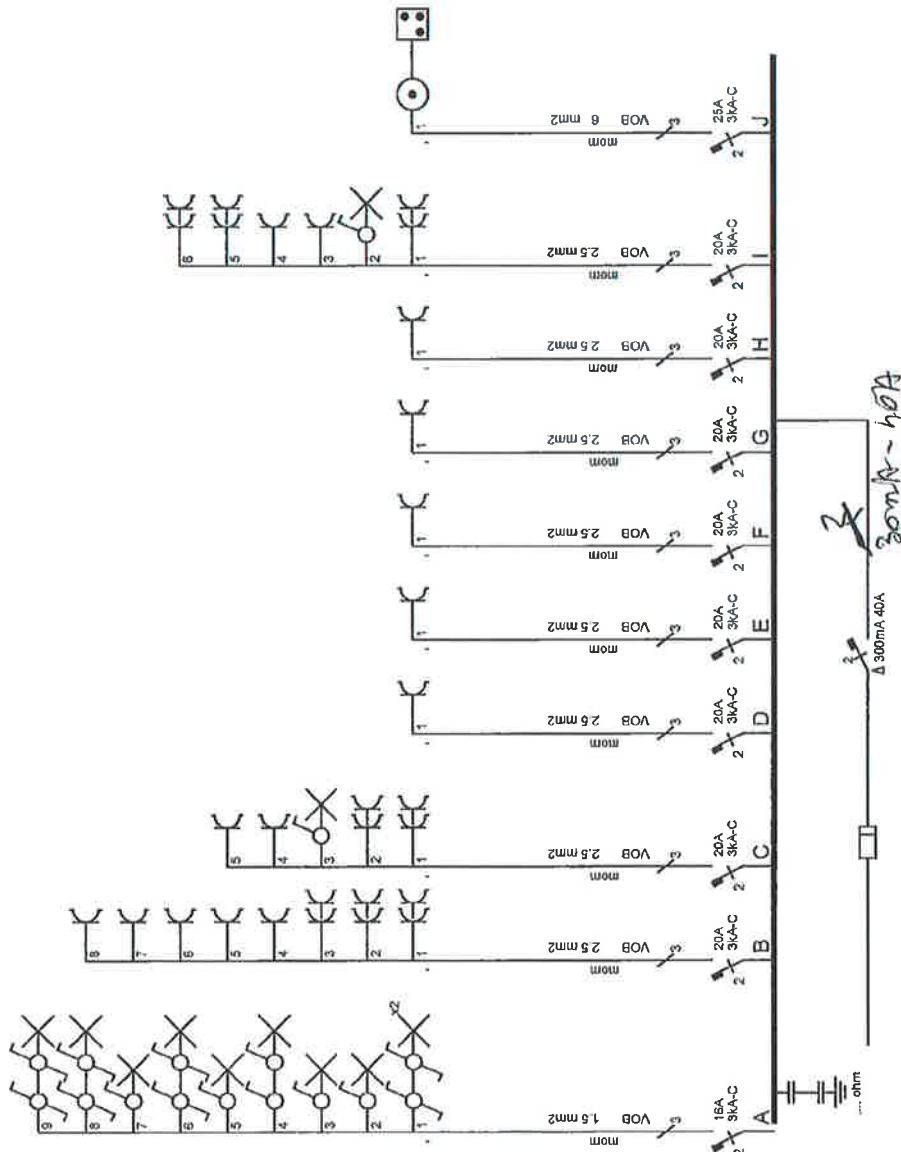


Afgev. erkend organisme

6/8/2000
 G. DE PRETER
 0000


Res. Astrid
 Astridlaan 30 - 8620 Nieuwpoort
 App. 30.00.02

Verantw. uitvoering

G. De Preter nv
 Tel.: 059/31.46.73
 GSM: 0495/22.98.44
 Lambertus Coolstraat 21
 8433 Slijpe



BE 0879.273.326

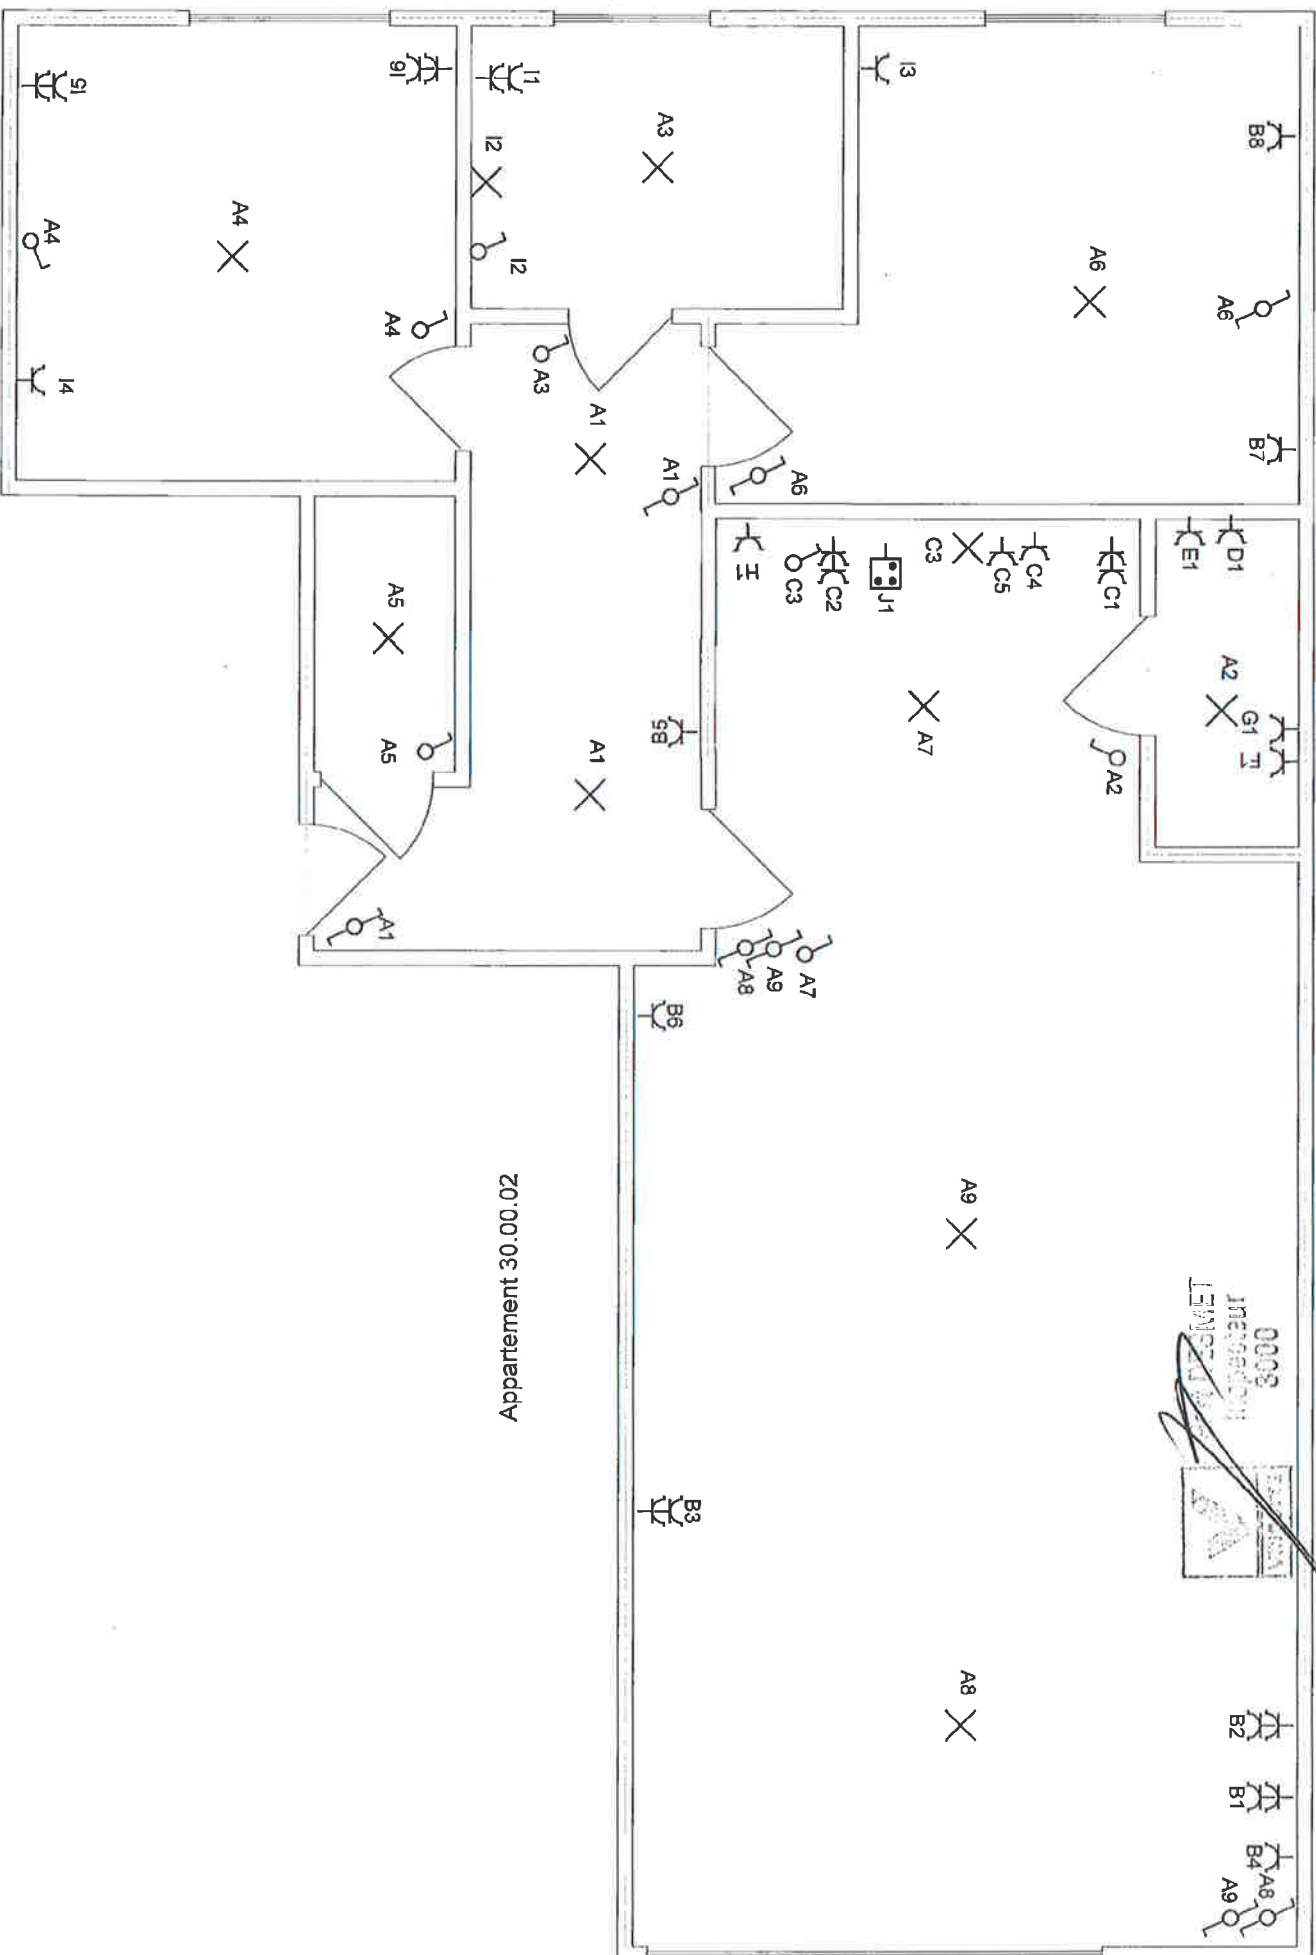

Appartement 30.00.02

0003
Ingenieur
LENGUET



B2

B1

B4

A6

A9

