

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Namur / Luxembourg, Avenue du Sainfoin 25, 5590 CINEY
T: 083 21 35 27, E: btv.namur@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0469-180518-02

Datum van het onderzoek : 18/05/18

Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : HARRY VAN DEN BROEK
RUE DES RENONCULES 5/215
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE

EIGENAAR : HARRY VAN DEN BROEK
Adres : RUE DES RENONCULES 5/215
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE

OPDRACHTGEVER : INTUERI
Adres : STATIONSTRAAT 129
8890 MOORSLEDE

INSTALLATEUR : INTUERI
Adres : STATIONSTRAAT 129
8890 MOORSLEDE

Visualisatie van de installatie



EAN :

Teller nr.

60949940

Index :

19474

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :
Begin werken fundering: Na 01/10/81
Aansluiting spanning : 3x400V + N
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm²
Type van de aardelektrode: Lus
Aantal borden : 1
Uitwendige invloedsfactoren :

Type der Lokalen : Appartement
Elektrische installatie : Na 01/10/81
AREI art. : 86
Bescherming van de aansluiting : 16 A
Alg. schakelaar: type : 4p 40A/300mA
Aantal eindstroombanen : 11
Schema : TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 271,
Aard van het onderzoek : Controlebezoek



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

METINGEN:

RA: 6 Ohm RI tot 7 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

1 Divers

BESLUIT

De installatie is conform.
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.
De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/05/43 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0469 ERIC ANDRE

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal
zorgvuldig en besteed
aandacht aan de eventuele
nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen
van de installatie, laat
opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de
installatie is verplicht voor
18/05/43.

STAP 4


BTV Namur / Luxembourg
staat tot uw dienst voor de
noodzakelijke keuringen.

18 MEI 2018

Eric Andre
469

697

ВЛ

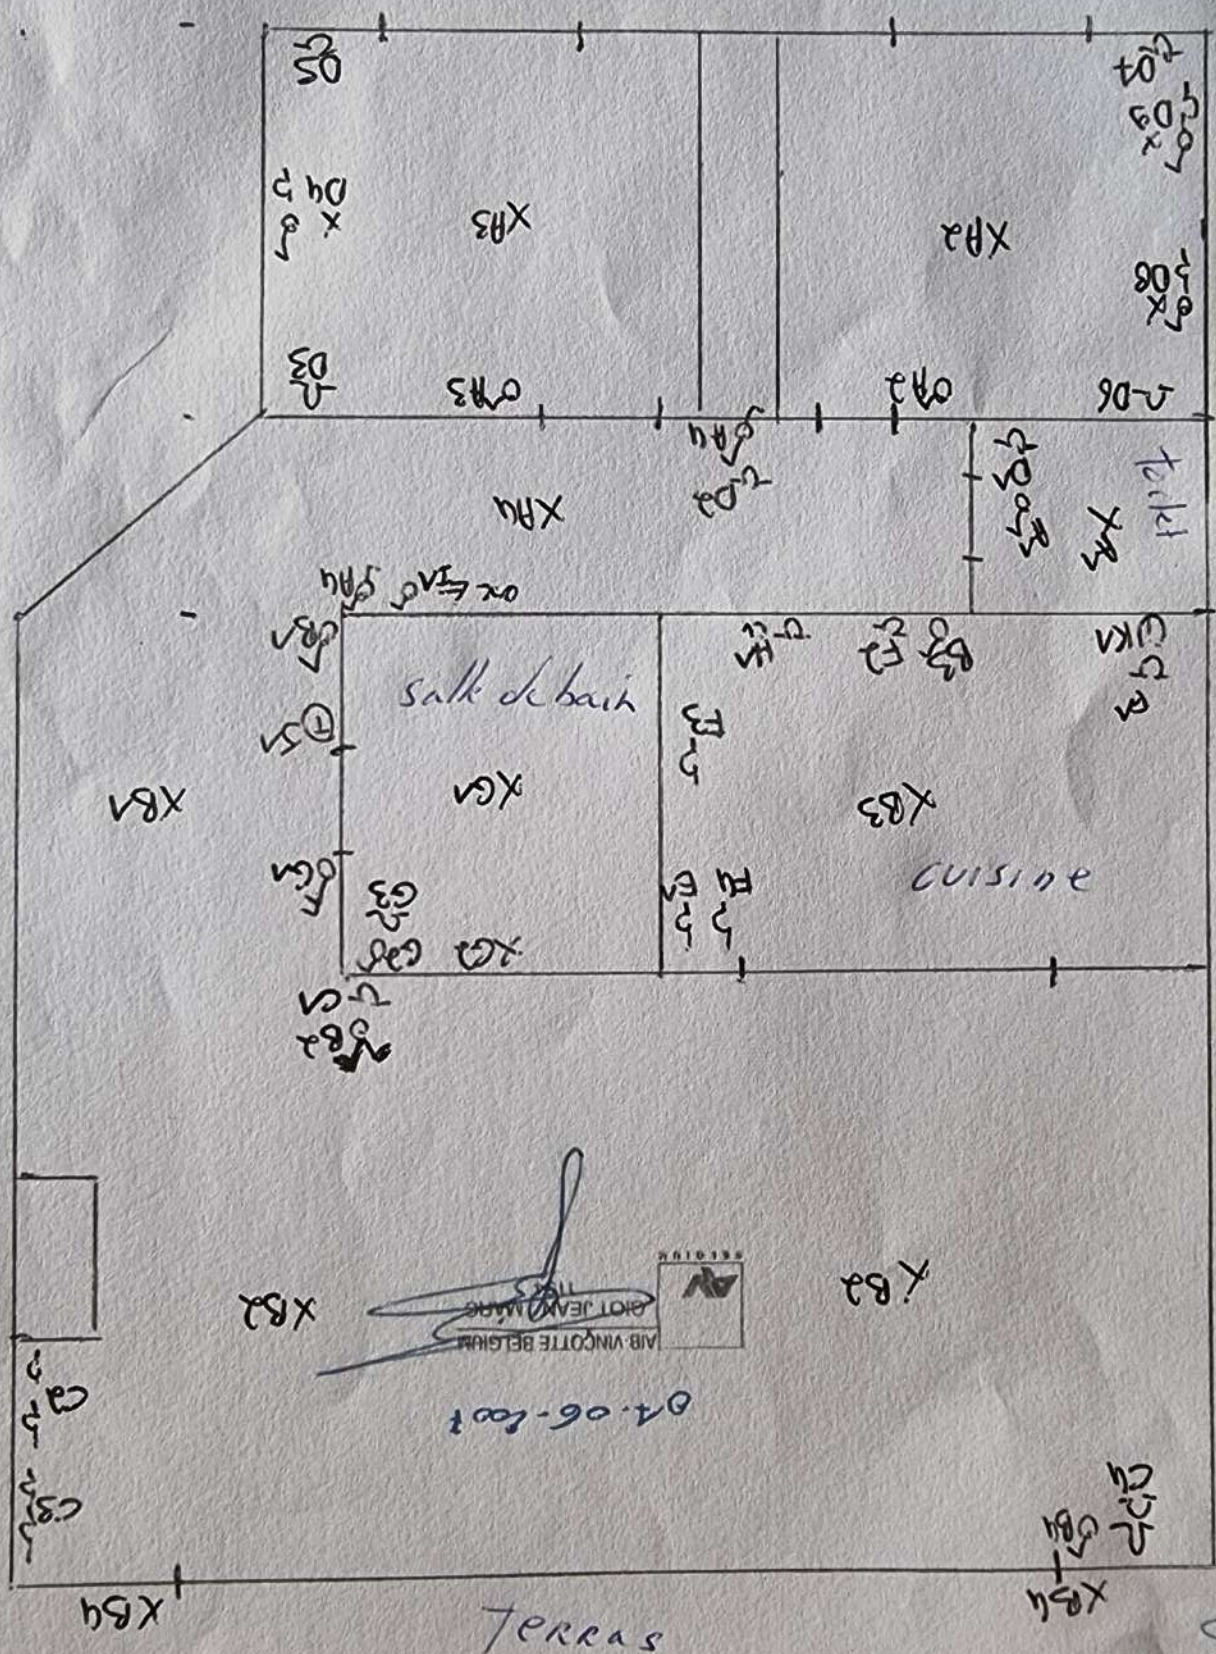



18 MEI 2018
Eric André
469

