


ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

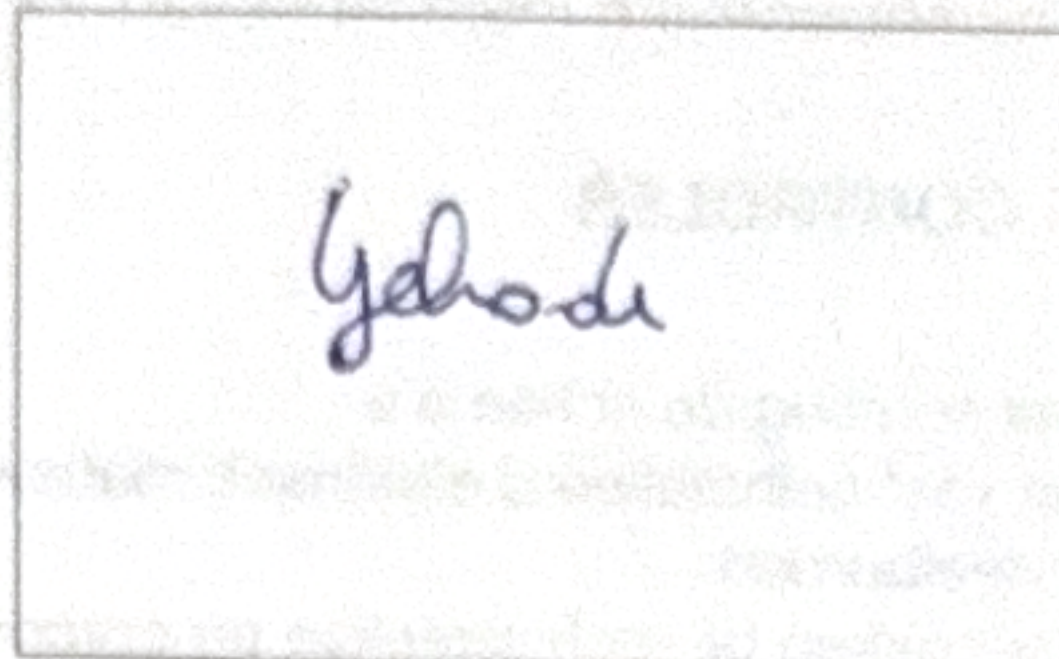

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 334/120706/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3220 Hobbesch
Beke 1A

EIGENAAR: Antoon Lander

Adres: w

OPDRACHTGEVER: w

Adres: w

INSTALLATEUR: w

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. te plaatsen

Index: _____

Datum van het onderzoek: 6/07/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: HHL

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x400+N V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type Duff 40/0,3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 18; RA: 12 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: The Bylage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

Note: Dit verslag is geldig voor verkoop

3x400+N max 40A

Stopcontact Brodhamer in gebruik

keuken nog niet geplaatst

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT**
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 6/07/2037 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

334 Montia Keston

De directeur,
