




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

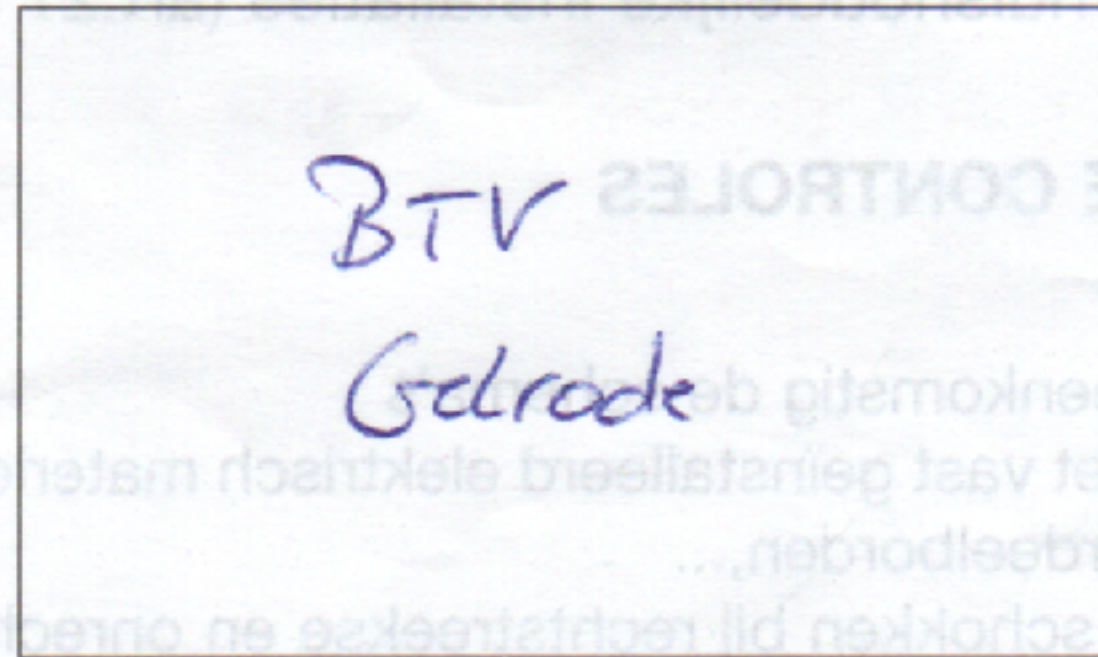

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 234/110221/08

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Steystraat 10
3200 Aarschot

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Pluinpapaver Lvbv

Adres: Nopstal 51 3202 Billaar

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 21/02/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3 x 230 V V Bescherming van de aansluiting 32 A

Voedingskabel hoofdbord: 3 X 6 mm² Alg. schakelaar: type Diff 40A

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9; RA: 29 Ohm; RI tot >5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Algemene diff: 40A/300mA 40 type A
Zie schema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

Verlag mag gebruikt worden voor verkoop

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/02/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

239
Deun

De directeur,

