

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie


O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 15/121022/04

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: BAKKEN WEELOE

DIKKELENNE

EIGENAAR: TRIOMPH

Adres: Station 10, Kollige

OPDRACHTGEVER: W. J. P. H. C. de Groot

Adres: Genkstraat 55, Kollige

INSTALLATEUR: ide

Adres: _____

BTW of IK: BE0833236928

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: noy 6/10/12

Datum van het onderzoek: 22/10/12 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop woonwoning: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V V Bescherming van de aansluiting (aantme 40) A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A-30mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - penmen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 2,94 Ohm; RI tot 2,94 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Hooftelek = diff 40A-30mA

1 x 2,5-2 2 p 20A 2 stb

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op _____

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: _____

handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de éénheids- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/10/12 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____


DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

FORM. 382-06/2009



Technisch installatieplan



Stationstraat 12A
9620 ZOTTEGEM
T 09/337.06.50
F 09/348.52.99

Projectadres: Bronneweelde 2 lot 20

Opgesteld op: 08/08/2012; aangepast op: 13/09/2012

Mevrouw: STASSYNS Nathalie


Adres:

Tel./ Fax.:


Opmerkingen

Gebruikte symbolen


Elektrische installatie

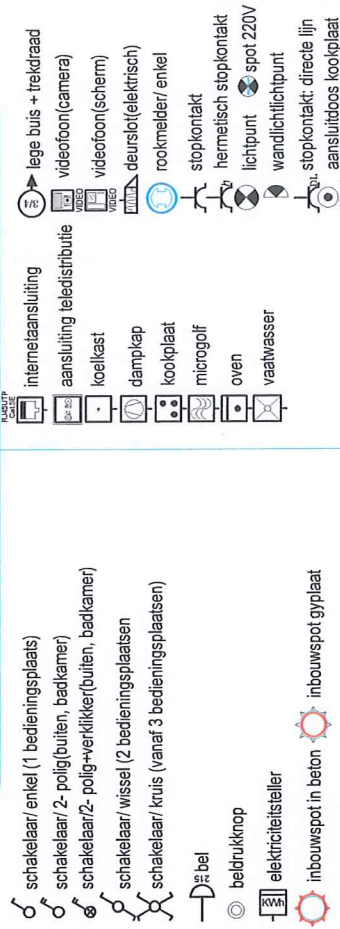


Sanitaire installatie

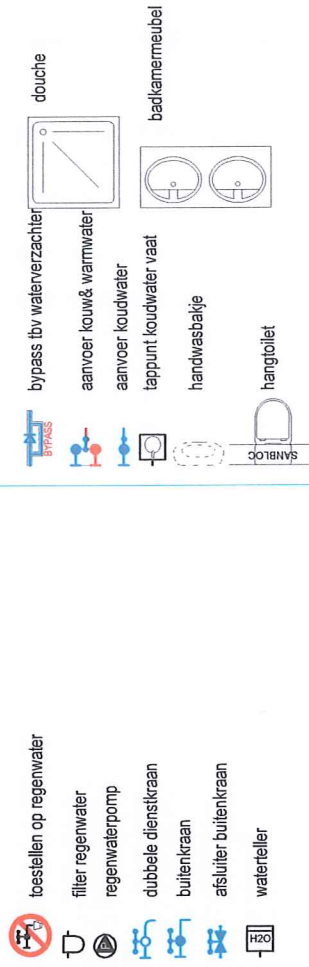

Verwarminginstallatie

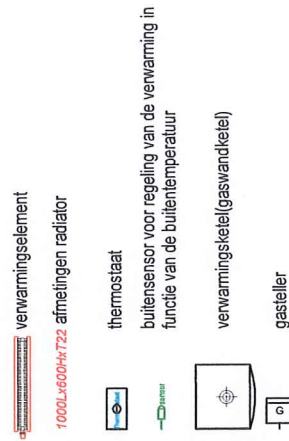




nota: naar het noorden te plaatsen!

Ventilatiesysteem C+ Evo II!

**Nota diameter inbouw in beton: 80mm
tenzij anders door de klant aangegeven!**

Nota: volgens technische fiche methode
is er maar één voeding voor
verdeling boven spiegel !!

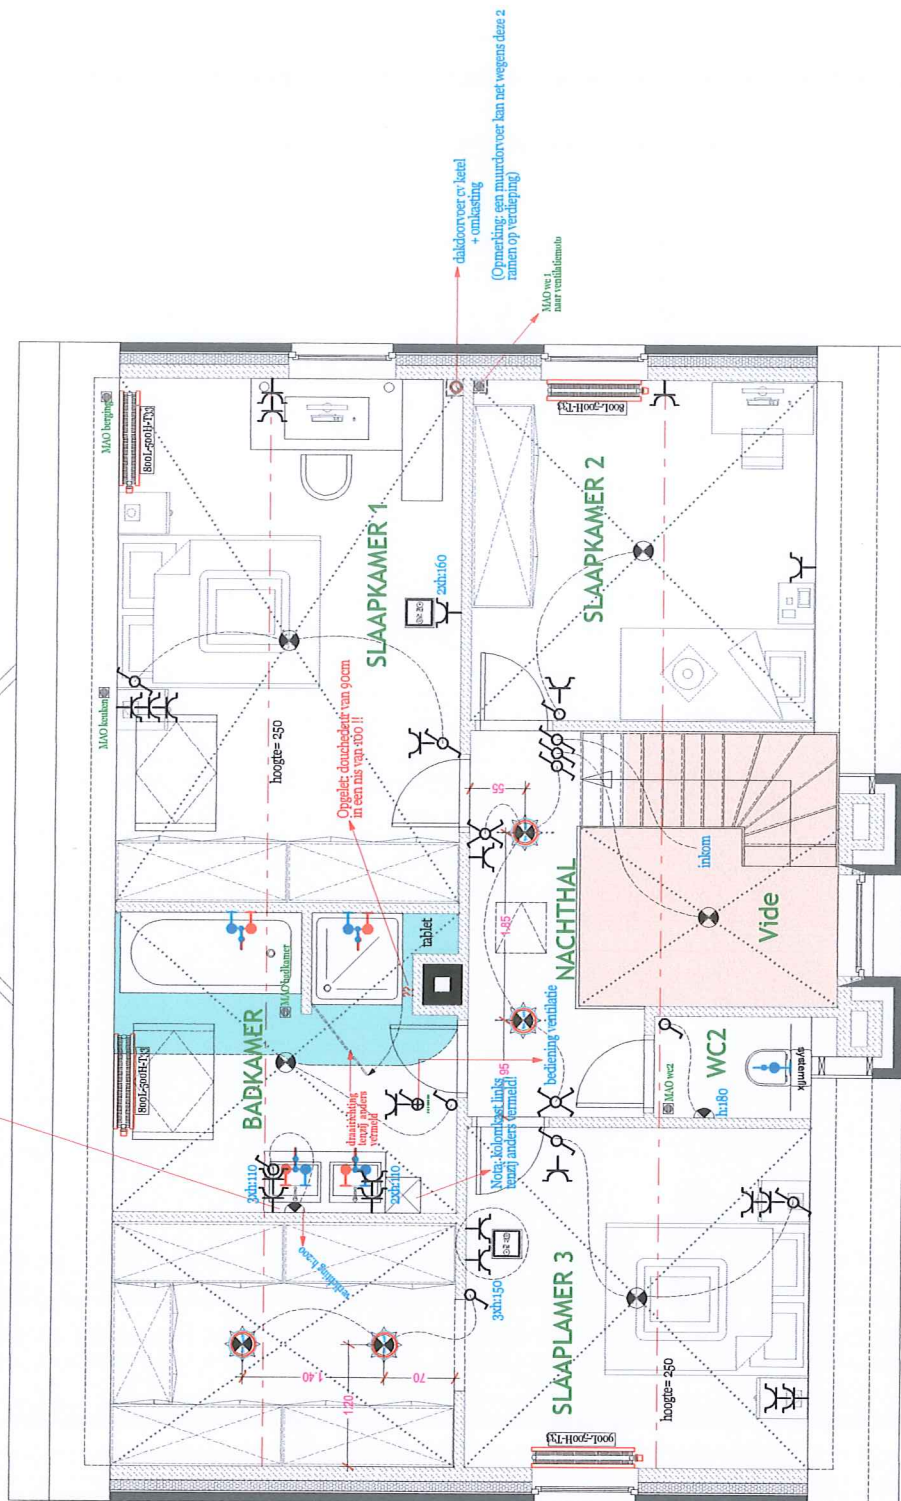

Ventilatiesysteem C+ Evo II !

Nota diameter inbouw in beton: 80mm
tenzij anders door de klant aangegeven!
