

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

Technisch Bureau Verbruggen v.z.w.
Leuvensesteenweg 383 bus 1
3200 Gelrode (Aarschot)
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.21
Email: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 334/1207241

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3001 Herenlaer

Tennissevest 231402

EIGENAAR: Beiges Kortenes

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Lelen

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 11509

Index: _____

Datum van het onderzoek: 24/07/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ABAB art. 262) (K.B. 2.6.2000) (F.R. art. 231) (voorsch. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - ~~verkoop wooneenheid~~ Type der lokalen: HHI

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 220 3x400/110 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type Df 4010,3A

Type van de aardelektrode: ~~lus - baren~~ - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 6; RA: 1 Ohm; RI tot 210 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

Df 4010,3A type A

3 R C16 2,5² VOB

Df 4010,03A type A

2 R C16 2,5² VOB

1 R C20 7,5² VOB

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

geen

Notas:

Herkeuring van 277/110810106

Aandij aangesloten op algemene

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/07/2037 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- 2 De installatie is niet conform.
- 3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____


DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

334 Maarte Peeten

De directeur,

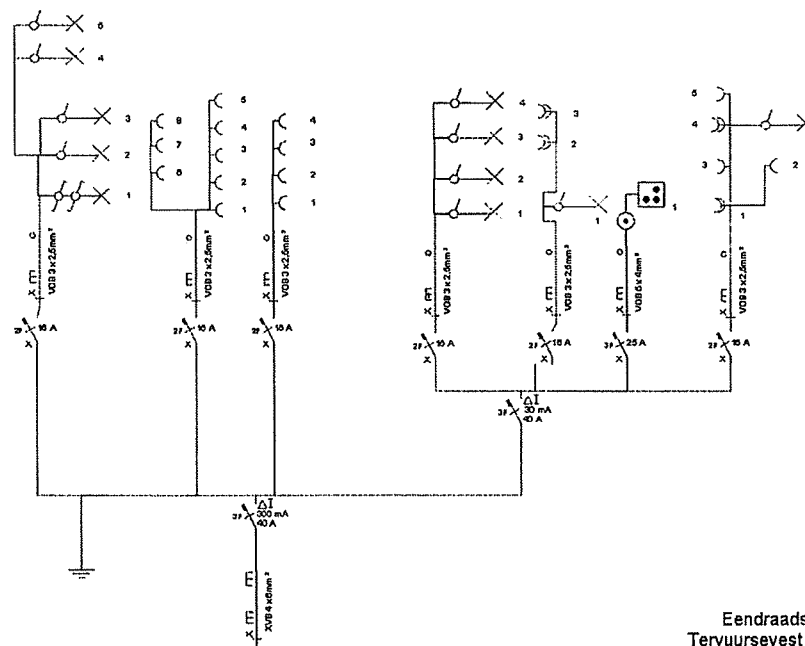

Eendraadschema
Tervuursevest 23 bus 402

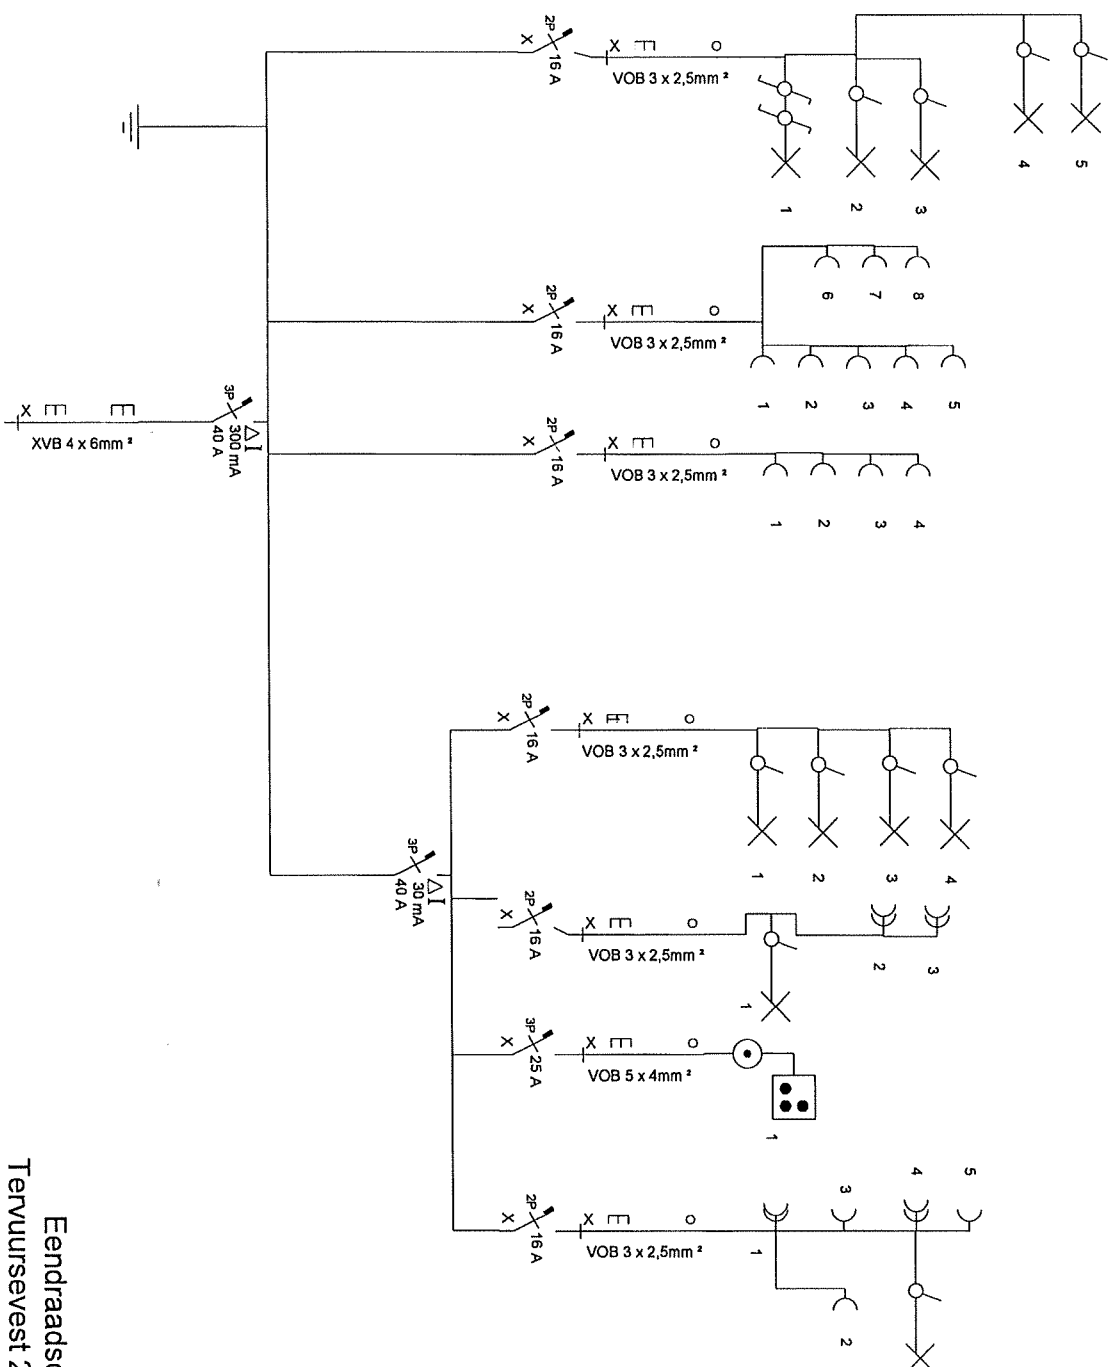

Eendraadschema
Tenvurseevest 23 bus 402
