



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 3555-1356/ANT



N 189309

040-INSP

Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11

tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West - Vlaanderen☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11

tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam voornaam : Artis Eco Systems
Ident. Kaart nr. :
BTW nr.: BENaam, voornaam : Hessels
Adres : Heeststraat 45
Post nr. + Stad : 1910 Kampenhout
Tel. : 1Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270	☒ ongebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☐ ① Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis	verkoop van een wooneenheid			☒ Art 85	☐ Art	☐ ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler : EAN 541499400001119787 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr. 4157672 meterstand dag : nacht : ☐ kWh excl.-nacht-meter :
Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐ nr. : meterstand : 60Gegevens installatie : Ontworpen voor U_N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐
Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐
Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : V.F.V.B. Type aardelektrode : bestaand
☐ aardingslus ☐ pen / baarBeschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : 40 A 1300 mA Aantal borden : Aantal eindstroombanen :
Diff. 40A/1300mA omvormer 3 SMA SB3300 / 1x2002225
1 16.04.20A omvormer 2 SMA SB4000 / 1x2002225
33x2.50mm² / 1x stroomkabel ABROD 4765 / 1x11.02.206
PK omvormer 1300 VA / 2x 4000 VA
1x11.02.206

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☐ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☒ >/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 0.87 ☒ Algemeen isolatieniveau : 9.99 MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test diff.
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	
☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
☐ Nihil	
Opmerkingen	<u>De controle betreft enkel de PV-installatie.</u>
☐ Nihil	

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.De installatie dient op nieuw gecontroleerd te worden voor 27/06/2035 (*)
☐ door hetzelfde erkend organisme

Agent bezoeker :


Naam : Stor ms Luk Agent nr. 3555 Datum 27/06/2011

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema(s) : ☒ Eëndraadsschema(s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Memels Paul
Trikshach 45
1920 Kampenbeut

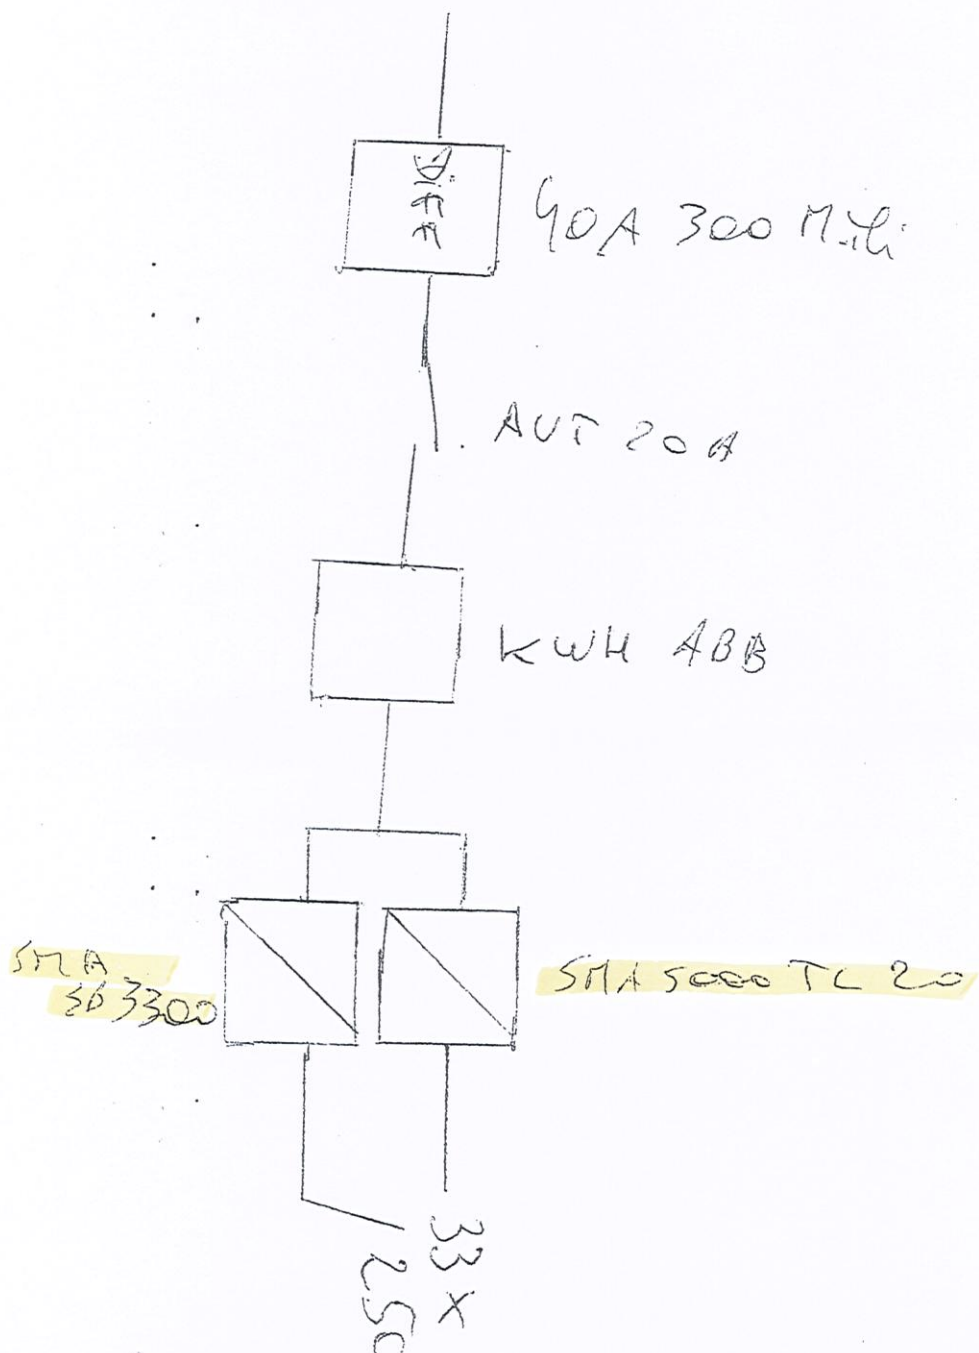

LUK STORMS
Inspecteur
0476/98 59 54

27/06/2011
