

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: anneleen.vandenberk@gmail.com

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 4604603
Voorl. verslagnr.:
Datum: 13/11/2015

Klant / Opdrachtgever:
ANNELEEN VANDENBERK
DORP 11A
3920 LOMMEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: VANDENBERK DORP 11A LOMMEL 3920
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/276bis/278
Datum onderzoek: 13/11/2015 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/11/2040 Onderzoeker: AGTEN CARINE
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 3 x 400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 25A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: VFVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 6 mm² spreidingswaarde: 27 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende dif.: /
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 23 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ☐ zie schema in bijlage ☐ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 11

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


GEEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker

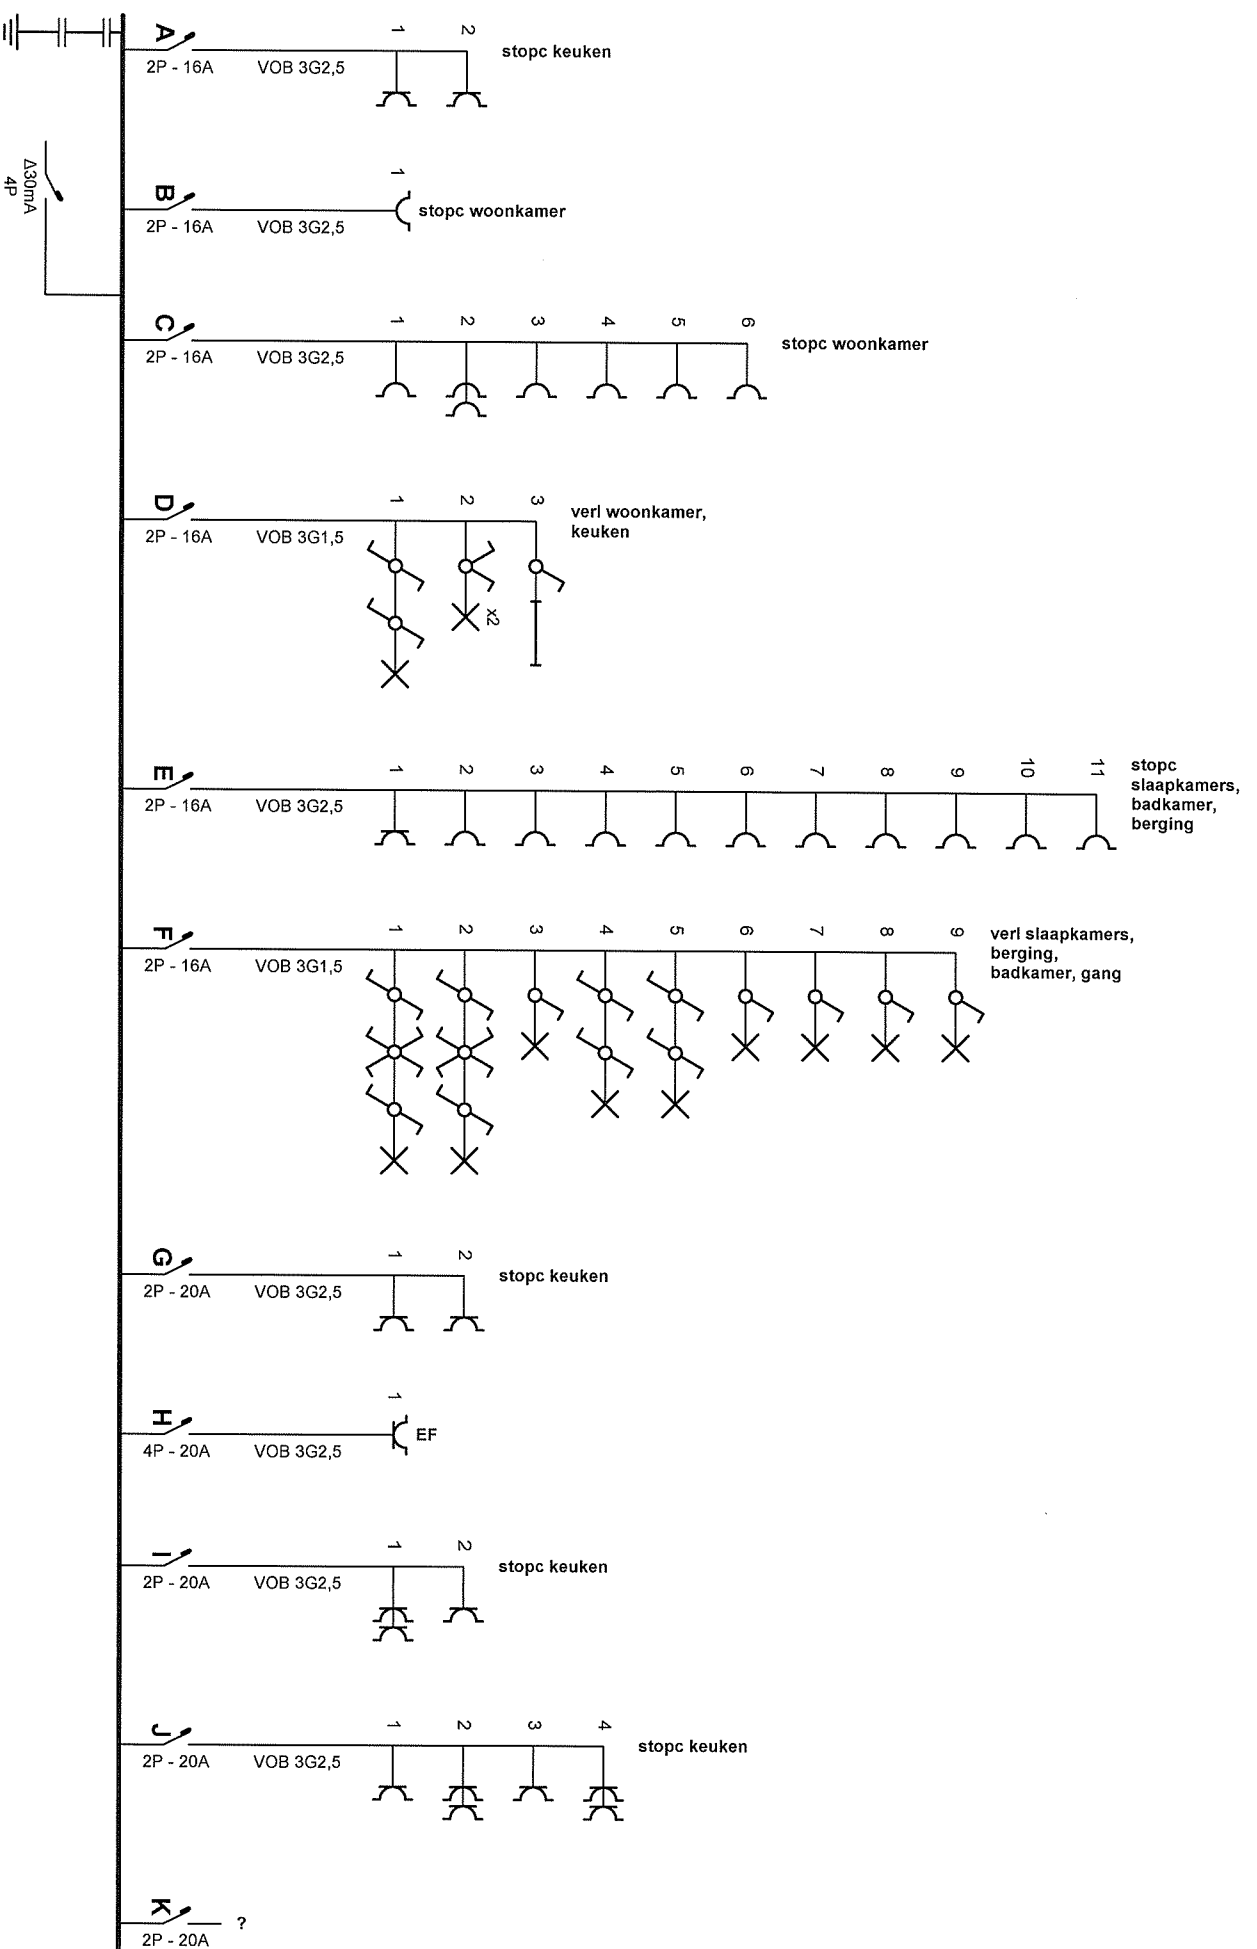

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

3/11/11

Plaats van de elektrische installatie

Bullen Werner
Dorp 11 Bus A
3920 Lommel

Installateur

Hoeks Jeroen

p. 1/3

Eendraadschema

Datum: 26/10/2015

3 x 400V + N ~ 50Hz

A	stopc keuken	
B	stopc woonkamer	
C	stopc woonkamer	
D	verl woonkamer, keuken	
E	stopc slaapkamers, badkamer, berging	
F	verl slaapkamers, berging, badkamer, gang	
G	stopc keuken	
H	EF	
I	stopc keuken	
J	stopc keuken	
K	?	

Erkend Organisme O.C.B. Koningin Astridlaan 60 2550 Kontich Tel.: 03 451 37 00 Fax: 03 451 37 10 e-mail: dep.ele@ocb.be		Plaats van de elektrische installatie Bullen Werner Dorp 11 Bus A 3920 Lommel	Installateur Hoeks Jeroen	p. 3/3 Lijst Kringen Datum: 26/10/2015 3 x 400V + N ~ 50Hz
--	--	---	-------------------------------------	---
