

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 16/06/2020 **Inspecteur:** David Meersschaert **Mentor:** **Installateur:** Maxime elektro
ID-label: **B.T.W. nr.:** BE 562 716 992 **Klantreferentie:** **IK. nr.:**
Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 **Serie Nr.:** 18120206

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Europaplein
Huisnummer 9
Busnummer 202
Postcode 8670
Gemeente Oostduinkerke
Land België

Naam contactpersoon -
Telefoon -
Gsm nr. (SMS)

Eigenaar

Naam Marc Sienaert
Straatnaam Europaplein
Huisnummer 9
Busnummer 202
Postcode 8670
Gemeente Oostduinkerke
Land België

Installateur

Naam Maxime elektro
BTW nr. BE 562 716 992
Telefoonnummer 0473795257
E-mail maxime.vercauteren@live.be

Type : appartement

EAN : 54

Teller Nr.: 14659595

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5. en 8.2.2 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS **Spanning:** 3N400V **Meter / bord verbinding:** 10 mm² **Max beveiliging:** 40 A
Aantal borden: 1 **Aantal kringen:** 12 **Isolatie:** 50 MΩ


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders **RE:** 1,6 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I _Δ (mA)	I _n (A)	I _n - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alles	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alles	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
12	C	16		2	2,5
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw ☐	
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK	niet van toepassing ☐ in afwachting			
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK	☒ NVT	



OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 16/6/2045
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur David Meersschaert

Meerschaert

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 16/6/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

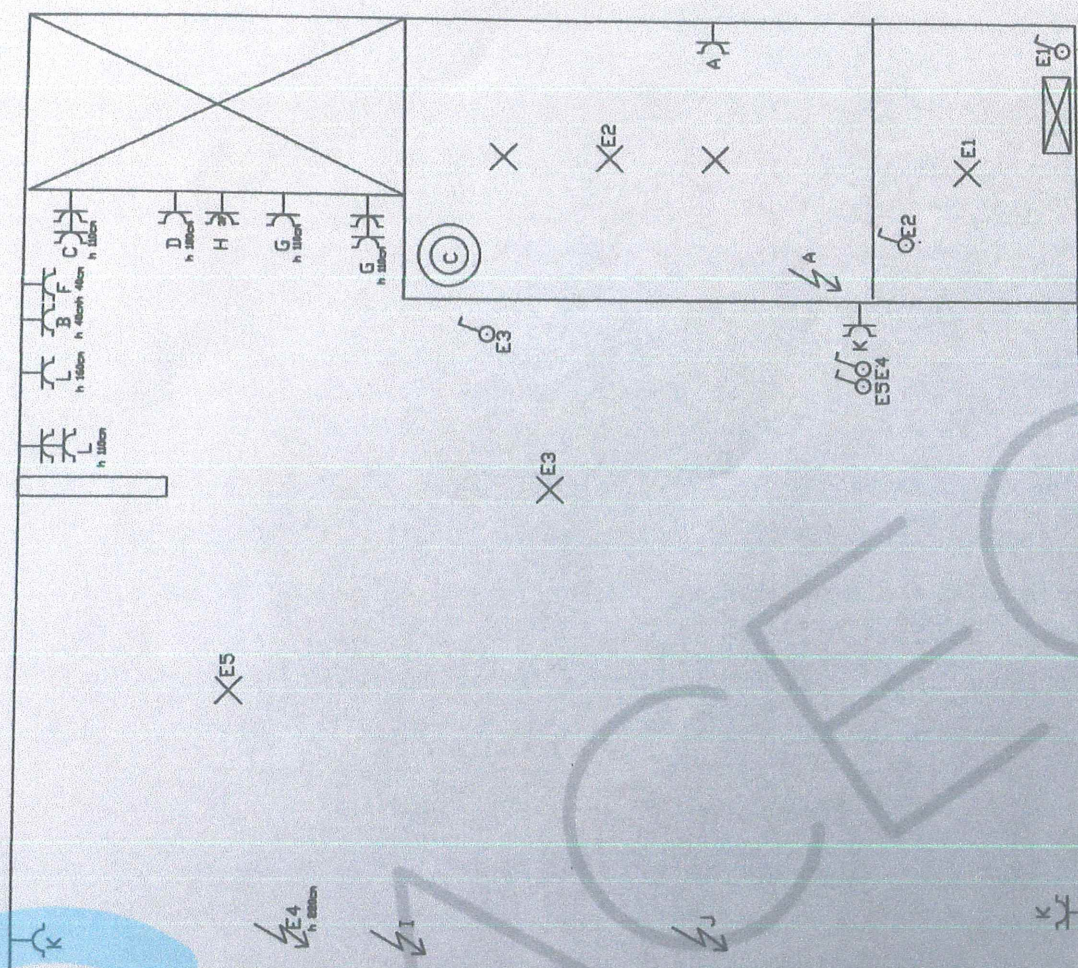

SITUATIONSCHEMA	ONTWERPER	31/05/2020	KEURINGSORGANSCHIE
Projectnummer: 01000	Muster: Buitenvoortse Waterleiding	0473 79 32 37	Inrichting: Electrolab
Projectnaam: 01000	Muster: Buitenvoortse Waterleiding	0473 79 32 37	Inrichting: Electrolab

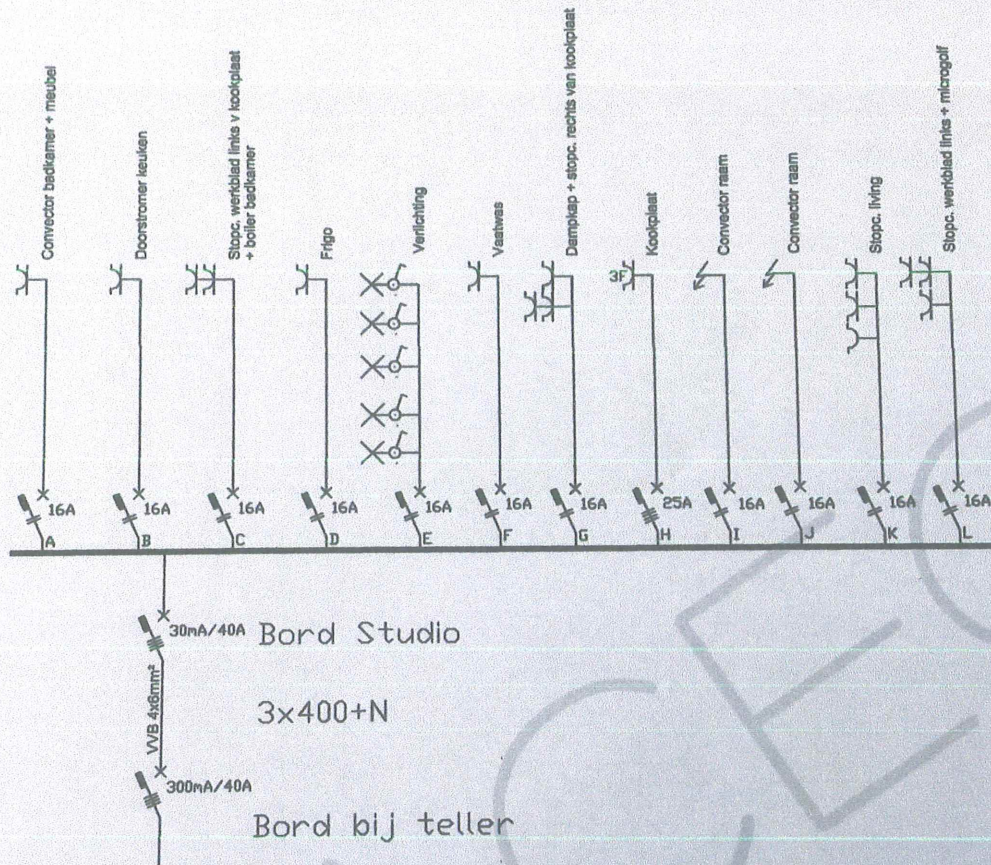

MaximeElektro
ALGEMENE ELEKTRICITEIT

EENDRAADSCHEMA

Europaplein 9/202
8670 Dastdunkekerke

ONTWERPER

Maxime Elektro
Hogebrugstraat 21 8647 Lo

31/05/2020

0473 79 52 57

info@maxime-elektro.be

KEURINGSORGANISME

