

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens :		Datum verslag: 14/12/2023	
Verslag N°:	2202103	Datum keuring: 29/11/2023	
Inspecteur:	Valgaeren Johan	Keuring N°: 202315933	
Controle volgens Boek 1:	4.2.4.3., 6.4.	Aanwezigen:	
Type keuring:	Gelijkvormigheidscontrole		
Adres- en onderzoeksgegevens :			
Plaats van het onderzoek:	Visserijstraat 114A , 3590 DIEPENBEEK		
Teller n°:	/	Index teller:	Dag: 0,00 Nacht: 0,00
Datum installatie:	Na 01/06/2020		
EAN-code:	541 446 706 003 136 532		
Naam opdrachtgever:	Adres opdrachtgever: Visserijstraat 114, 3590 DIEPENBEEK		
Naam eigenaar:	Adres eigenaar: Visserijstraat 114, 3590 DIEPENBEEK		
Installateur:	Adres installateur: Visserijstraat 114 3590 DIEPENBEEK		
BTW-n° of ID:			
Type lokaal:	Woning		
Algemene gegevens elektrische installatie:			
Nominale spanning:	3 x 400V + N	Max. beveiliging:	4 x 40 A
Type electrode:	Piket	# verdeelborden:	1
Netsysteem:	TT	Type alg. schakelaar:	Lastscheider
		Meter - bord verbinding:	XVB 4 x 10 mm²
		# stroombanen:	21
Differentieelschakelaars:			
In:	IA:	#p:	Type:
40 A	300mA	4	A
40 A	30mA	2	A
			Icu:
			3000 A
			3000 A
			Test:
			NVT
			NVT
			X2,5:
			NVT
			NVT
Beschrijving van de installatie:			
Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:	
Alg installatie # 21	Kring A tem U	1,5², 2,5², 6²	
Bijkomende diff # 5	Kring Q tem U	1,5², 2,5²	
Metingen, proeven en visuele controles:			
Ra:	21,50 Ohm	Alg. isolatieweerstand:	6,31 MOhm
Directe aanraking:	OK	Indirecte aanraking:	OK
Correcte schema's:	OK	Equipotentiale verbindingen:	OK
		Aardingscontinuïteit:	OK
		Alg. visuele controle:	OK
		Vaste toestellen:	OK
Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's): Zie bijlage			
Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8.09.2019 betreffende de installaties van laagspanning en zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 29/11/2048 (6.5.2.). De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.			
Aantal bijlagen:		Andere:	
Ééndraadschema's: JA		Situatieplannen: JA	
De Inspecteur, Valgaeren Johan		Visum DNB (art. 270) 20/12/23 J. 85590	



ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
BTW BE0408 677 925
info@atecon.be

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen Inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.17. : Badkamer is nog af te werken.

Raadgevingen

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:


- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
 - b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd;
 - c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
 - d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
 - e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
 - f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren;
 - g) een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

De verkoper is er toe gehouden:

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht over te maken;

De koper is er toe gehouden:


- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
 - b) elke volledige renovatie of elke afbraak van het gebouw met of zonder hergebouw mee te delen aan de Algemene Directie Energie « Hoog Toezicht energieinfrastructuur en -producten ». In dit geval, maakt de Algemene Directie Energie een dossiernummer over en ze nodig hem uit om een kopie van het verslag van controle van de elektrische installatie over te maken, zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen;
 - c) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De verkoper en de koper zijn er toe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

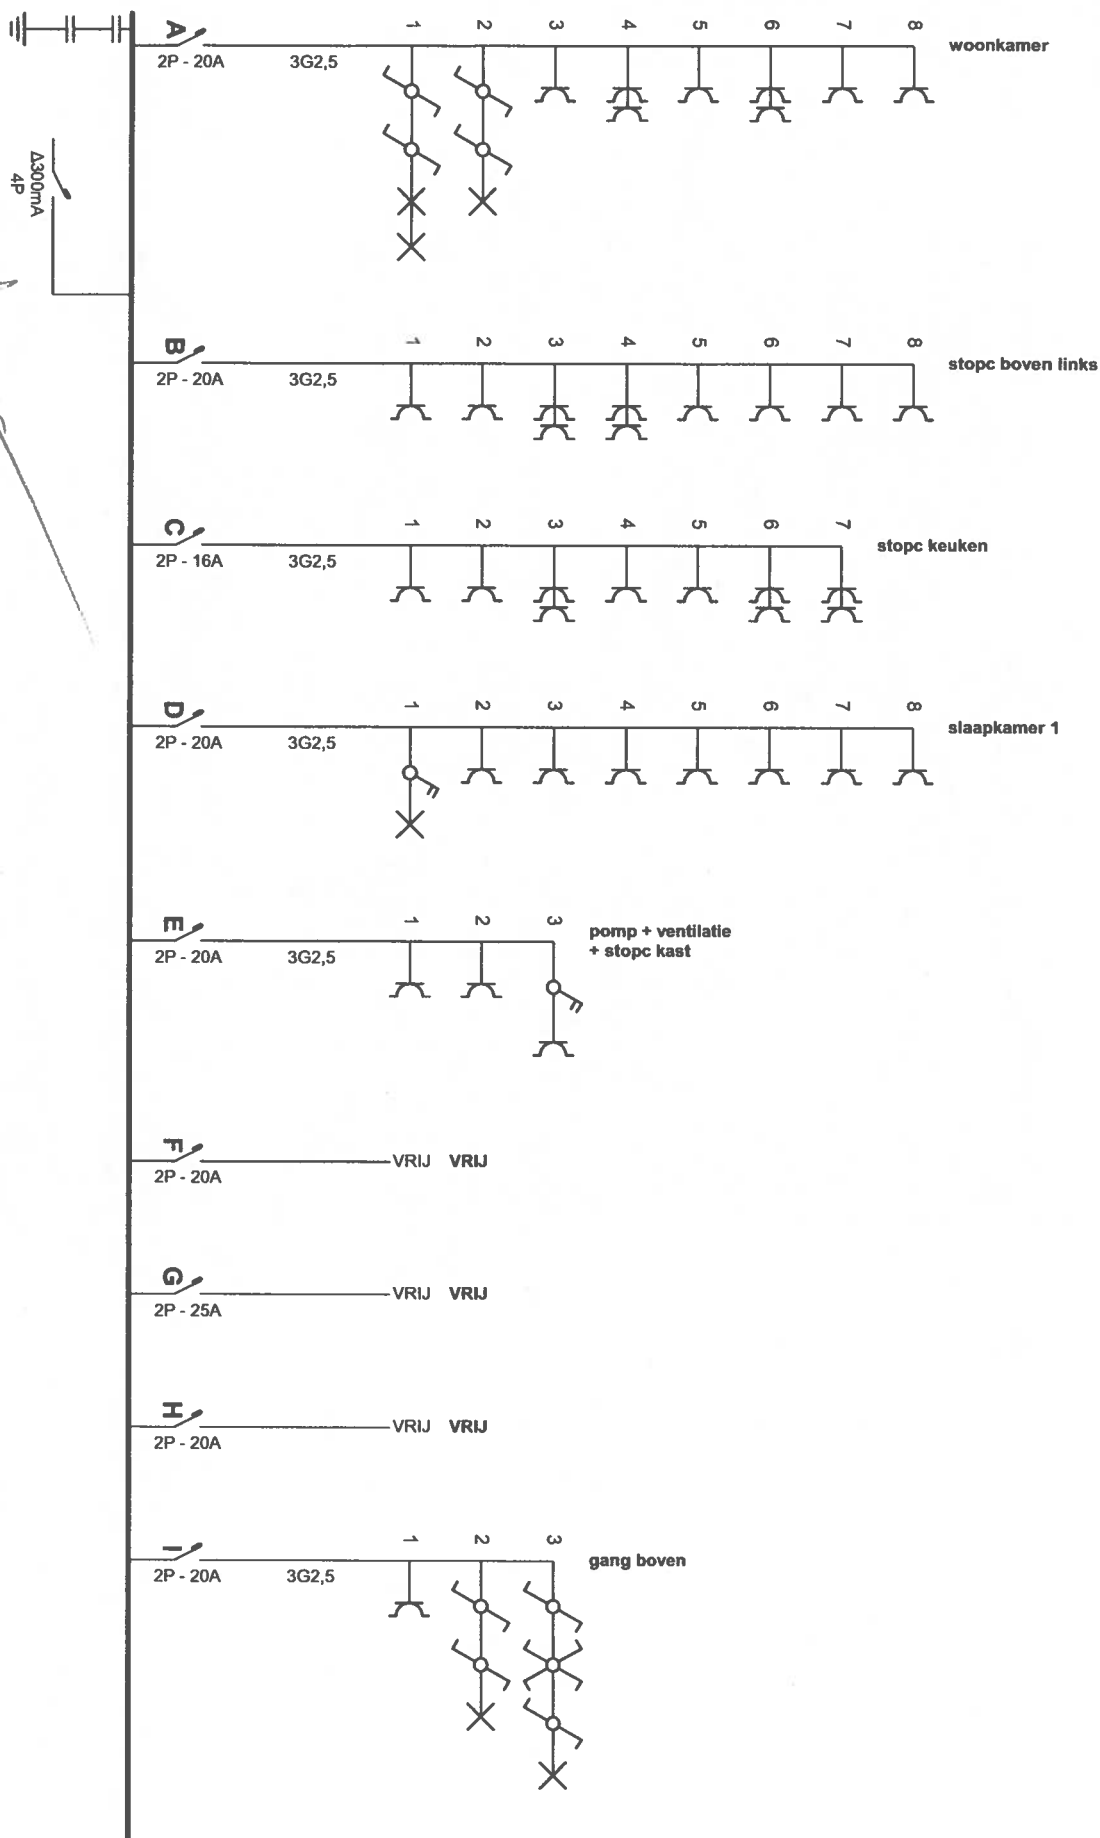

Plaats van de elektrische installatie
visserijstraat 114A

Installateur


p. 1/9
Eendradschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

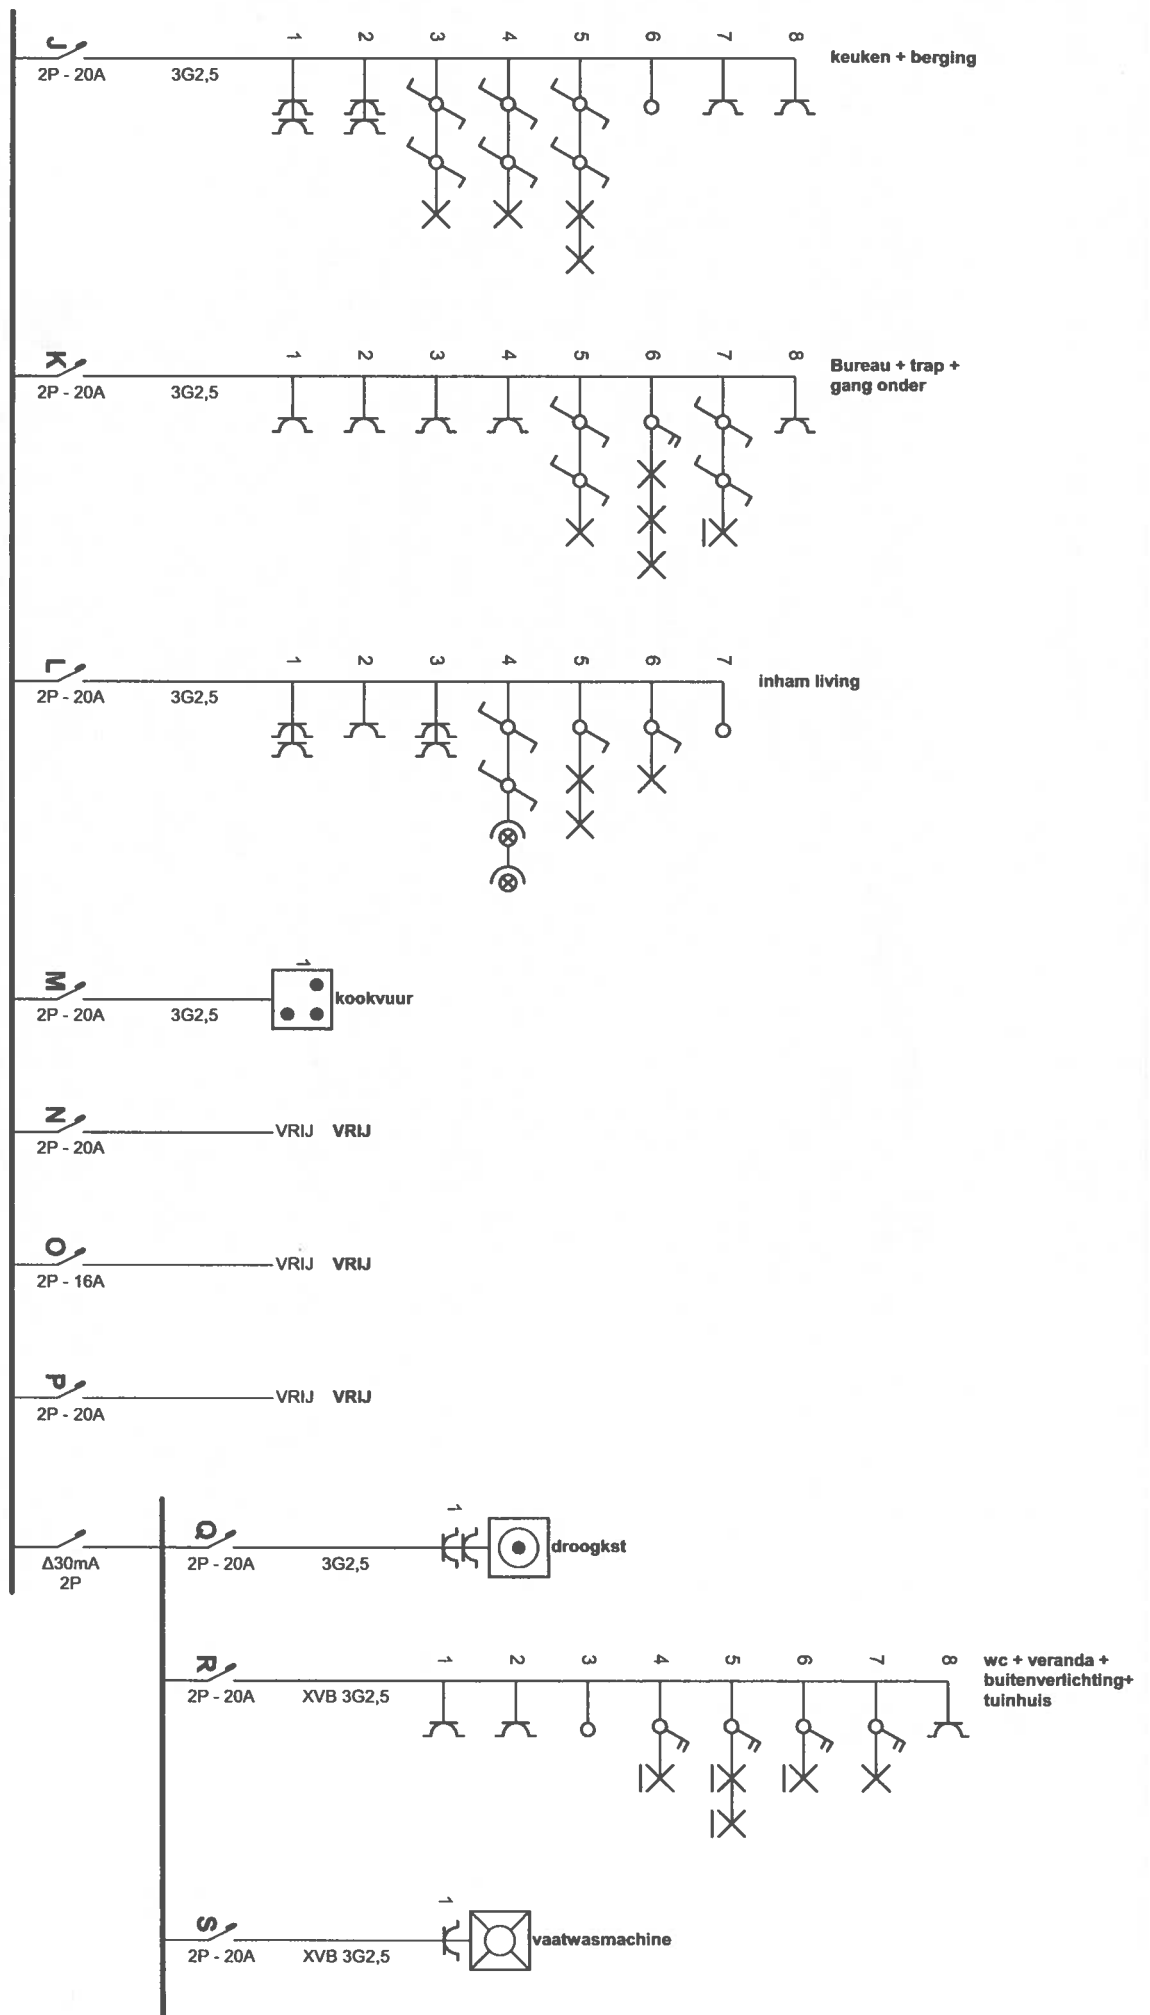

Plaats van de elektrische installatie
visserijstraat 114A

Installateur

p. 2/9
Eendradschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

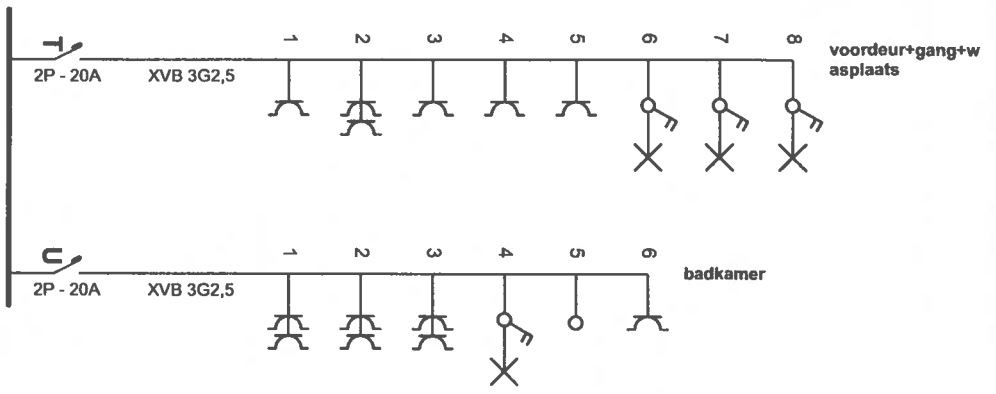


[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie

visseijstraat 114A

Installateur


p. 3/9
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

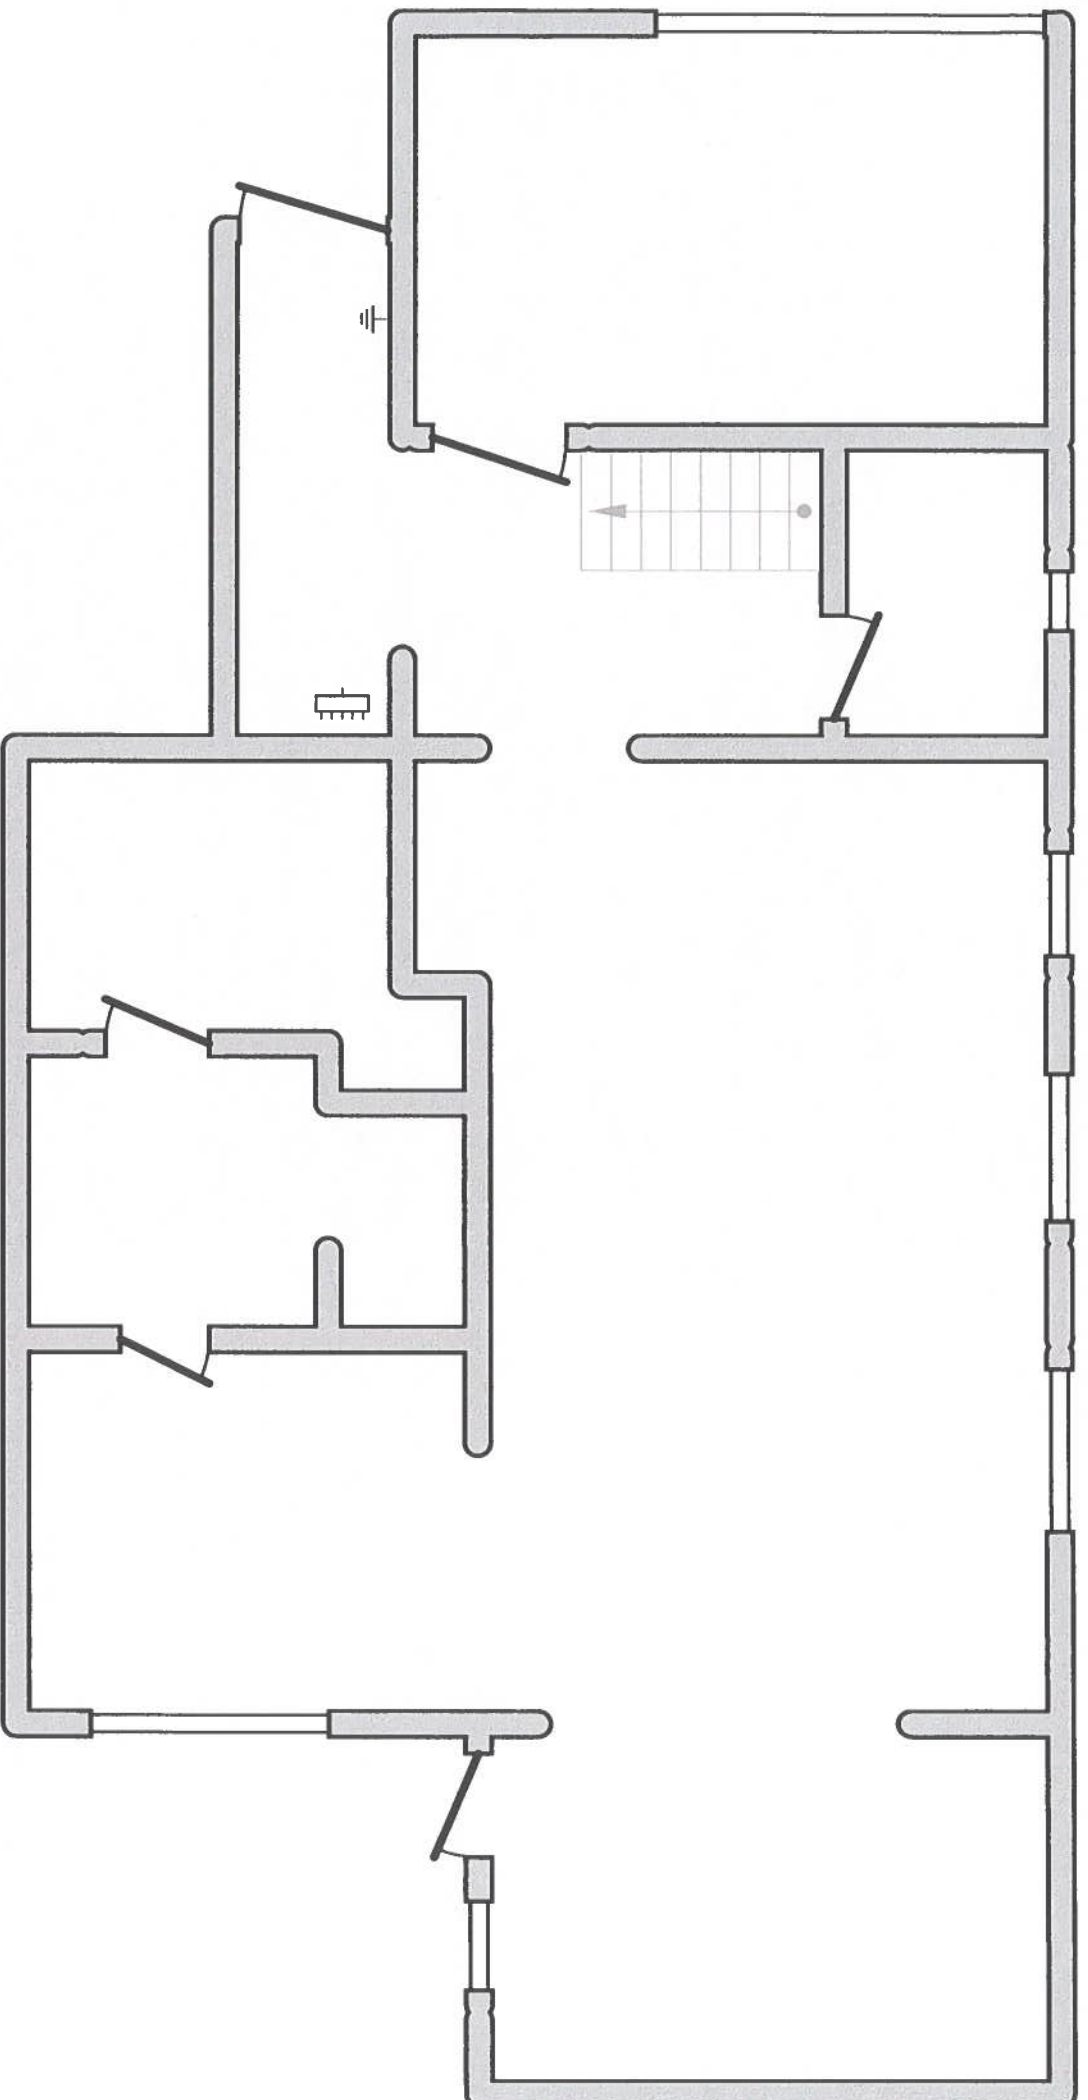

Plaats van de elektrische installatie
visserijstraat 114A

Installateur


p. 4/9
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

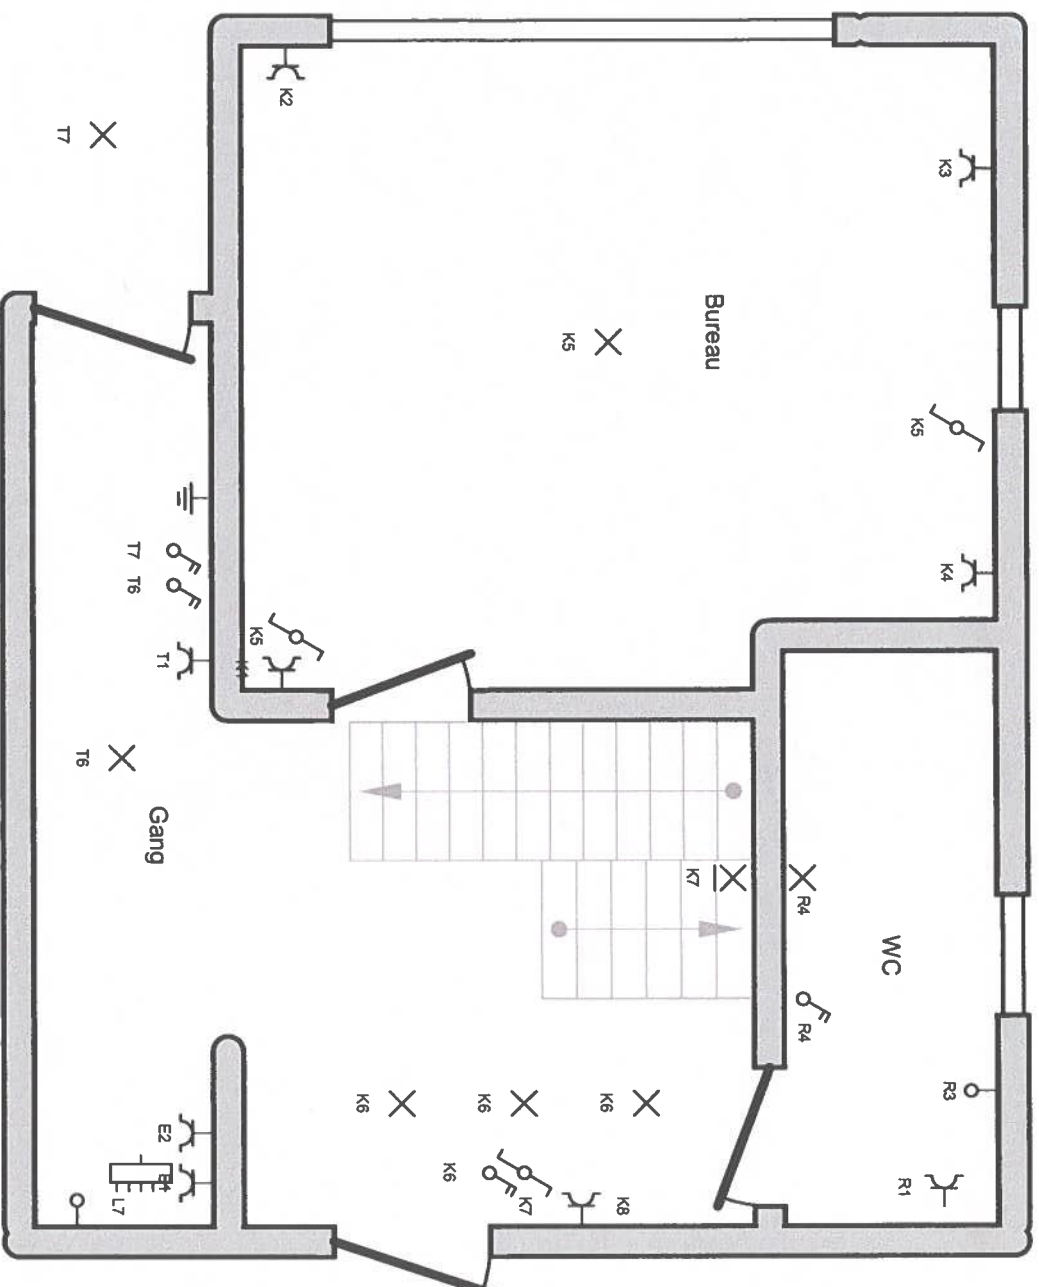

Plaats van de elektrische installatie
visserijstraat 114A

Installateur

p. 5/9
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

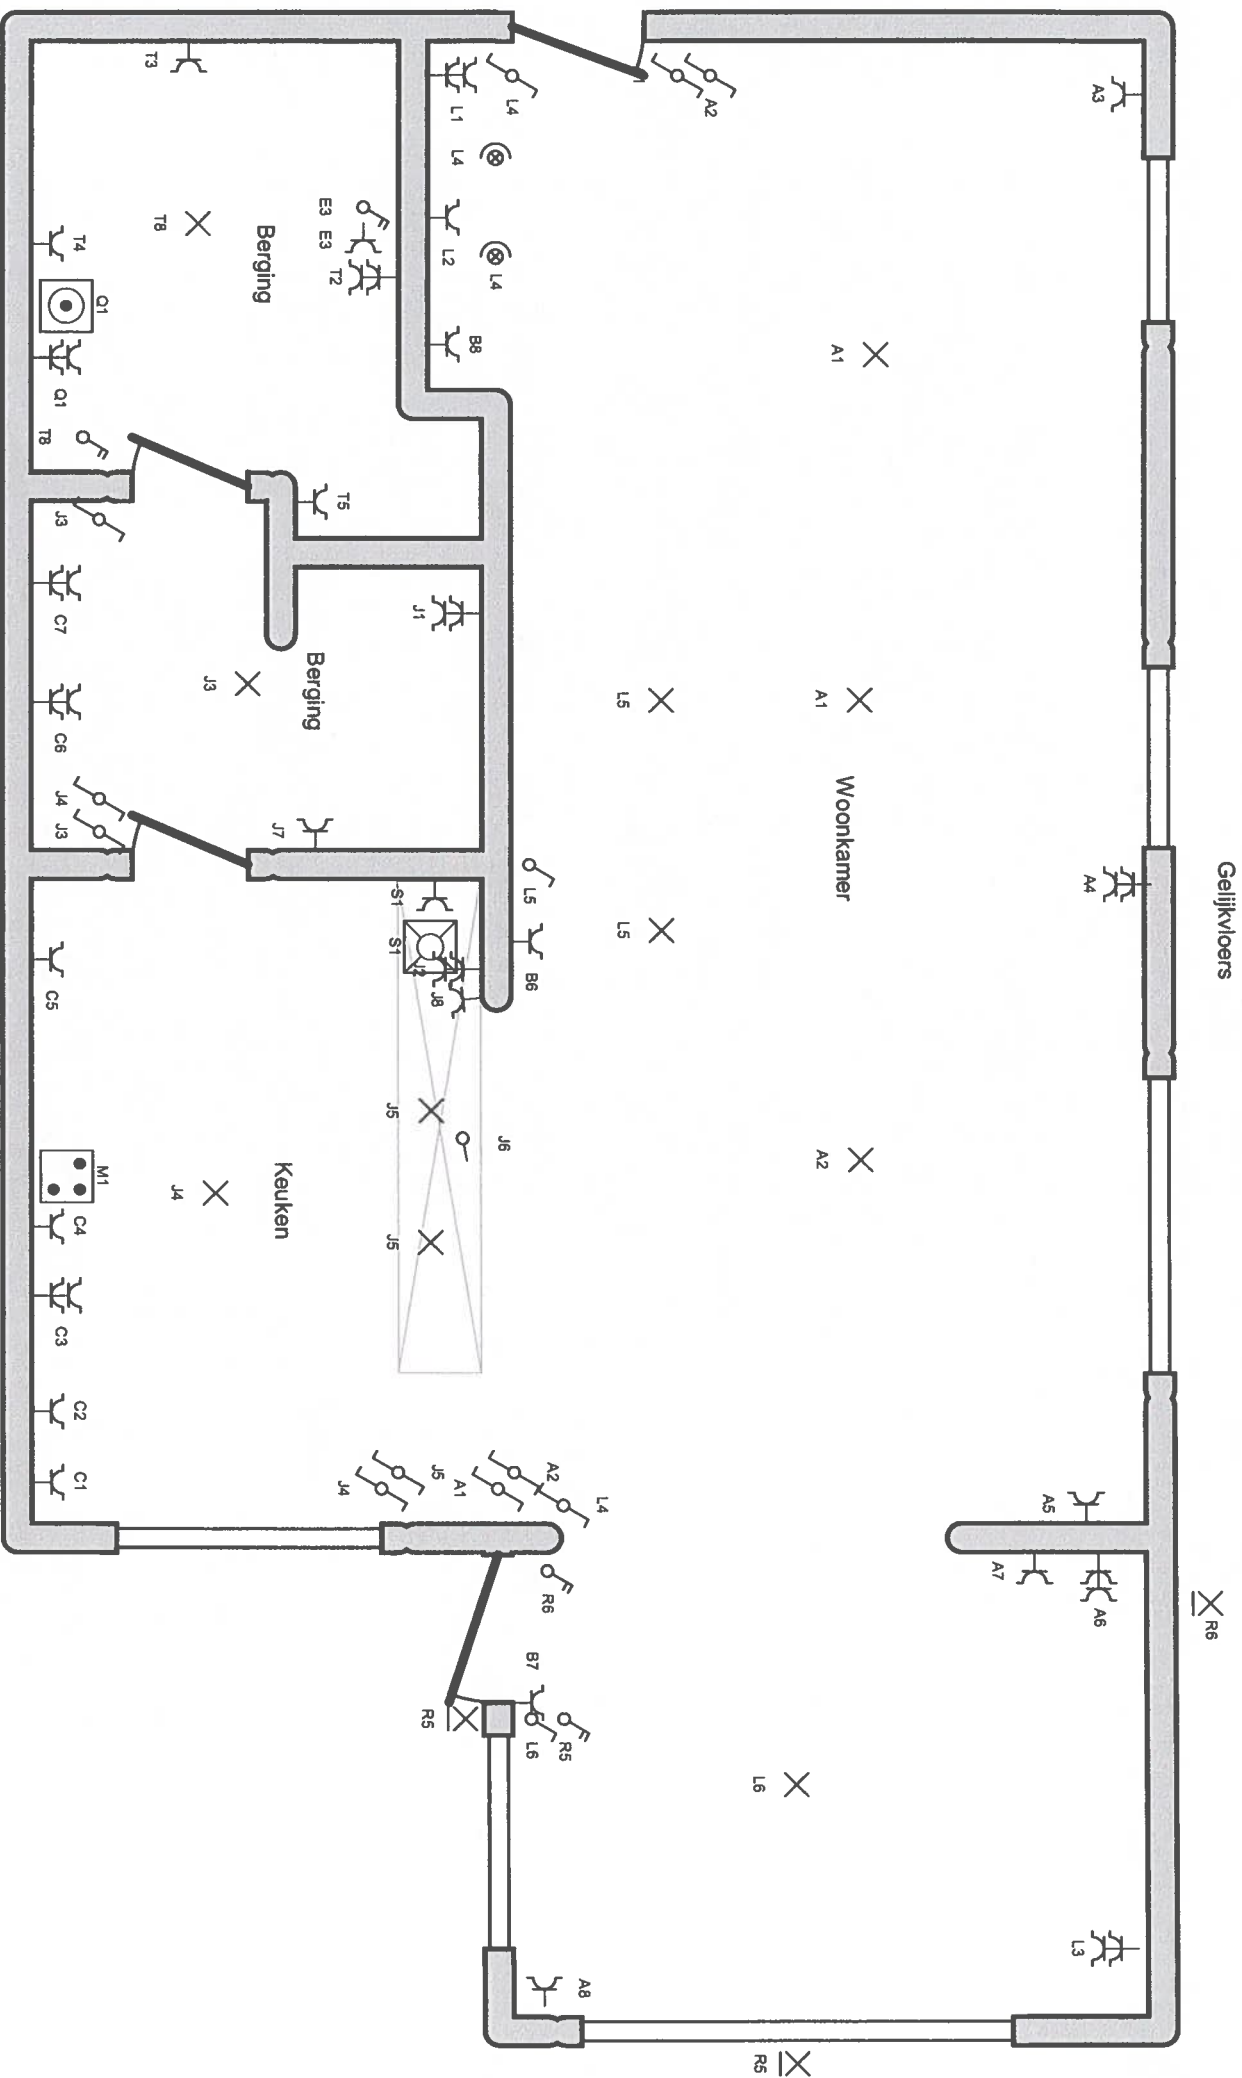


Plaats van de elektrische installatie
visserijstraat 114A

Installateur

p. 6/9
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

Tuinhuis

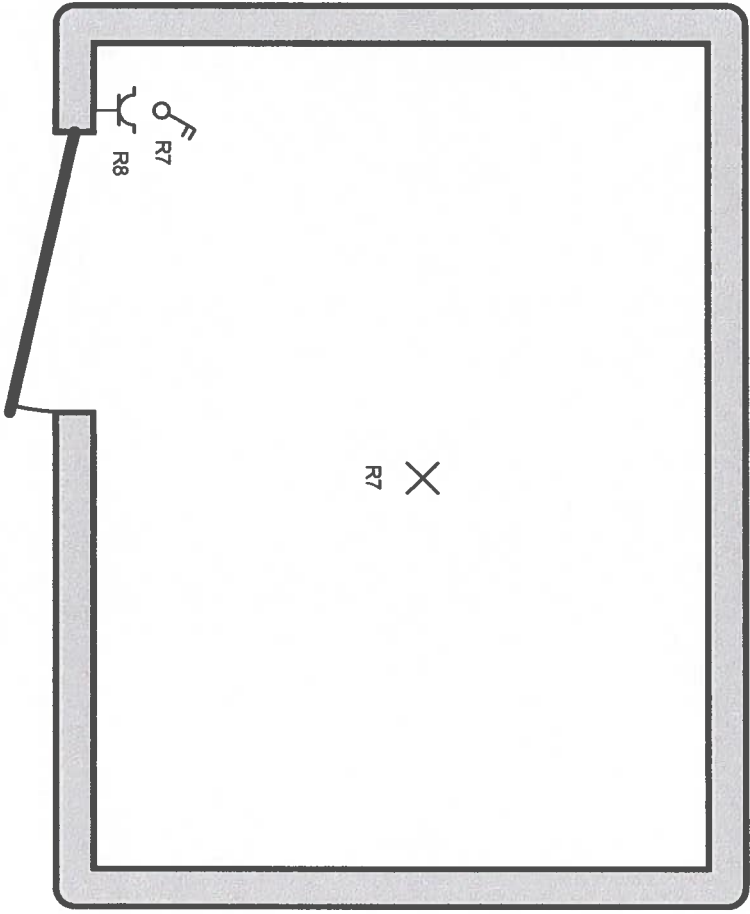


Plaats van de elektrische installatie
visserijstraat 114A

Installateur

p. 7/9
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

1e Verdieping

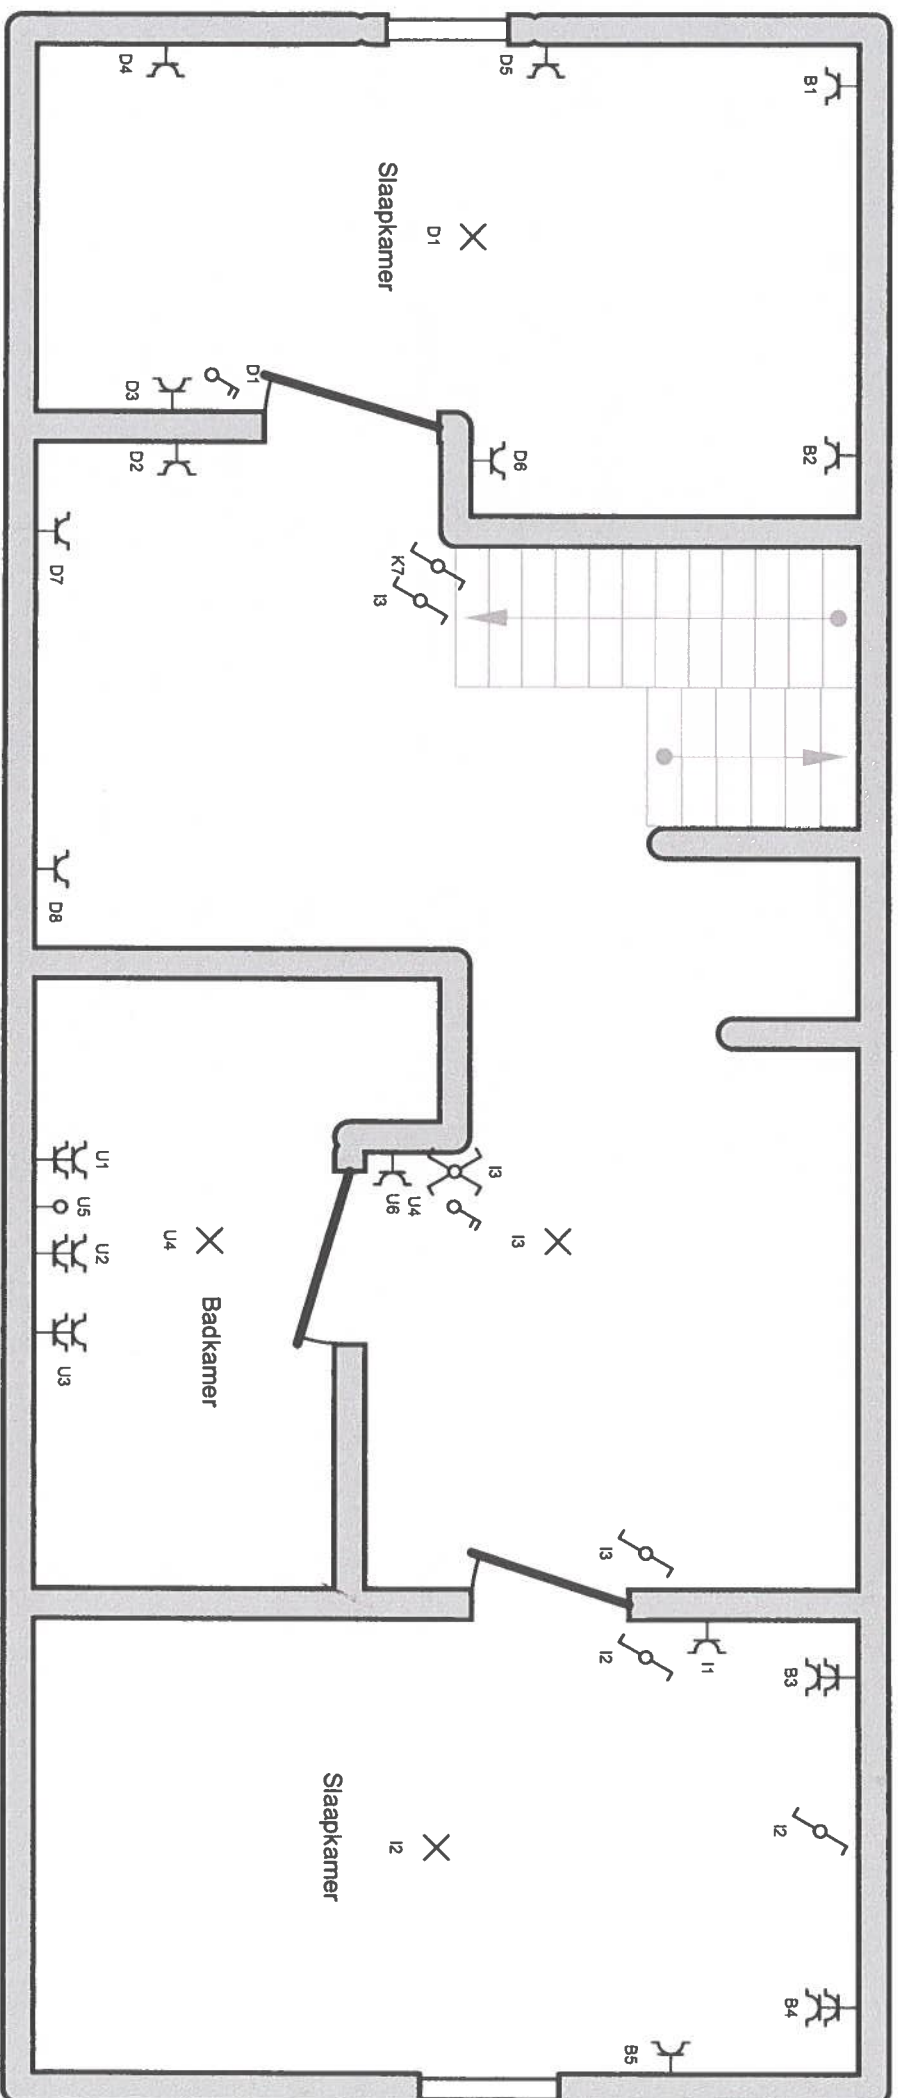

Plaats van de elektrische installatie
visserijstraat 114A

Installateur

p. 8/9
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

A:	woonkamer
B:	stopc boven links
C:	stopc keuken
D:	slaapkamer 1
E:	pomp + ventilatie + stopc kast
F:	VRU
G:	VRU
H:	VRU
I:	gang boven
J:	keuken + berging
K:	Bureau + trap + gang onder
L:	inham living
M:	kookvuur
N:	VRU
O:	VRU
P:	VRU

Q:	droogkst
R:	wc + veranda + buitenverlichting+ tuinhuis
S:	vaatwasmachine
T:	voordeur+gang+wasplaats
U:	badkamer

Plaats van de elektrische installatie visserijstraat 114A	Installateur	p. 9/9 Lijst Kringen 3 x 400V + N – 50Hz
--	--------------	--

