

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 20/07/2016 Inspecteur: Bert Deplae Meritor: Installateur: Opteco
Datum verslag: 26/07/2016 B.T.W. nr.: BE 0500 511 189 IK. nr.:
Merk en type meettoestel: Fluke Serie Nr.: 2659095 Toestel mag gebruikt worden tot:
1653B 04/01/2017

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Koerslaan
Huisnummer 59 huis 9
Postcode 8450
Gemeente Bredene

Eigenaar:

Naam Roeland Ronny
Straatnaam -
Huisnummer -
Postcode -
Gemeente -

EAN : 541 448 820 054 445 312

Teller Nr.: : 15886121

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een PV installatie $\leq 10\text{kVA}$ volgens AREI artikels 270, 86 en synergid C10/11.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 25 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 1 Aardelektrode: Lusp en weerstand: 1,98 Ω Isolatie: 1 M Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I_{Δ}	I_n	I_t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A		ok	ok
mA	A				-	-
mA	A				-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming	P	Sectie	Aantal kringen	Curve	Bescherming	P	Sectie
1	C	25	2	mm ²					mm ²
				mm ²					mm ²
				mm ²					mm ²
				mm ²					mm ²

Visueel nazicht (algemeen)

☒ OK ☐ NOK

Directe aanraking

☒ OK ☐ NOK

Indirecte aanraking

☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen

☒ OK ☐ NOK

Correcte schema's

☒ OK ☐ NOK

schema in bijlage door Aceg vzw ☒

Equipotentiale verbindingen

☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting

Continuïteit

☒ OK ☐ NOK

Verlichting / toestellen

☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

GROENE METER

Serie Nr:

Meterstand

CE markering

MID markering

Phase

Phase

Phase

OMVORMER(S)

Beveiliging

Aantal	Pac max (W)	Iac (A)	Merk - Type	Serie Nr:	Curve	IN (A)	UDC Max < UDC panelen/string	IDC Max < I str1 + I str2 + ...
1	4000	22	SMA SB 4000TL-21	2130410730	C	25	☒ OK ☐ NOK	☒ OK ☐ NOK
							☐ OK ☐ NOK	☐ OK ☐ NOK
							☐ OK ☐ NOK	☐ OK ☐ NOK
							☐ OK ☐ NOK	☐ OK ☐ NOK

**FOTOVOLTAISCHE
ZONNEPANELEN**

Aantal	Merk	Type	Piekvermogen per stuk	Totaal Piekvermogen
18	JINKO	JKMS265P	265 Wp	4770 Wp

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

02 Geen inbreuken vastgesteld.

06 Deze controle omvat enkel de PV-installatie.

CONCLUSIE

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 20/07/2041
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 1

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bert Deplas

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de FOD economie, IWO, middenstand en Energie – algemene directie energie, aldeling gas – elektriciteit

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3298 4322 - BTW BE0839 866 481

KOERSLAAN 59 huis 9
8450 BREDENE

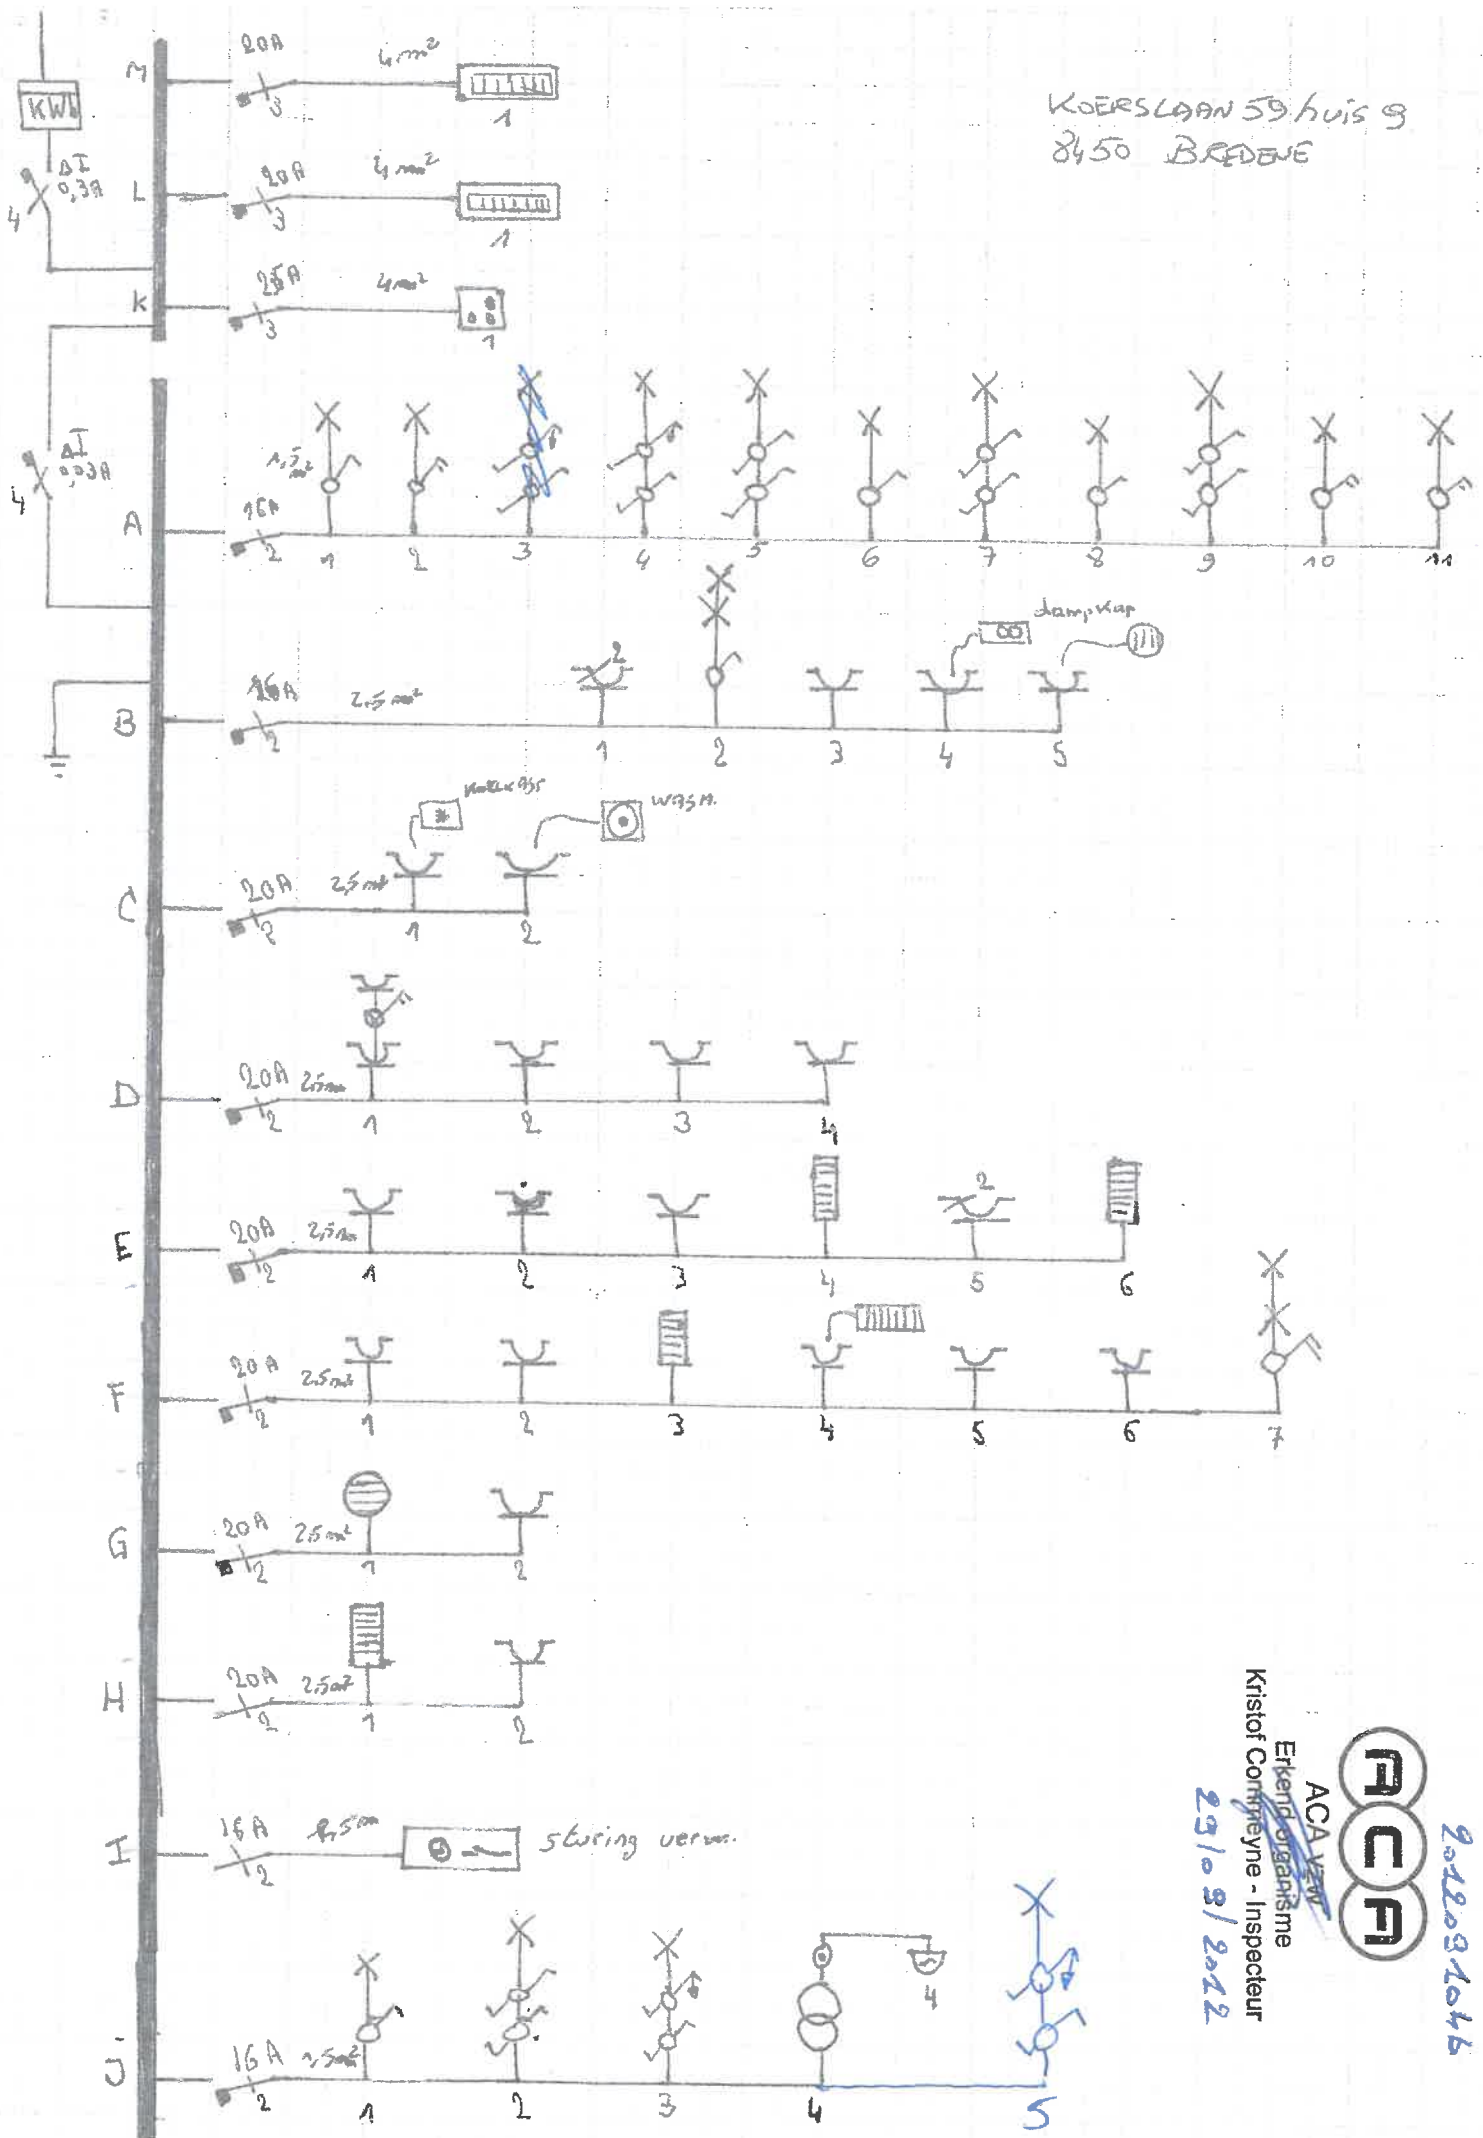

KOERSLAAN 58 huis 9
8450 Bredene

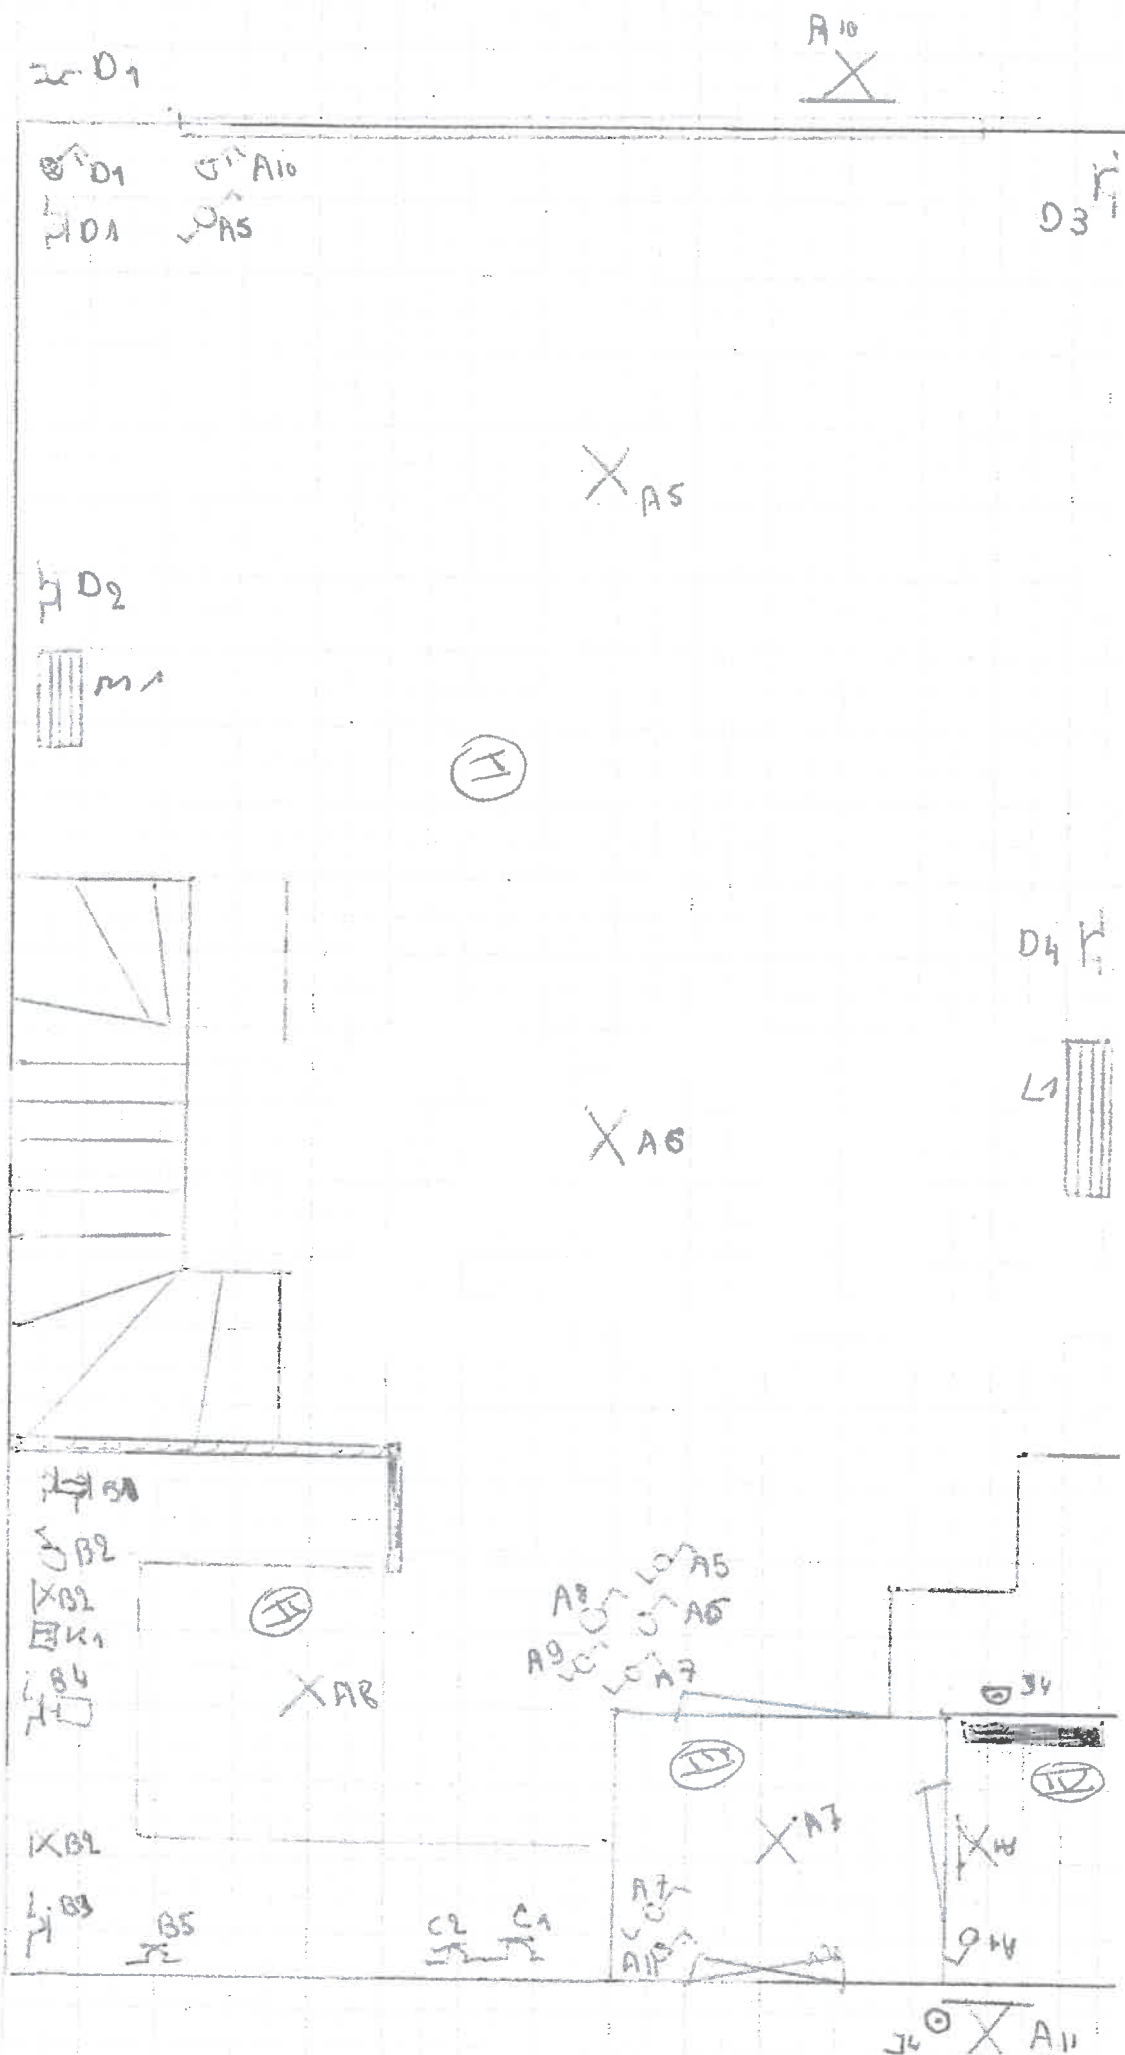


9012031016



ACA vzw
Erkend organisme
Kristof Commeyne - Inspecteur
23/03/2012

KOERSLAAN 59 huis 9
3450 BREDEVE

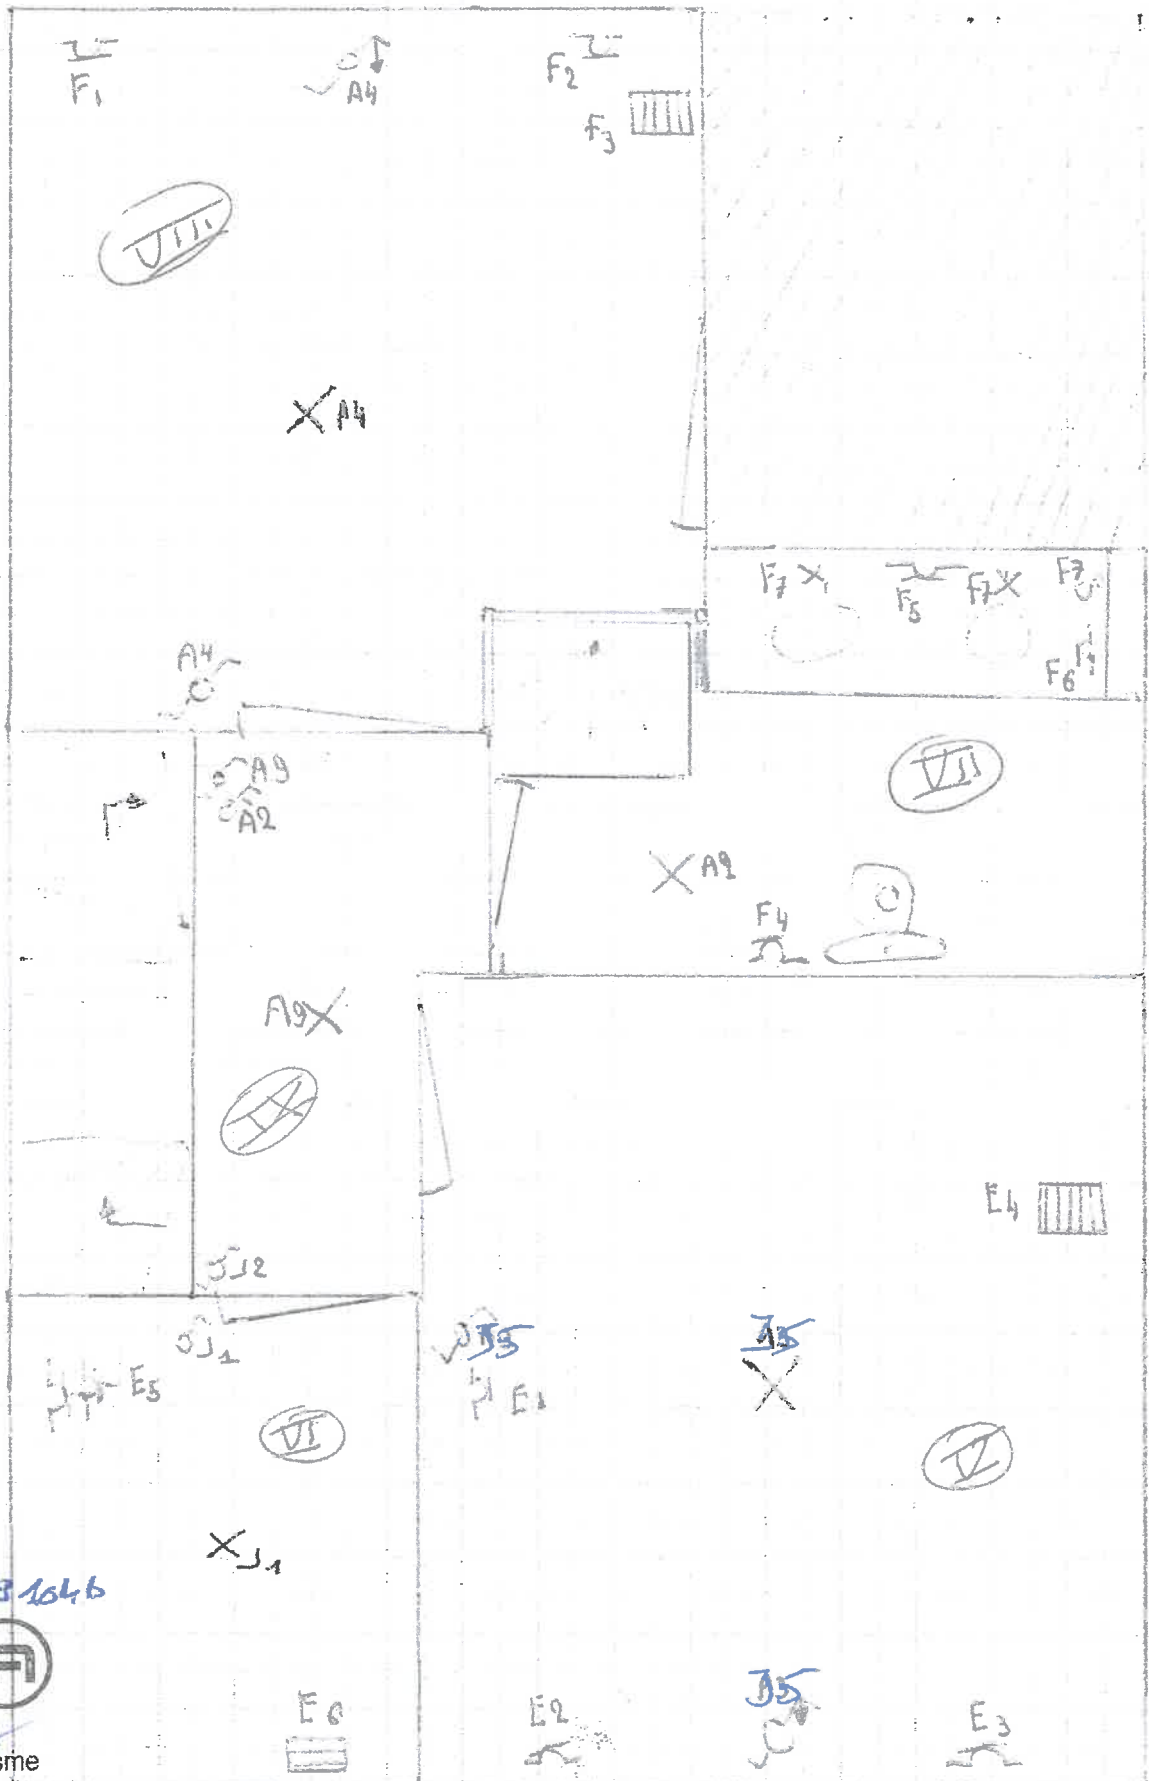

2012031646




ACA vzw
Erkend organisme

Kristof Commeyne - Inspecteur

28/07/2012

- I Living
- II KEUKEN
- III HAL
- IV WC
- V SLEEP
- VI Dressing
- VII Badkamer
- VIII Speelkamer
- IX overloop
- X overloop Zolder
- XI Zolder

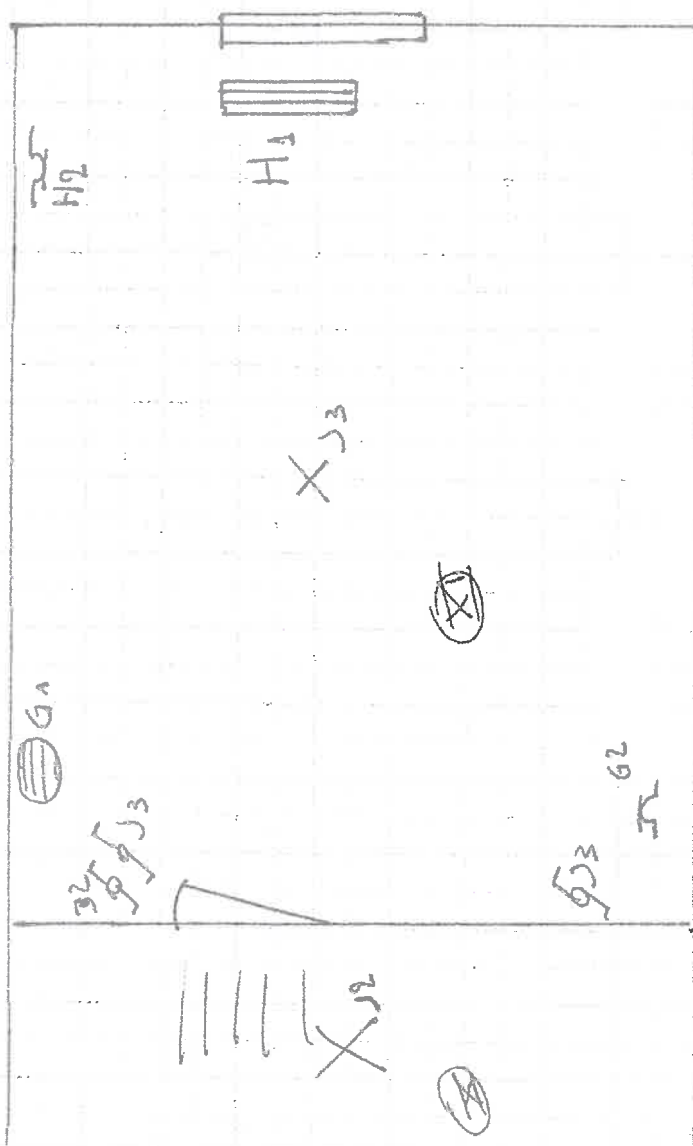

KOERSLAAN 53 h/w 3
8450 BREDEVE

Eig: ROELAND KONNY
Nijlense Str 119
2270 HERENTHOUT

2022091046



ACA VZW
Erkend organisme
Kristof Commeyne - Inspecteur
28/09/2022
