

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 26/11/2024

Inspecteur: Niel Tersago

Mentor: -

Installateur: Generaties Lissens BV

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.: BE 0898 997 780

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251368

Datum verslag: 26/11/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Venneheidestraat
Huisnummer 4
Busnummer -
Postcode 3201
Gemeente Langdorp
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam Venneheidestraat
Huisnummer 4
Busnummer -
Postcode 3201
Gemeente Langdorp
Land België

Via immo
Venneheidestraat
4
-
3201
Langdorp
België

Installateur

Naam Generaties Lissens BV
BTW nr. BE 0898 997 780
Telefoonnummer +32 499 80 73 61
E-mail willem@lissens.be

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: : 25946118

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 16 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 20

Ri algemeen: 3,62 MΩ

RE: 10,91 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	Algemeen	22,5kA2s (3000A)	A	Alle	NOK	NOK
30	40	Bijkomend	22,5kA2s (3000A)	A	-	NOK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	C	20	Zie schema's	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	NOK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.03 Schema(s) stemt (stemmen) niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

I5.02 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1. en 3.1.3.3.A. en 5.1.6.1)

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

nota/note 8 De elektrische installatie was niet volledig toegankelijk, wij hadden geen toegang tot volgende lokalen :

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 26/11/2025. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

- Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:
- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
 - de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 13:01 tot 13:42

De inspecteur Niel Tersago




Niel Tersago
ACEG VZW - #297


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

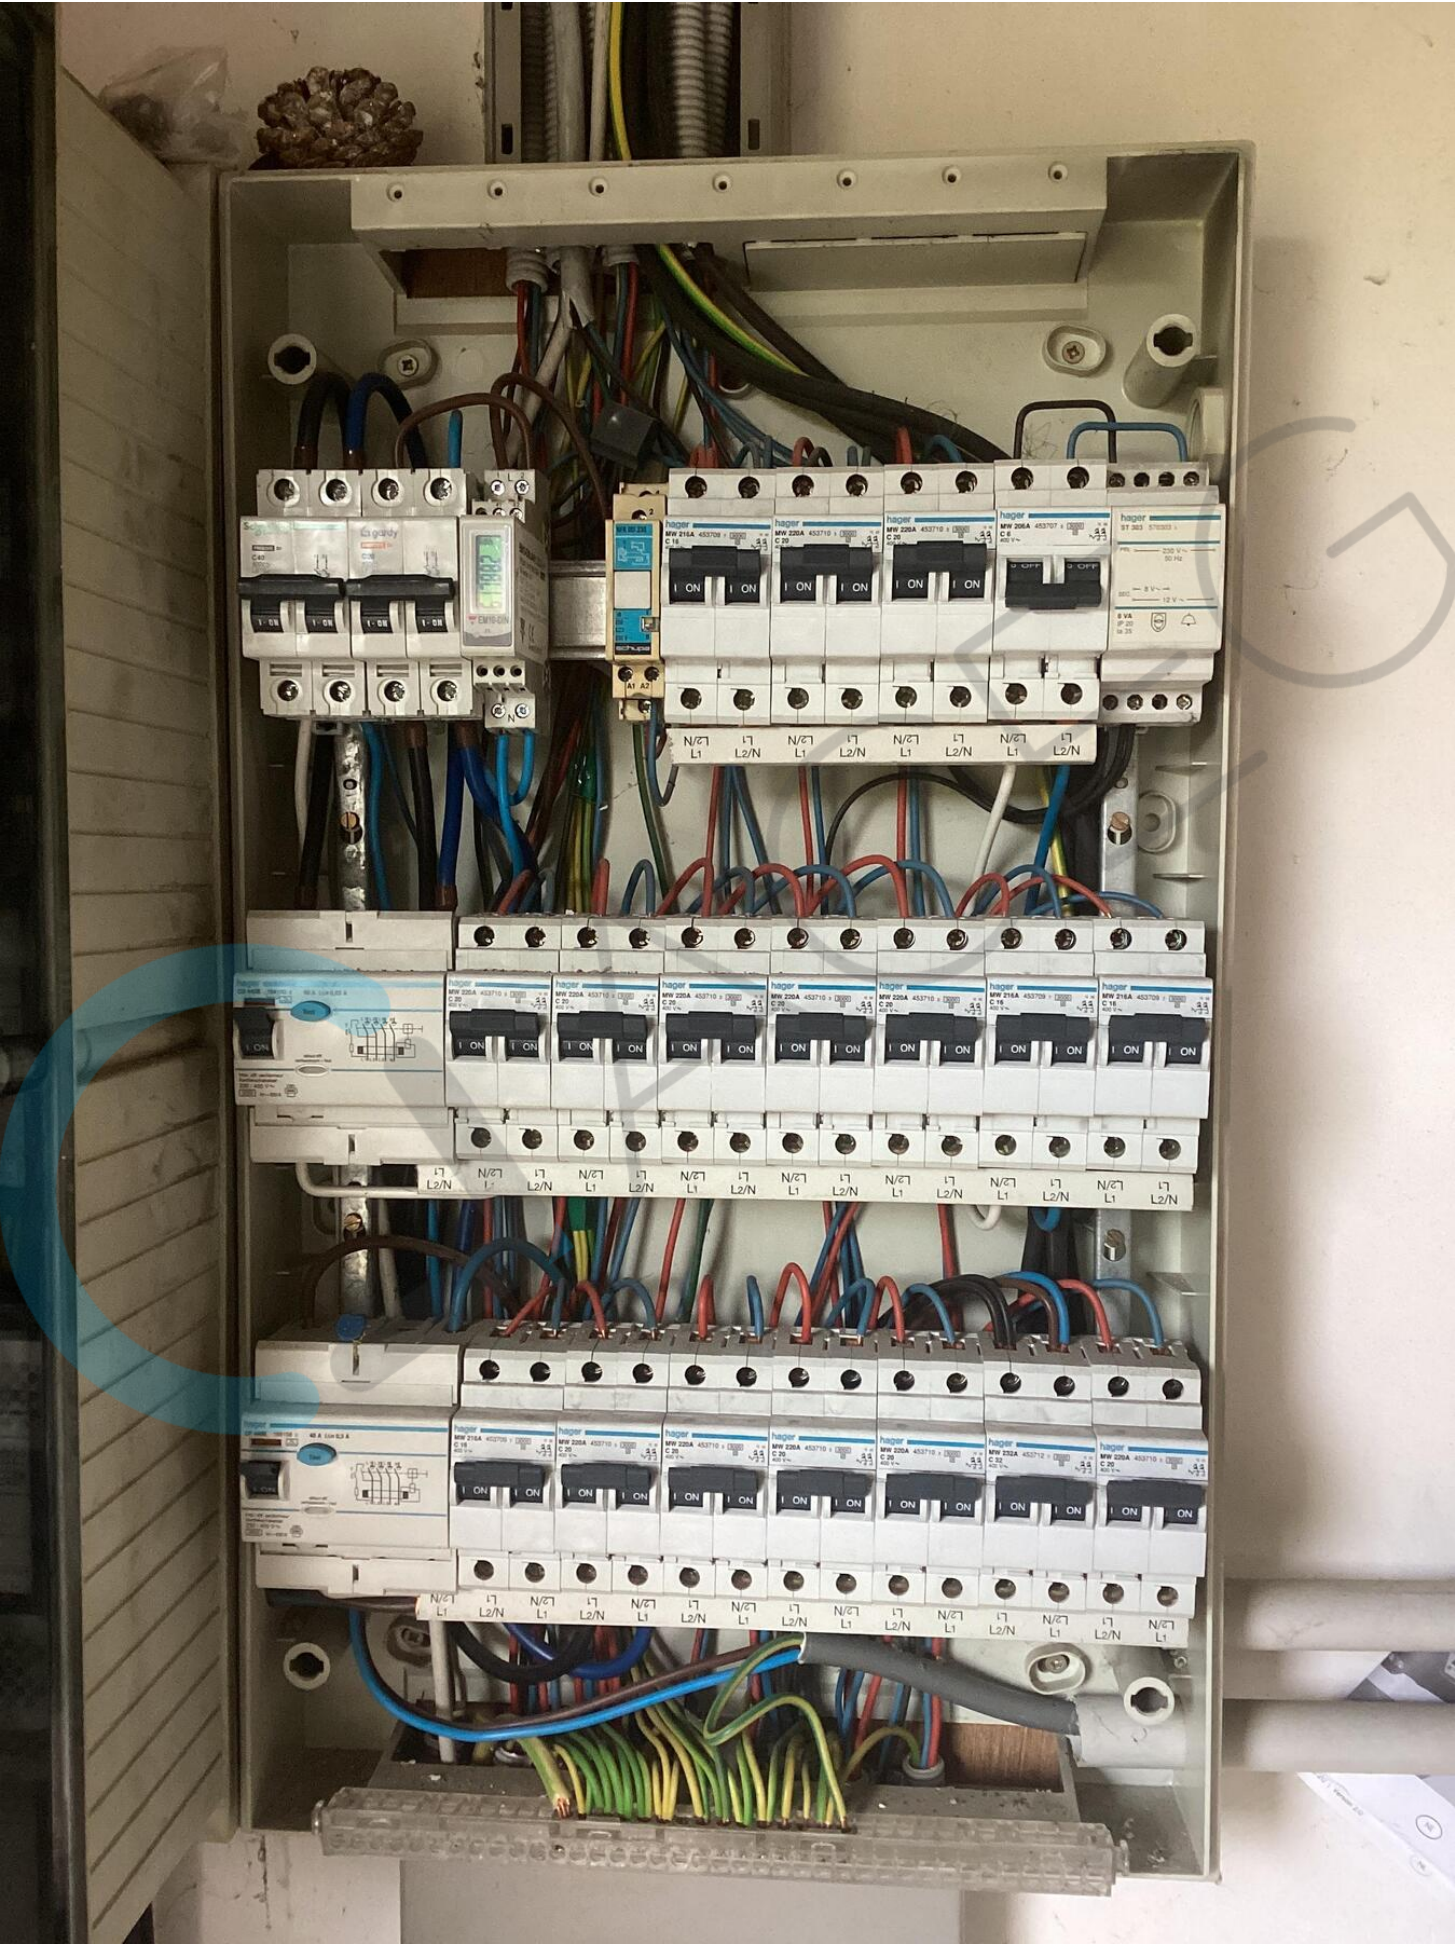

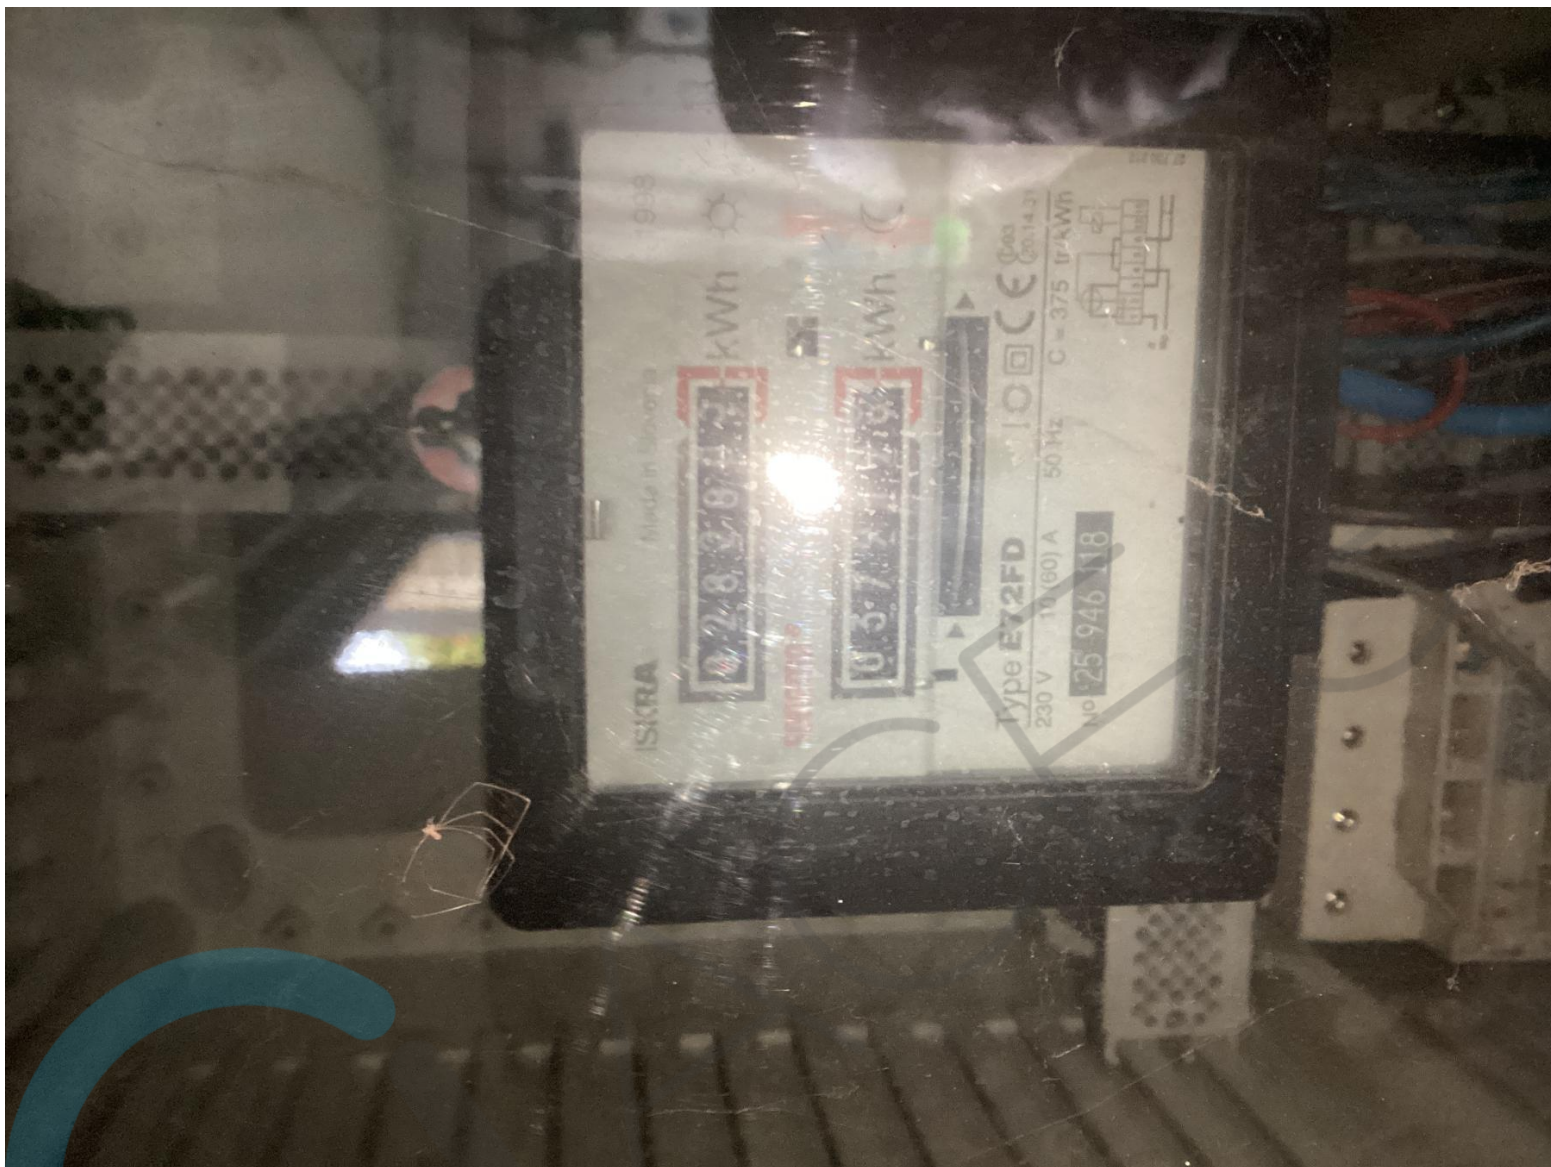



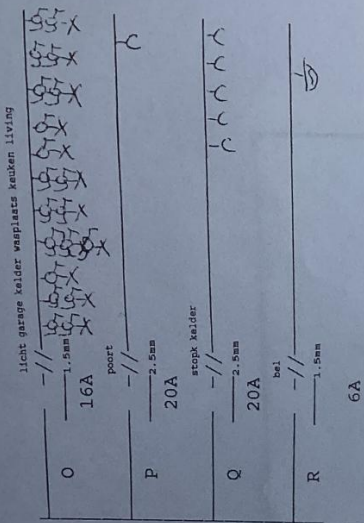

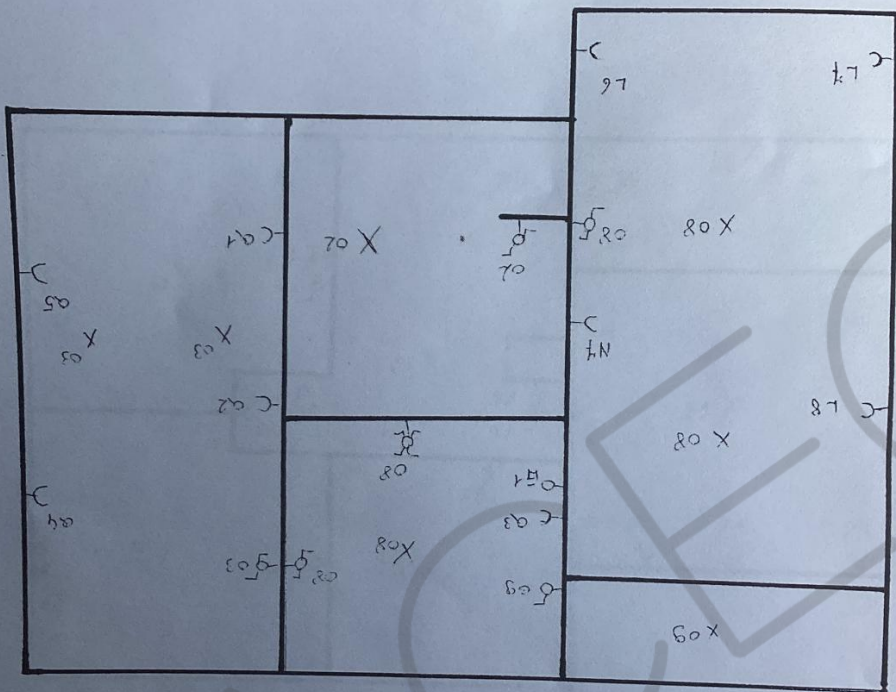

MUËS HOMBERG AARSCHOT

A	droogkast 20A	stopk slaapk 2-3 nachthal dressing badkamer
B	20A	stopk gurege wasplaats
C	20A	stopk gurege wasplaats
D	20A	stopk gurege wasplaats
E	20A	stopk gurege wasplaats
F	16A	stopk gurege wasplaats
G	16A	stopk gurege wasplaats
H	16A	stopk gurege wasplaats
I	20A	stopk gurege wasplaats
J	20A	stopk gurege wasplaats
K	20A	stopk gurege wasplaats
L	20A	stopk gurege wasplaats
M	32A	stopk gurege wasplaats
N	20A	stopk gurege wasplaats

40A
0.030

KWH

40A
0.300

CONFORM T.B.V.
DE INSPECTEUR: 35
DATUM

[Handwritten signature]
3/12/2023

