

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 02/08/2024

Inspecteur: Niel Tersago

Mentor: -

Installateur: Pieter Dujardin

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251368

Datum verslag: 05/08/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Nederdellelaan
Huisnummer: 20
Busnummer: -
Postcode: 3090
Gemeente: Overijse
Land: België

Eigenaar

Naam: Dujardin
Straatnaam: Nederdellelaan
Huisnummer: 20
Busnummer: -
Postcode: 3090
Gemeente: Overijse
Land: België

Installateur

Naam: -
BTW nr.: -
Telefoonnummer: +32 2 687 33 97
E-mail: -

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: : 1SAG3105275116

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 20 A

Aantal kringen: 13

Ri algemeen: 7,25 MΩ

RE: 8,31 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	Algemeen	22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK
30	40	Bijkomend	22,5kA2s (3000A)	A	-	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	25		2	4
6	C	20		2	2,5
6	C	16		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
 nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 2/8/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Niel Tersago


 Niel Tersago
 ACEG VZW - #297

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 2/8/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




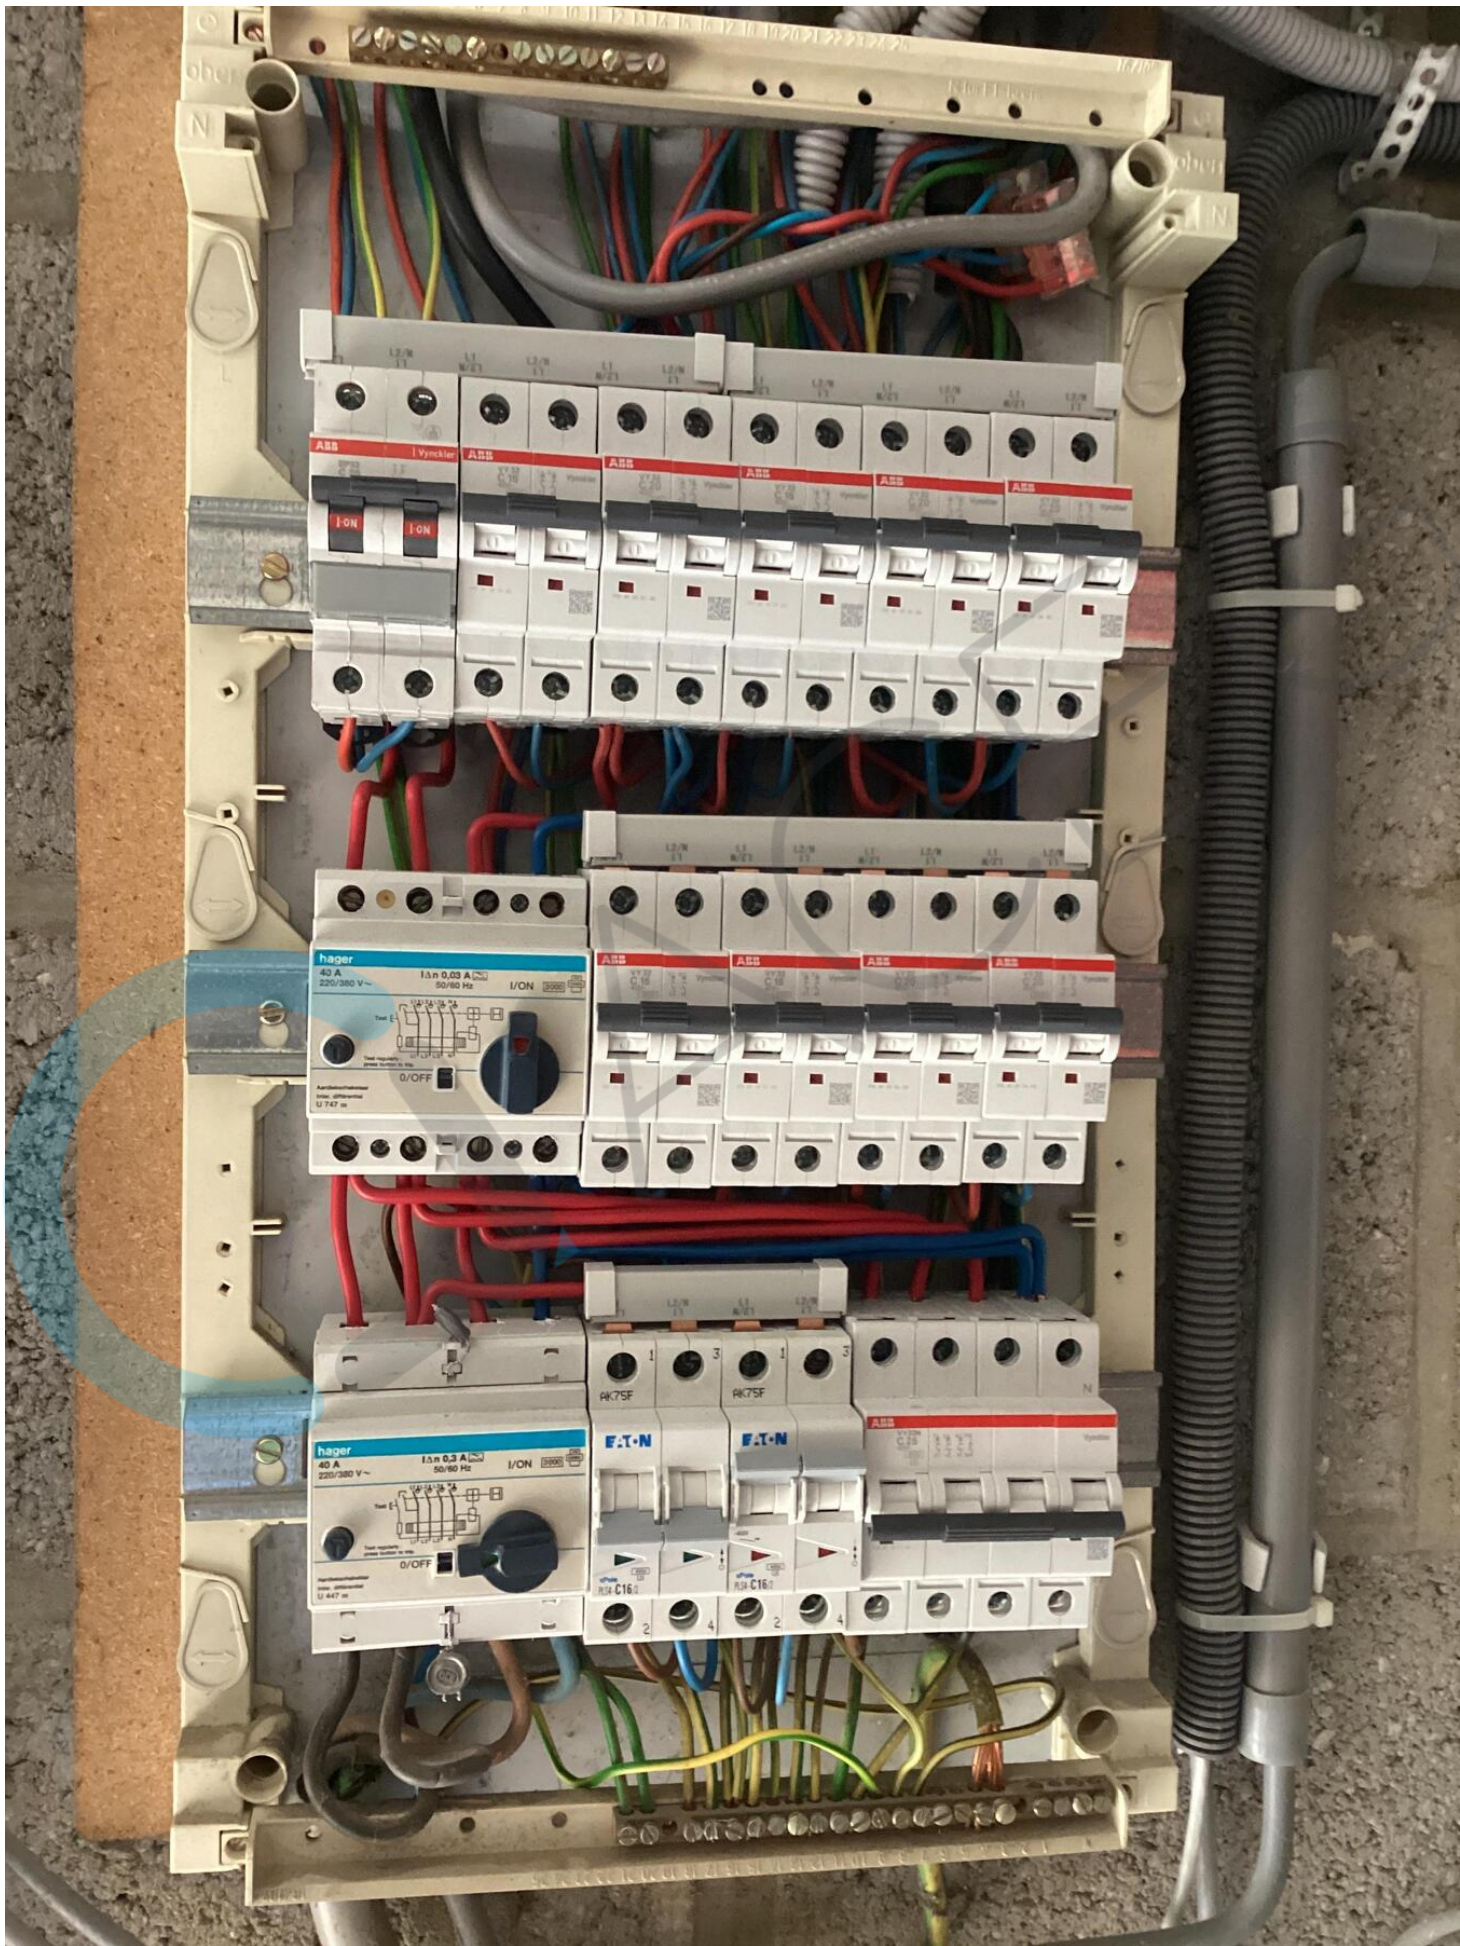

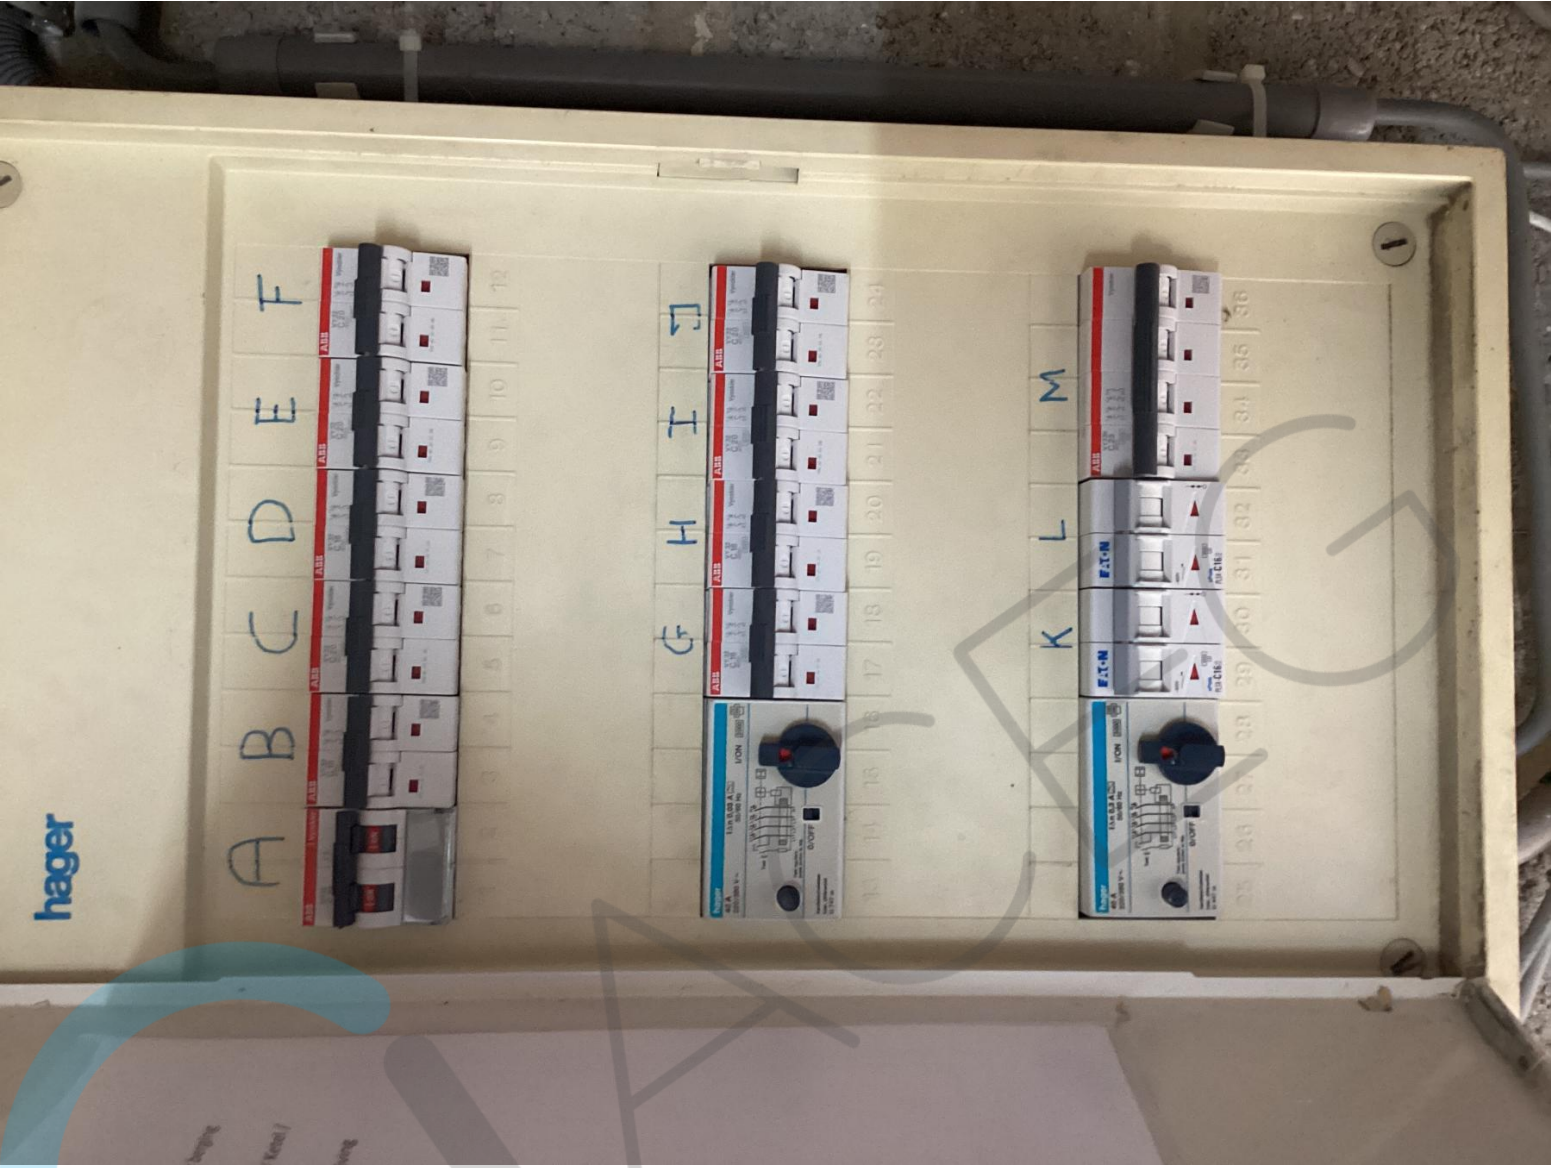



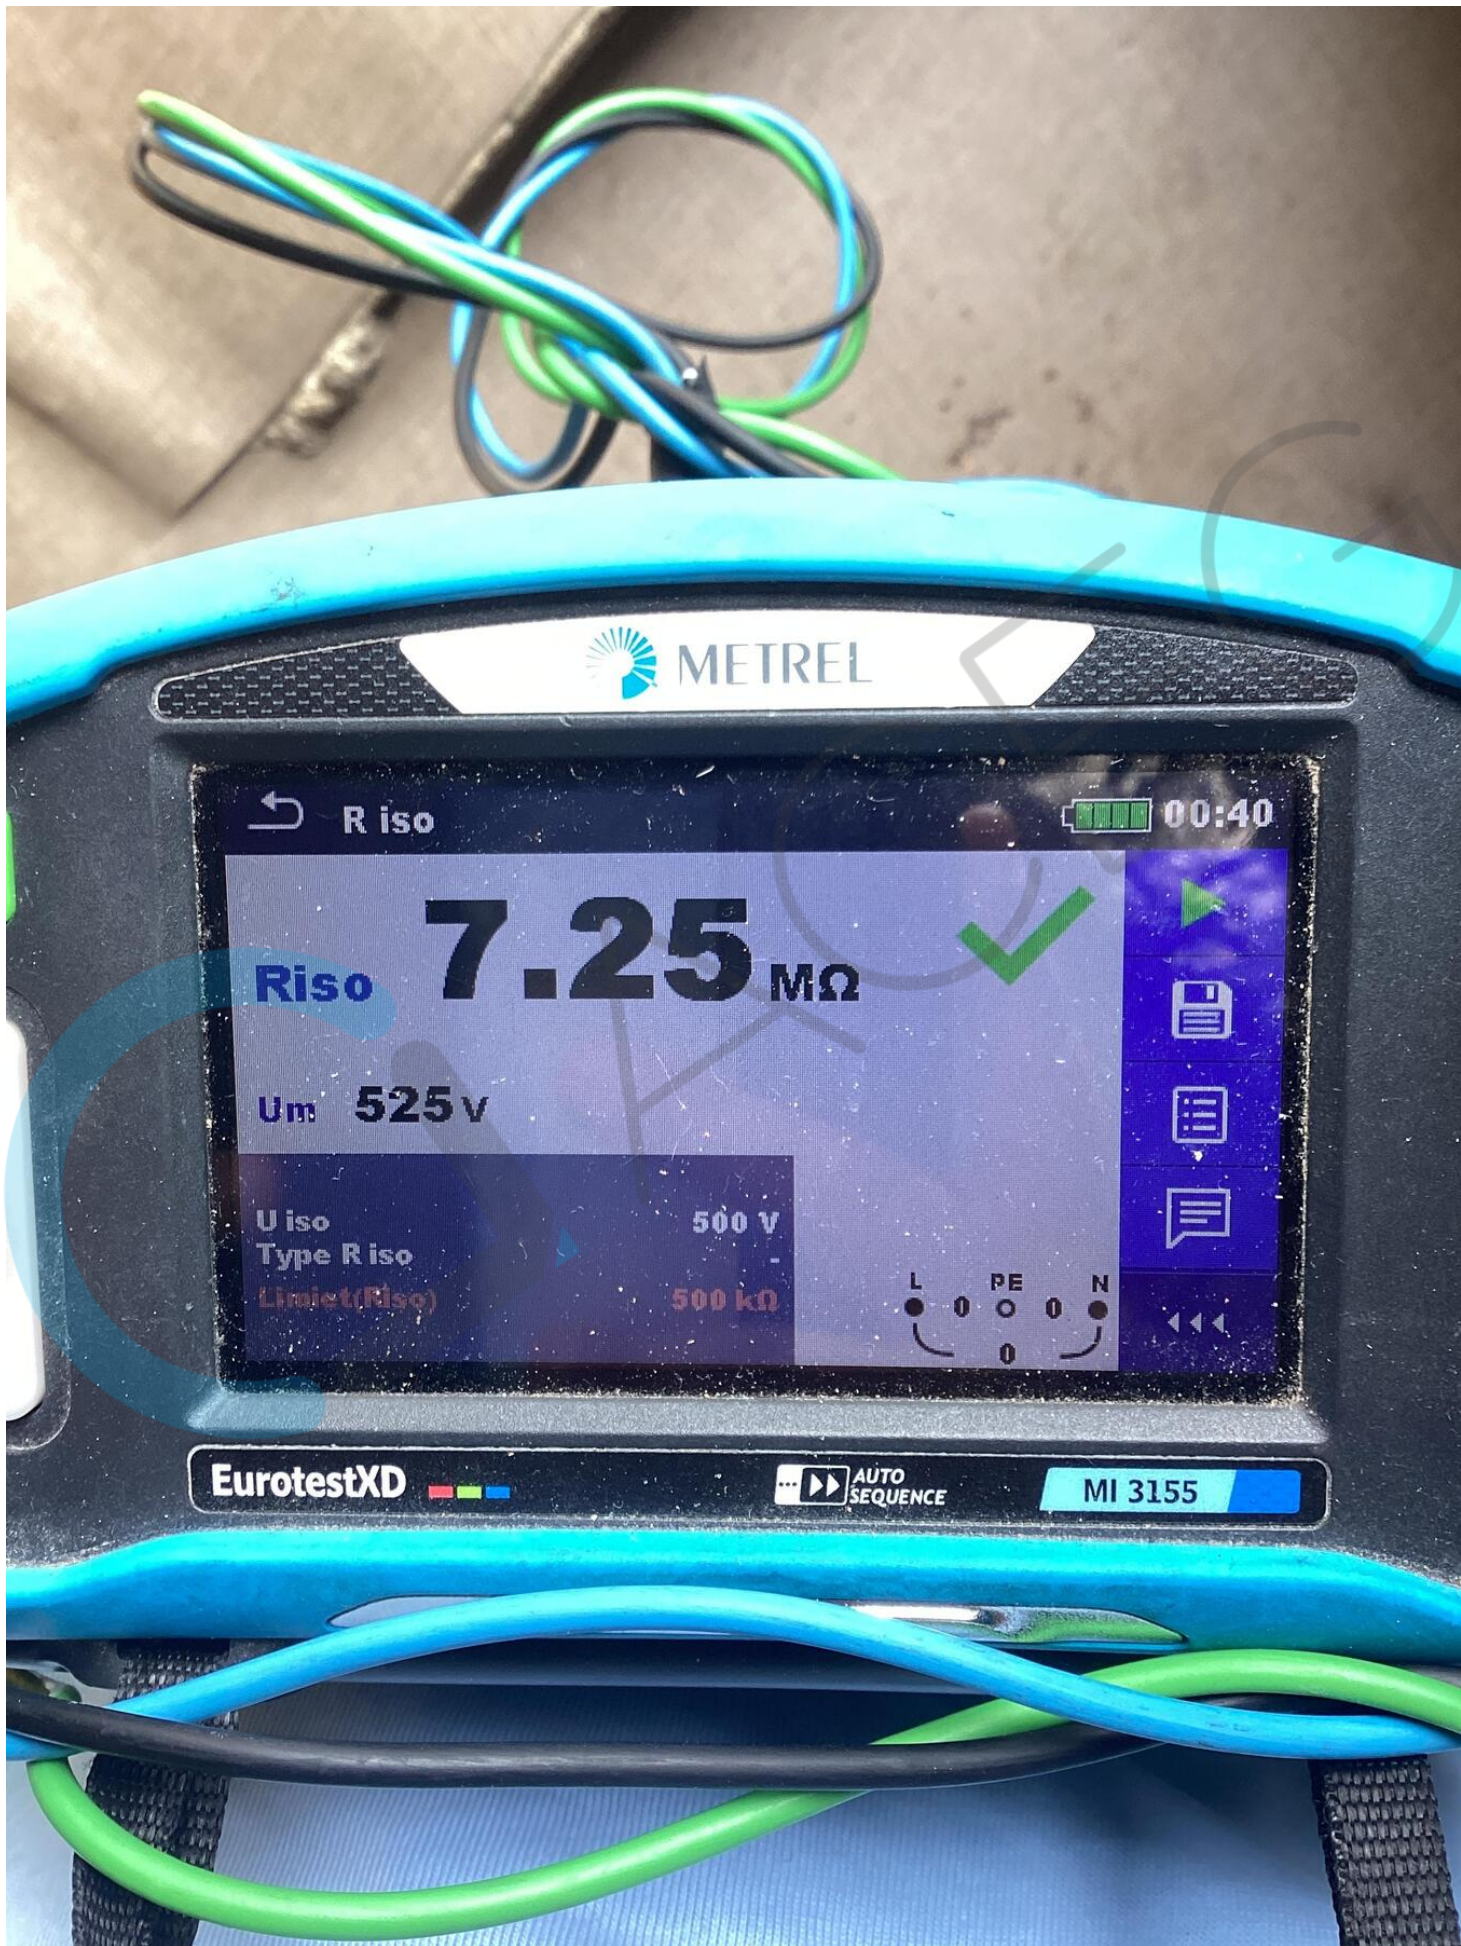

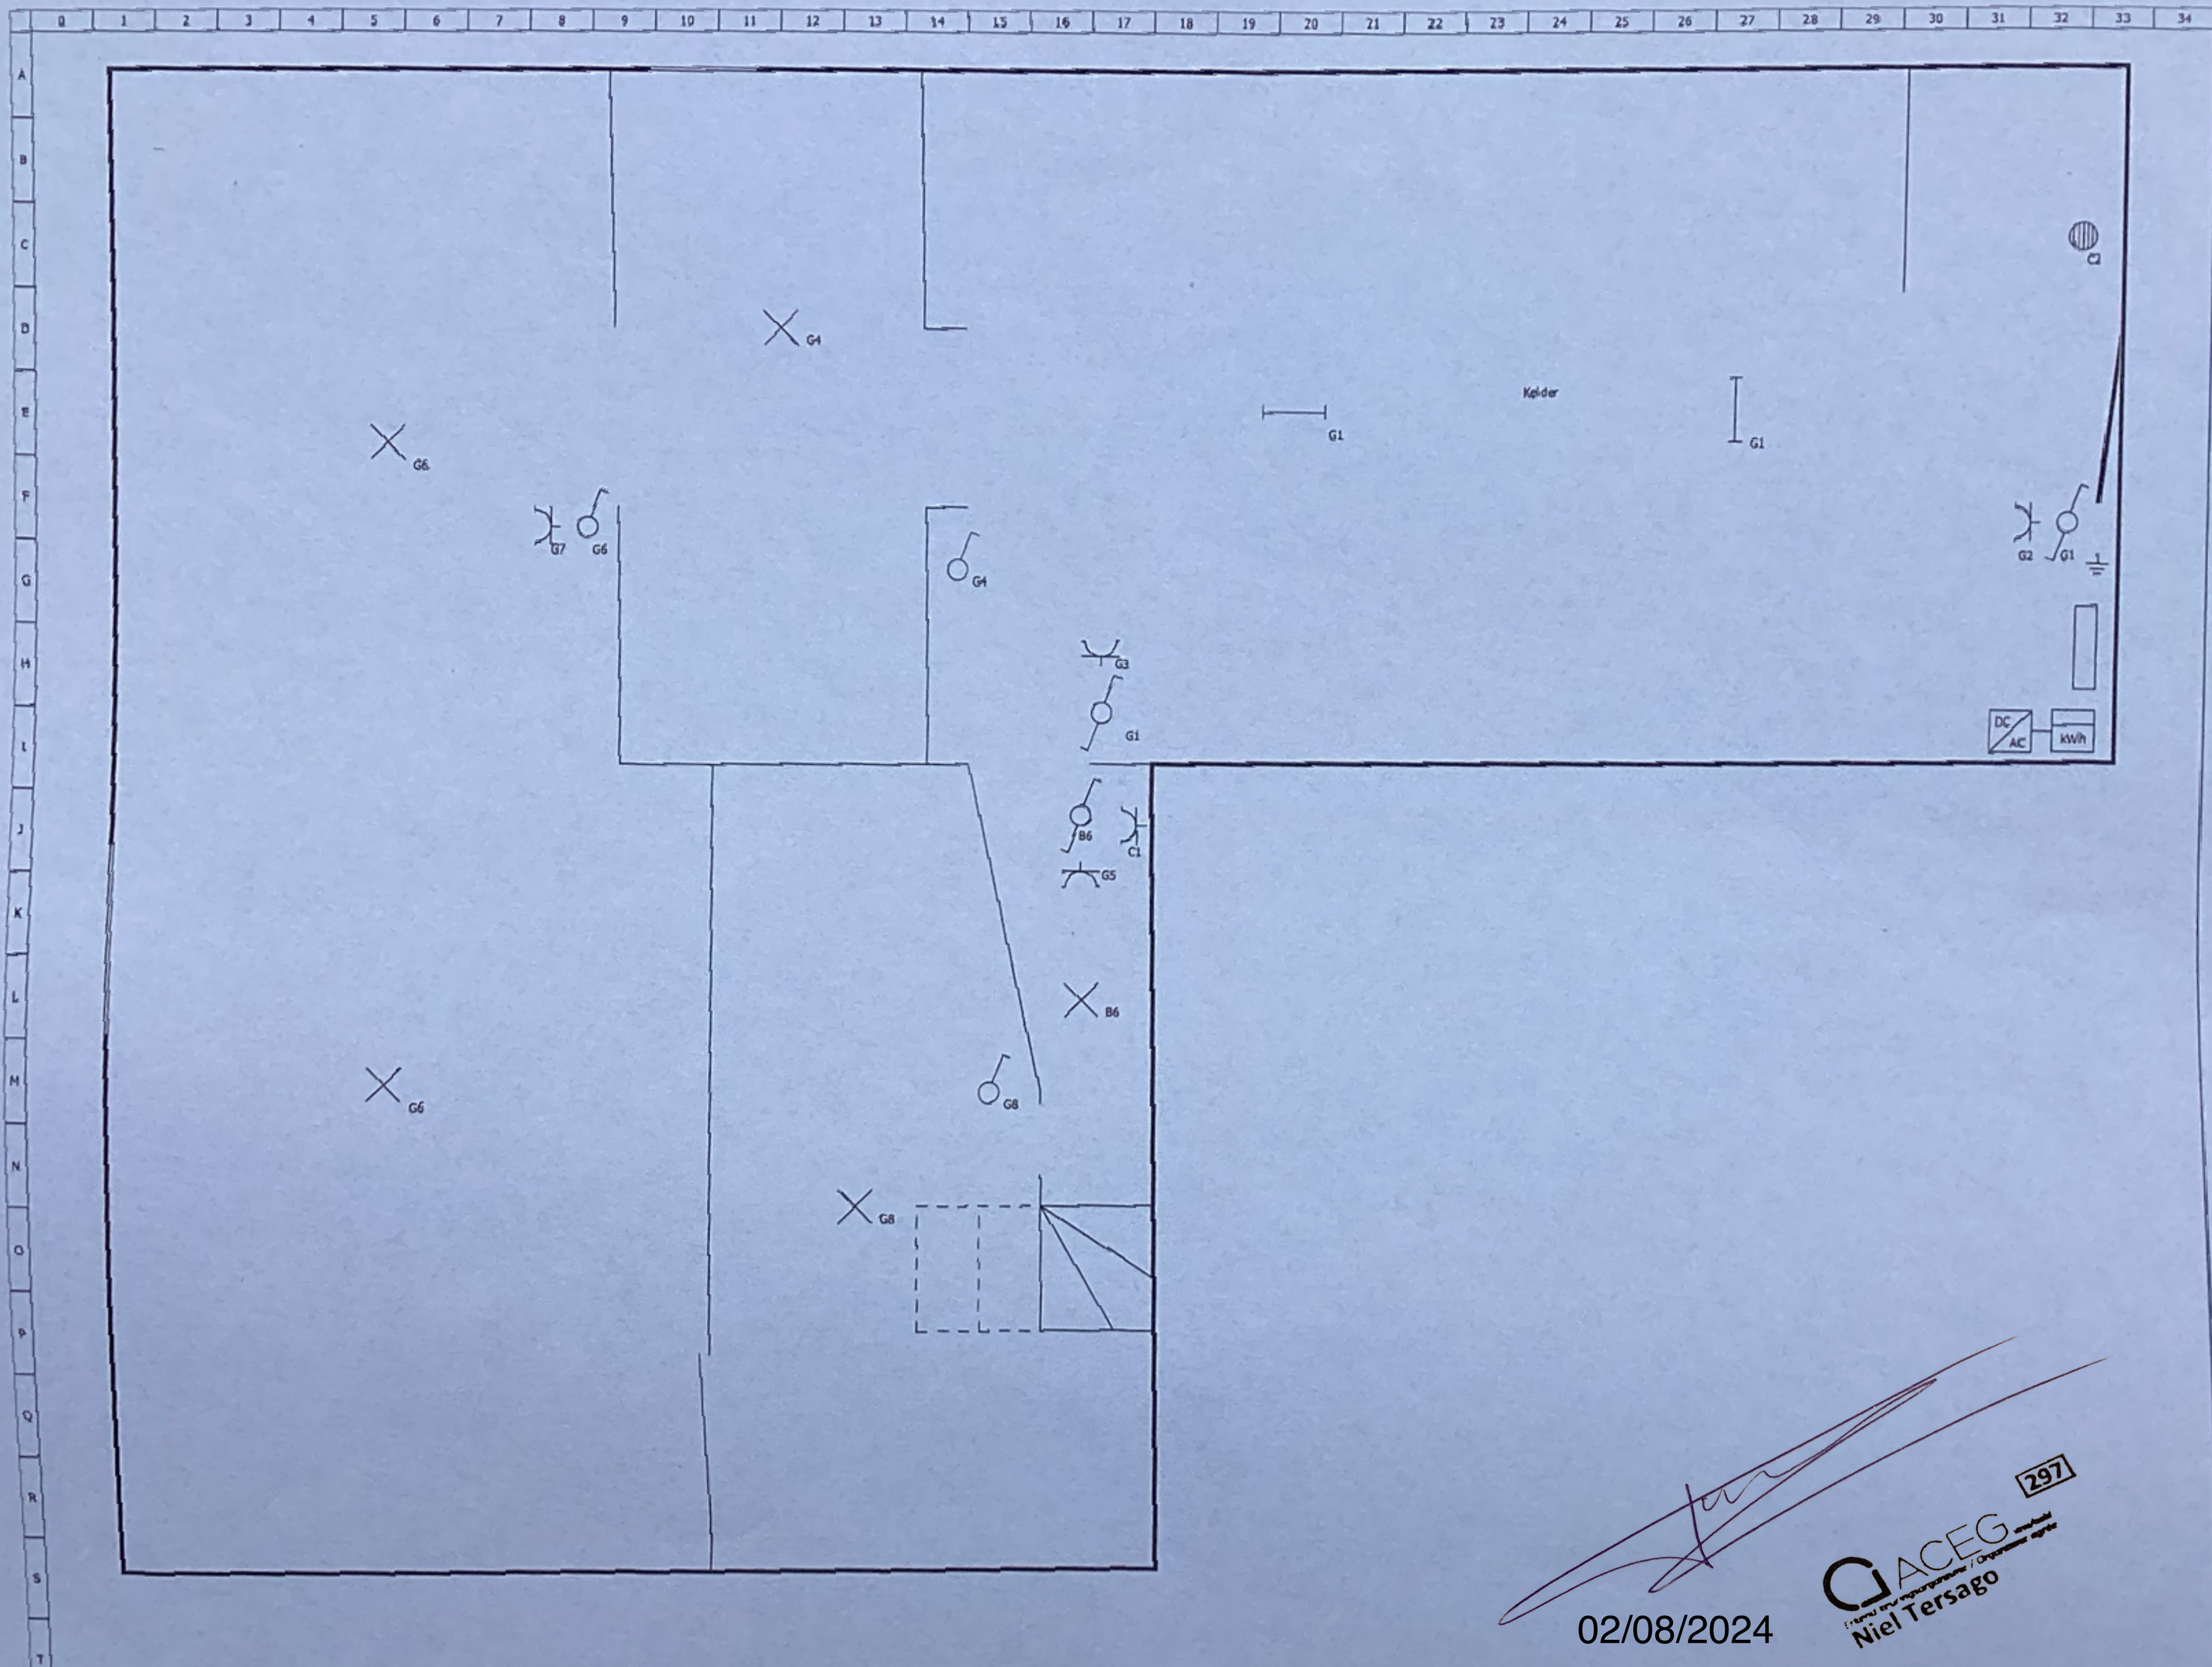

02/08/2024

ACEG
 (reken en rapportage) / Organisatie
 Niel Tersago

297

Author: P. Dupont
 Datum: 01/08/2024

SITUATIESCHEMA: Norderellaan 23 - 3090 Overijse

Folio: 2/4

- A: Stopcontacten: Slp K 3 / Hal / Living aan buiten muur
- B: Verlichting: Slp K 1 / Slp K 2 / Keuken / Berging / Kelder berging aan trap
- C: Stopcontacten: Oude ketel in Kelder berging / Nieuwe CV Ketel / aan Kachel
- D: Verlichting: Slp K 3 / Buiten lamp Voordeur / Hal / WC / Living
- E: Stopcontacten: Slp K 2 / Slp K 1 / Living aan Veranda
- F: Stopcontacten: Keuken
- G: Stopcontacten en Verlichting Kelder
- H: Stopcontacten en Verlichting Badkamer
- I: Stopcontact: Wasmachine
- J: Stopcontacten: Berging
- K: Stopcontacten: Veranda
- L: Verlichting: Veranda en Buiten lamp schuifdeur
- M: Kookfornuis

