

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116111520

Eigenaar: Verdonckt

Opdrachtgever: De Muyck Pieter
4921 Domien Geersstraat 13
9041 OOSTAKKER

Datum onderzoek : 23 mei 2018

Datum verslag: 23/05/18

Installatie ID: 216110552

Plaats van het onderzoek:
Arsenaalstraat 62
9050 Gentbrugge

I. Algemene beschrijving en kenmerken

Aard van het onderzoek	Controlebezoek wooneenheid met bouwjaar voor 1/10/1981	Aansluiting	50 A
Aantal voedingskabels	VOB 2X	Differentieel type	A
Voedingskabelsectie	16 mm ²	Differentieel ΔI	30 mA
Spanning	Mono 230	Differentieel, Aantal polen	2
Aantal borden	1	Differentieel, In	40 A
Aantal kringen (eindstroombanen)	10	Arei artikel	Art. 86 & 278
Elektrische installatie (Bouwjaar)	Voor en na 1/10/1981		
Type aardelektrode	Pennen		
Beschrijving van de installatie	Volgens schema		

II. Uitgevoerde controles

Controlebezoek : AREI art. 271

Controlebezoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

III. Vaststellingen tijdens de inspectie

Zie inbreuken en nota's in bijlage

IV. Metingen

Aardverspreidingsweerstand (Re)	11,97 Ohm
Isolatiweerstand (Ri)	0,886 Mohm

V. Besluit

A De installatie is conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden volgens AREI art. 271, uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na keuringsdatum), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Schema's afgestempeld, ondertekend en toegevoegd aan deze keuring : Ja

VI. Mededelingen

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - 3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.
 - 3.4 Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het onderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

DE AGENT ONDERZOEKER
Tom Van de Wiele



DE DIRECTEUR



Ir. Traest Bruno


PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116111520

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

VASTSTELLINGEN: Andere inbreuken

VASTSTELLINGEN: Nota's

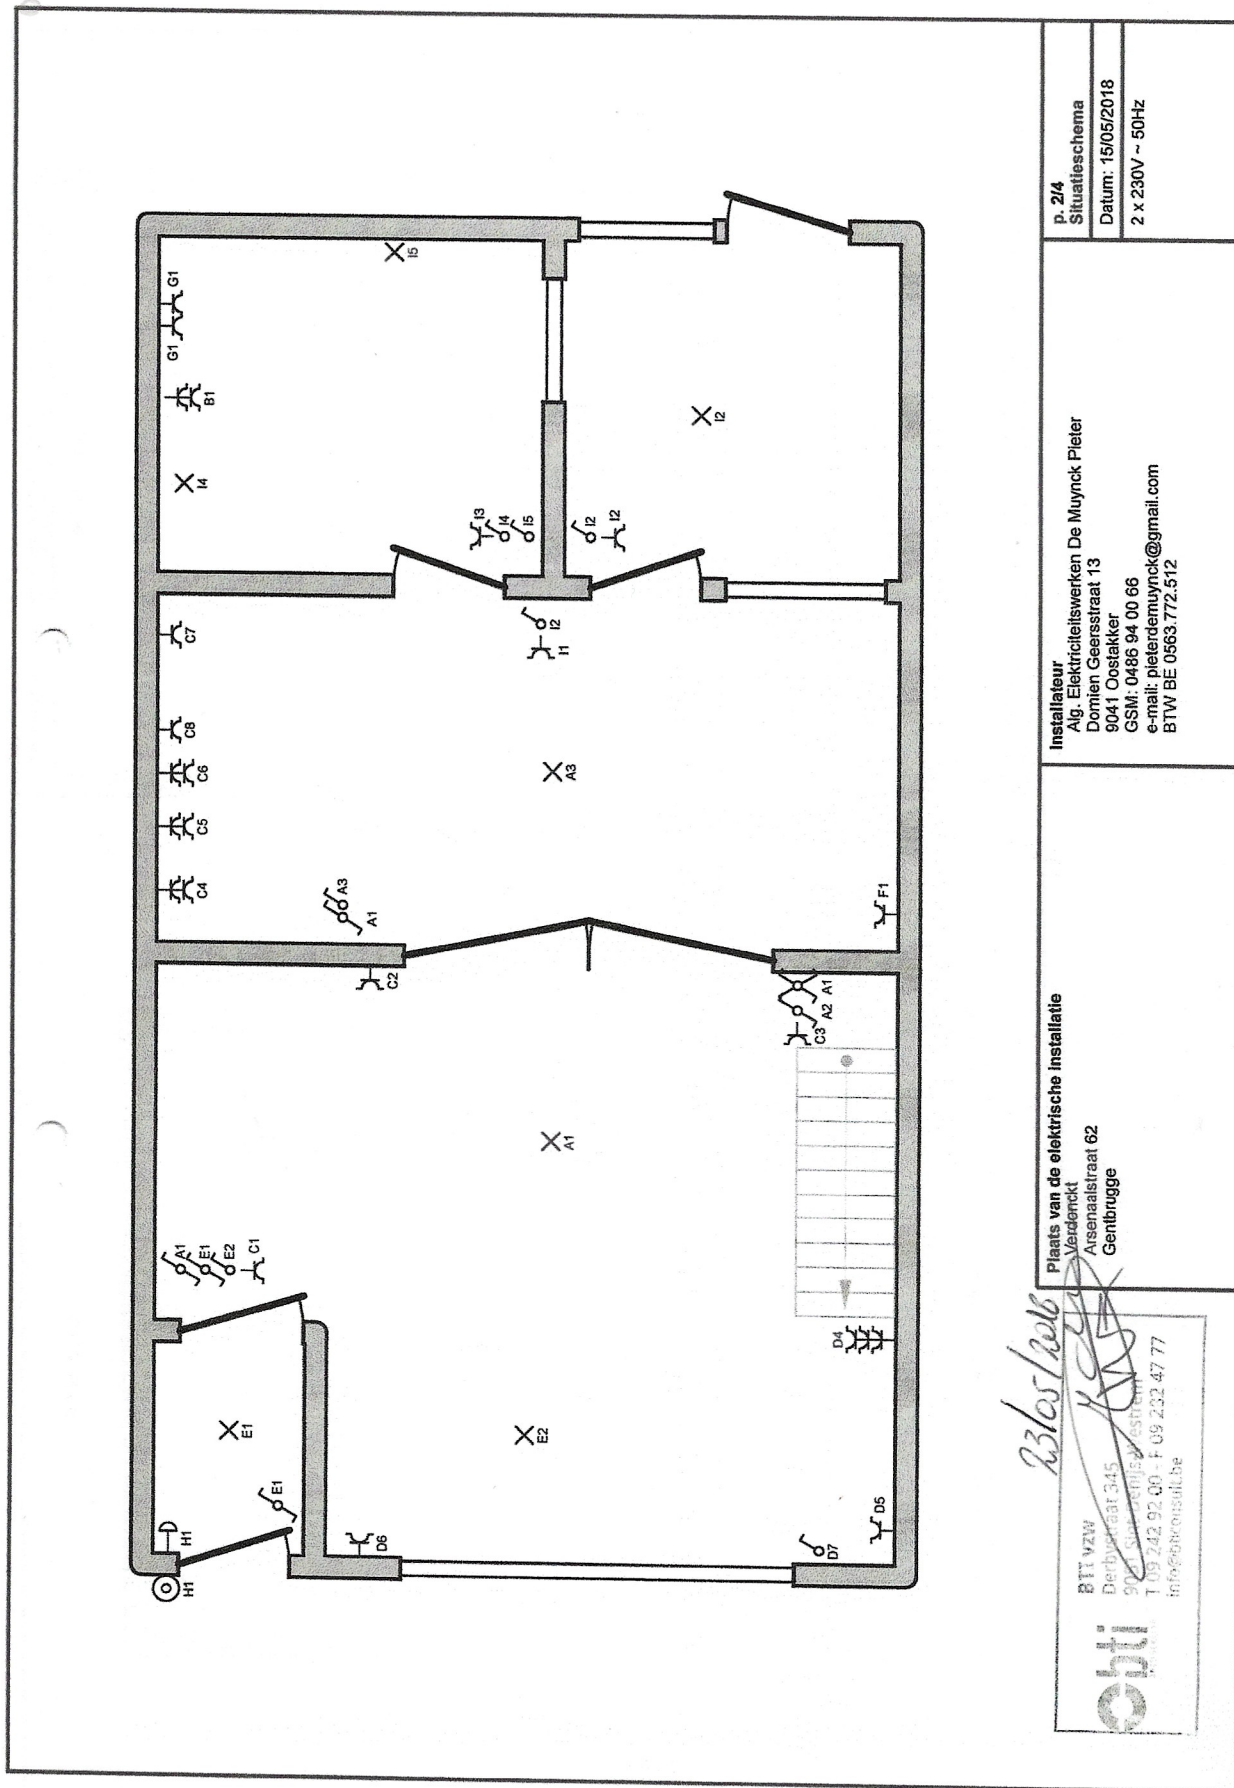


p. 2/4
 Situatieschema
 Datum: 15/05/2018
 2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
 Alg. Elektriciëswerken De Muynck Pieter
 Donnie Geersstraat 13
 9041 Oostakker
 GSM: 0486 94 00 66
 e-mail: pietermuynck@gmail.com
 BTW BE 0563.772.512

Plaats van de elektrische installatie
 Verdenckt
 Arsenaalstraat 62
 Gentbrugge

23/05/2018

BTI vzw
 Derbystraat 345
 9001 Sint-Amandsberg
 T 09 242 92 00 - F 09 232 47 77
 info@bticonsil.be

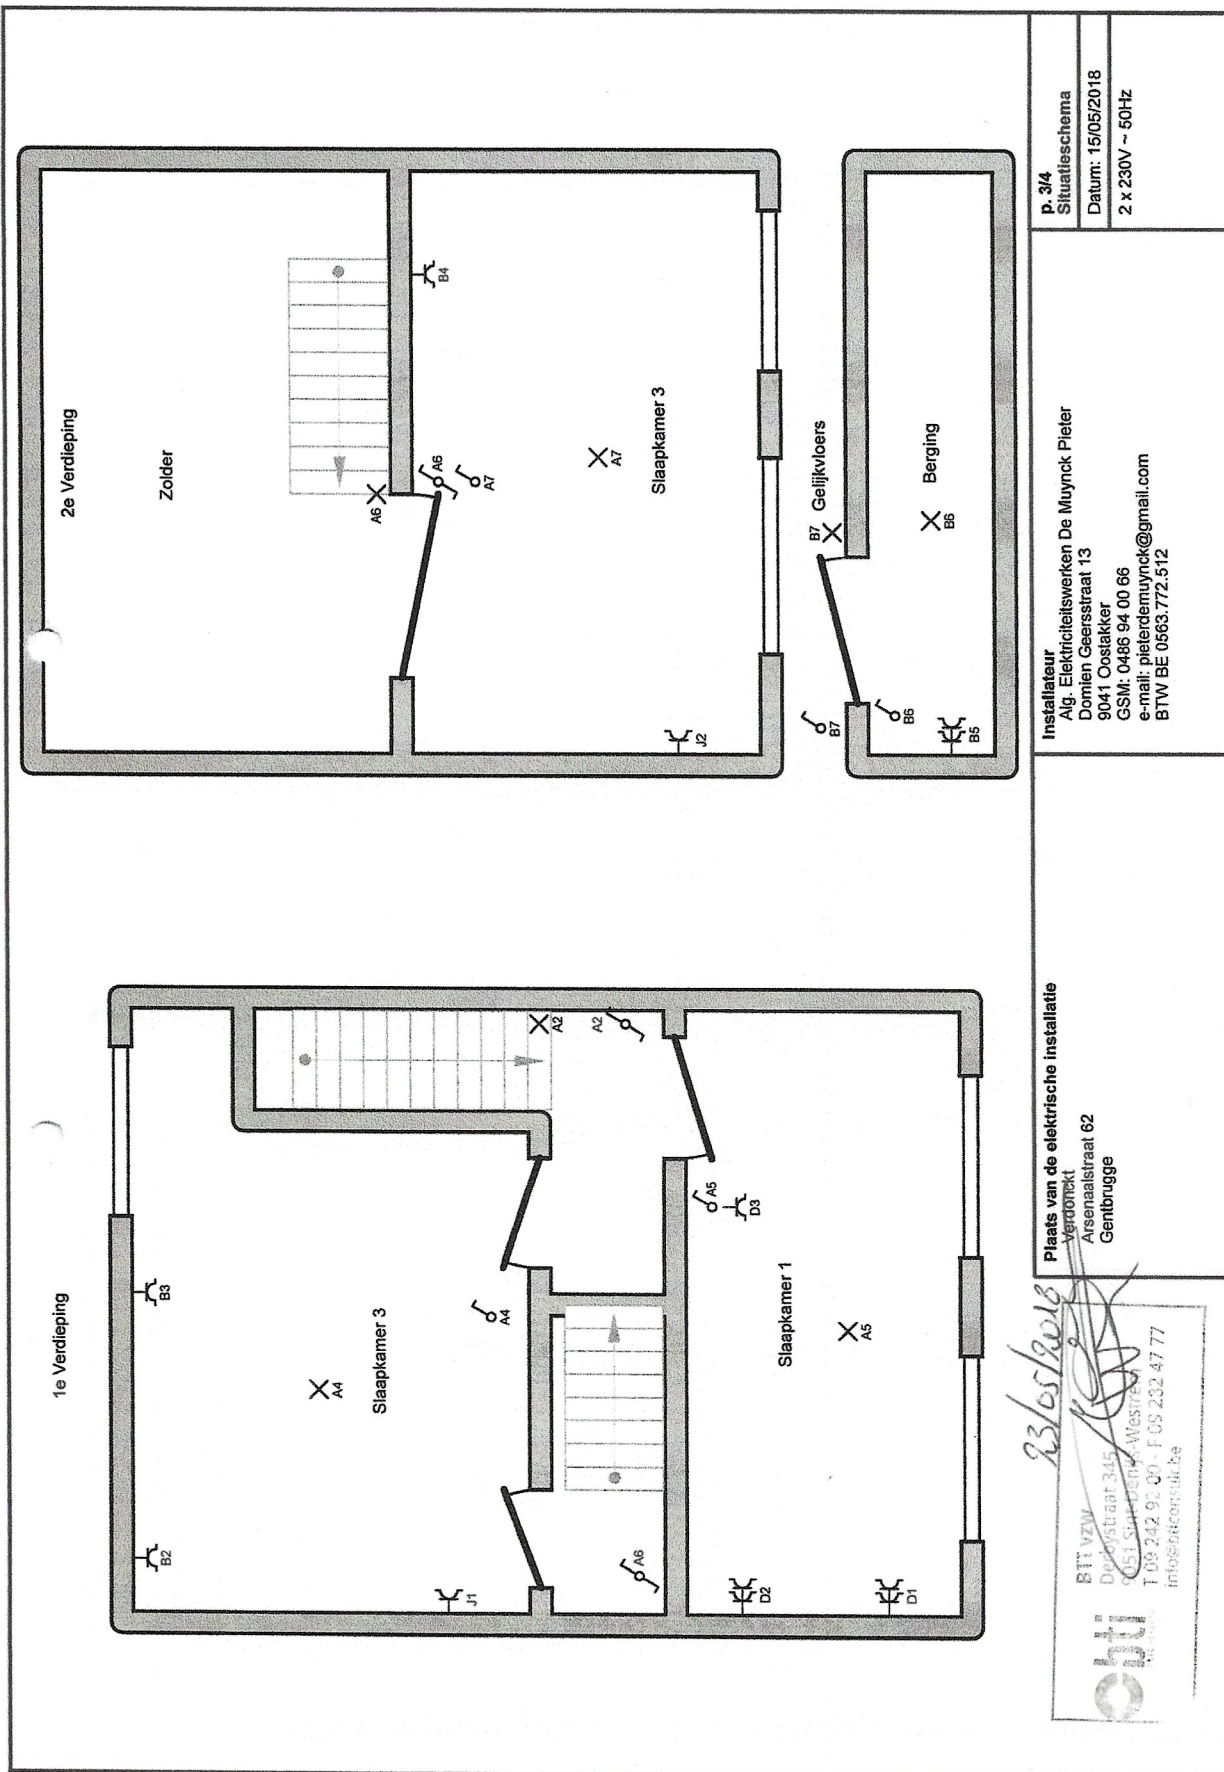

p. 3/4
 Situatieschema
 Datum: 15/05/2018
 2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
 Alg. Elektriciëitswerken De Mynck Pieter
 Dornien Geersstraat 13
 9041 Oostakker
 GSM: 0486 94 00 66
 e-mail: pieterdemynck@gmail.com
 BTW BE 0563.772.512

Plaats van de elektrische installatie
 Verdroombek
 Arsenaalstraat 62
 Gentbrugge

23/05/2018
 BTW VZW
 De Wylstraat 345
 9051 Spaldon, Westerlo
 T 09 242 92 00 - F 03 232 47 77
 info@btwvzw.be

- A** Verlichting: living, traphal, keuken, slaapkamer 1, slaapkamer 2, zolder, slaapkamer 3 + stopcontacten
- B** Stopcontacten, Badkamer meubel, slaapkamer 2, slaapkamer 3/ tuinhuis verlichting + stopcontacten
- C** Stopcontacten: living + keuken
- D** stopcontacten: slaapkamer 1 + stopcontacten living
- E** Living+ inkom
- F** Keuken
- G** Wasmachine
- H** Deurbel
- I** Badkamer+ veranda
- J** Stopcontacten slaapkamer 2 en 3

obti
 B.V.
 DE WEGEN
 DE WEGEN
 9051 Sitt-Denits-Westrem
 T 09 242 92 00 - F 09 232 47 77
 info@obti.be

Blootzorg

Plaats van de elektrische installatie
 Verdonck
 Arsenaalstraat 62
 Gentbrugge

Installateur
 Alg. Elektricienswerken De Muynck Pieter
 Donien Geersstraat 13
 9041 Oostakker
 GSM: 0486 94 00 66
 e-mail: pieterdemuynck@gmail.com
 BTW BE 0563.772.512

p. 4/4
 Lijst Kringen
 Datum: 15/05/2018
 2 x 230V ~ 50Hz
