



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

1. De controle werd uitgevoerd door:

J. VAN HEMELEN keuringsorganisme vzw
Externe Dienst voor Technische Controles
Agent-bezoeker: Joost Ingels

Engelse Wandeling 2F8L
8500 Kortrijk
Tel: 056/357676

Email: info@vanhemelen.org
BTW: BE 0422.507.353

2. Identificatie van derden:

Opdrachtgever: LEYN LUC
Gentsestraat 13 bus 7
8530 Harelbeke
E-mail: luc.leyn@hotmail.com
Tel: 0475/39.00.92
BTW-nr: BE0521319174

Eigenaar: PLANenBOUW
Kamilleweg 5
9940 EVERGEM
Installateur: LEYN LUC
Gentsestraat 13 bus 7
8530 Harelbeke
BE0521319174

3. Identificatie van de elektrische installatie:

Plaats: PLANenBOUW
Kamilleweg 5, 9940 EVERGEM
Type installatie: wooneenheid
Extra gegevens:

EAN code: 541 448 860 021 113 684
Nr. teller: 1SAG1100217802
Nr. nachtteller:
Private HS-cabine: Nee

4. Gegevens van de controle:

De controle:
Datum uitvoering van de installatie:
Opmerkingen:

Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
na 31/05/2020
Ander wettelijk kader: NVT
Afwijkingen:

5. Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 2x230Vac
Type van de aardelektrode: Aardingslus
Aardverbindingssysteem: TT
Voedingsleiding type: XVB
Voedingsleiding diameter (mm²): 10
Aantal borden: 1
Aantal eindstroombanen: 20
Nominale waarde bescherming(A): 40A max
Type van de alg. schakelaar: ALG.DIFF
Algemene differentieelstroominrichting: 2P DIFF 40A 300mA
Bijkomende differentieelstroominrichting: 2P DIFF 40A 30mA



Schema's en plannen van de installatie

Eendraadschema's: OK
Situatieplan(nen): OK
Summiere schets: NVT
Document met uitwendige invloeden: NVT

Document van de veiligheidsinstallaties: NVT
Document van de kritische installaties: NVT
Document van de evacuatiewegen: NVT

Gedecentraliseerde productie-installaties: Nee

Beschrijving van de stroombanen:
3x 2P AUT 16A 1,5mm²
1x 2P AUT 25A 2x 4mm²
12x 2P AUT 20A 2,5mm²
Via bijkomende 2P DIFF 40A 30mA
4x 2P AUT 20A 2,5mm²

6. Resultaten van de controle:

6.1 Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding:	13,56 Ω	Continuïteit van de beschermingsgeleiders(PE geleider):	OK
Waarde van de algemene isolatieweerstand:	1,00 MΩ	Continuïteit van de beschermingsgeleider(hoofd eq):	OK
Test van de differentieelstroominrichting (testknop):	NG	Continuïteit van de beschermingsgeleider(bijkomende eq):	OK
Test van de differentieelstroominrichting (test foutlus):	NG	Test autom. uitschakeling gedec. productie-installatie(s):	NVT

6.2 Inbreuken

Geen inbreuken

6.3 Bemerkingen

- De keuken, de badkamer, het terras en de verlichting zijn nog niet afgewerkt.
opm:



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

7. Besluit van de controle

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 28/05/2046. De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden (of) waren verzegeld.

Agent-bezoeker: Joost Ingels

8. Reglementaire voorschriften:

1. Betreft de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname (6.4.), het controlebezoek (6.5.), het controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.) en het vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.):

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

2. Betreft het controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.):

De verkoper is ertoe gehouden:

- het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen;

De koper is ertoe gehouden:

- zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
- de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.


De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

9. Bijlagen



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

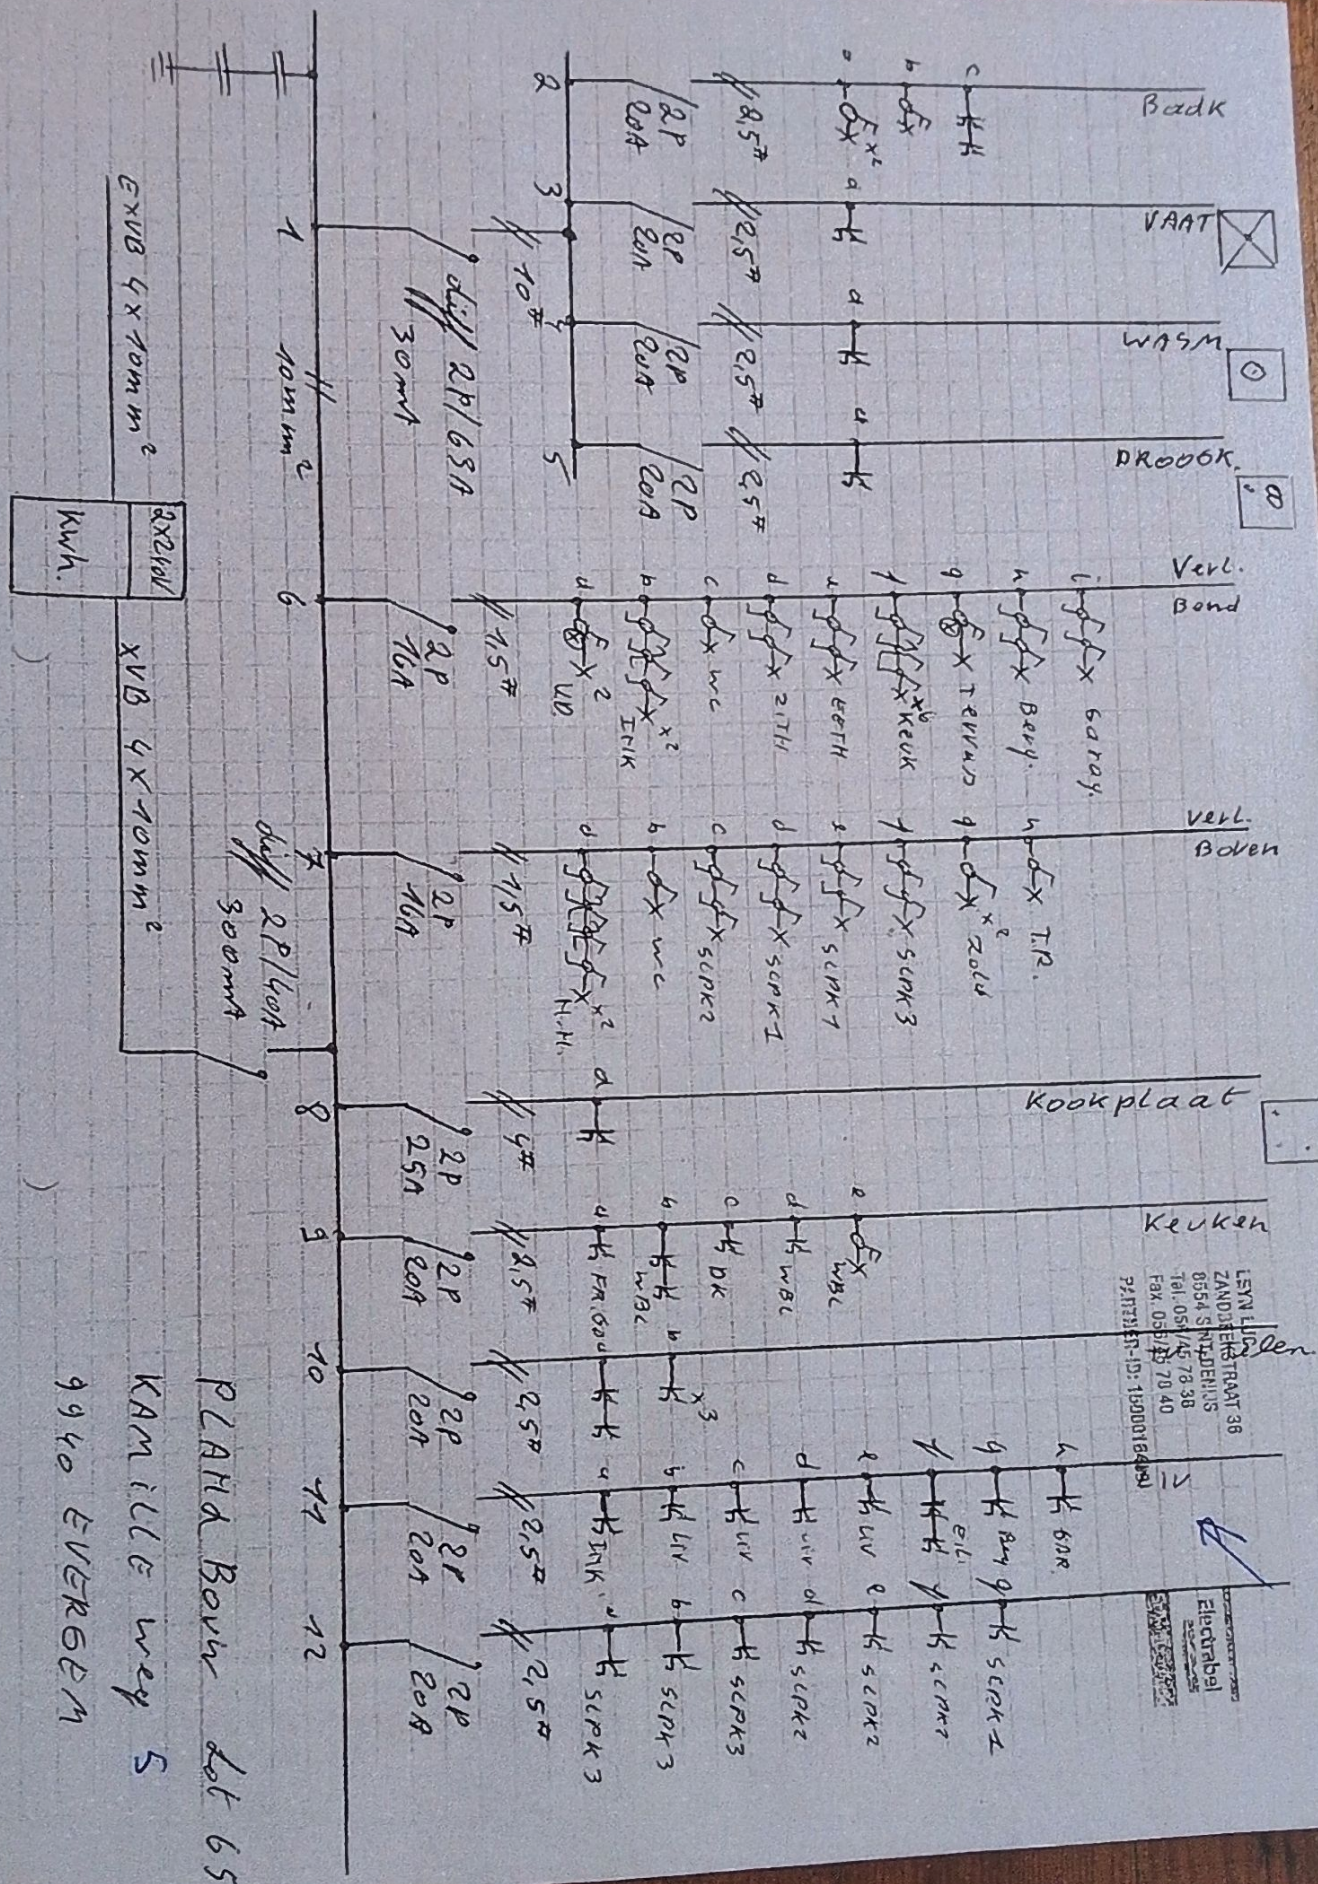



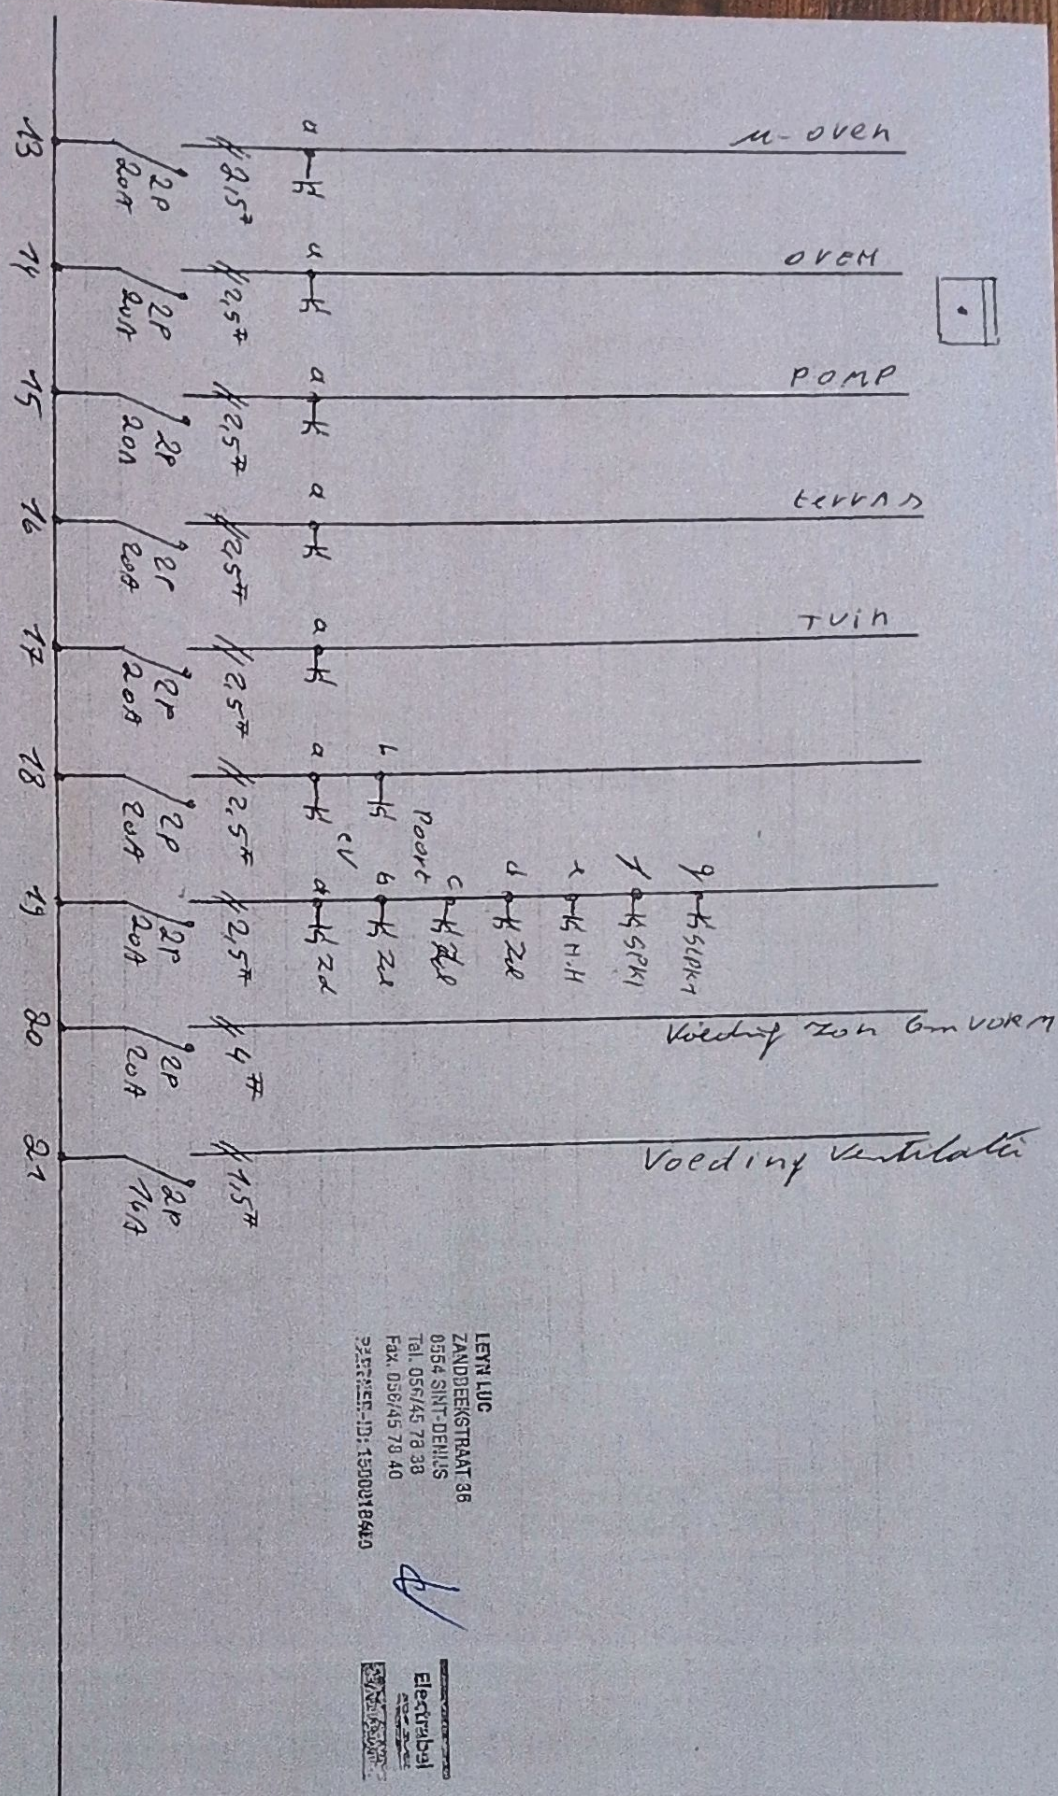


PLATE 1 & BOW Not 65
KAMILLEWEG 5
4940 EVERBREM.




KIJKWONING EVERGEM lot 65 gelijkvloers.

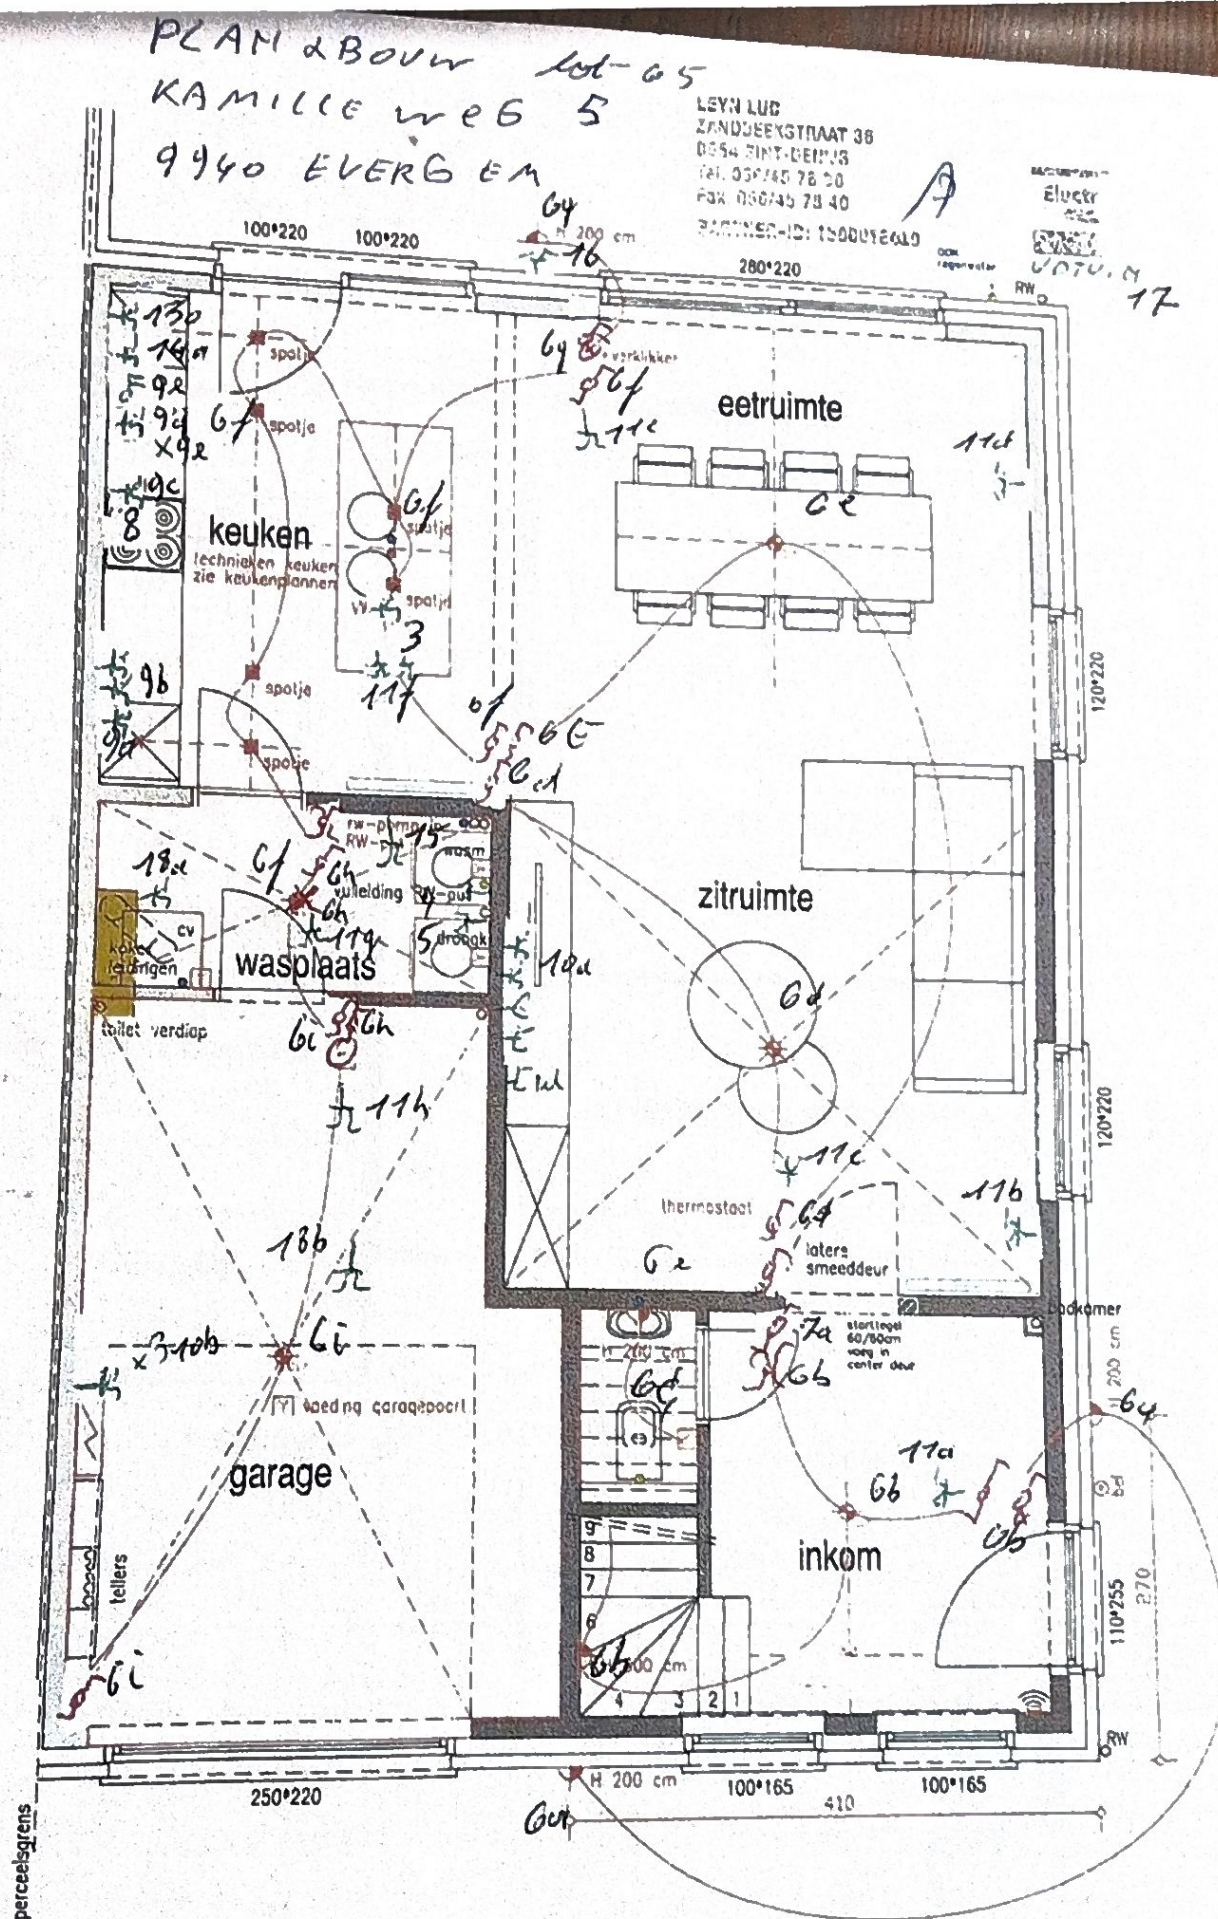

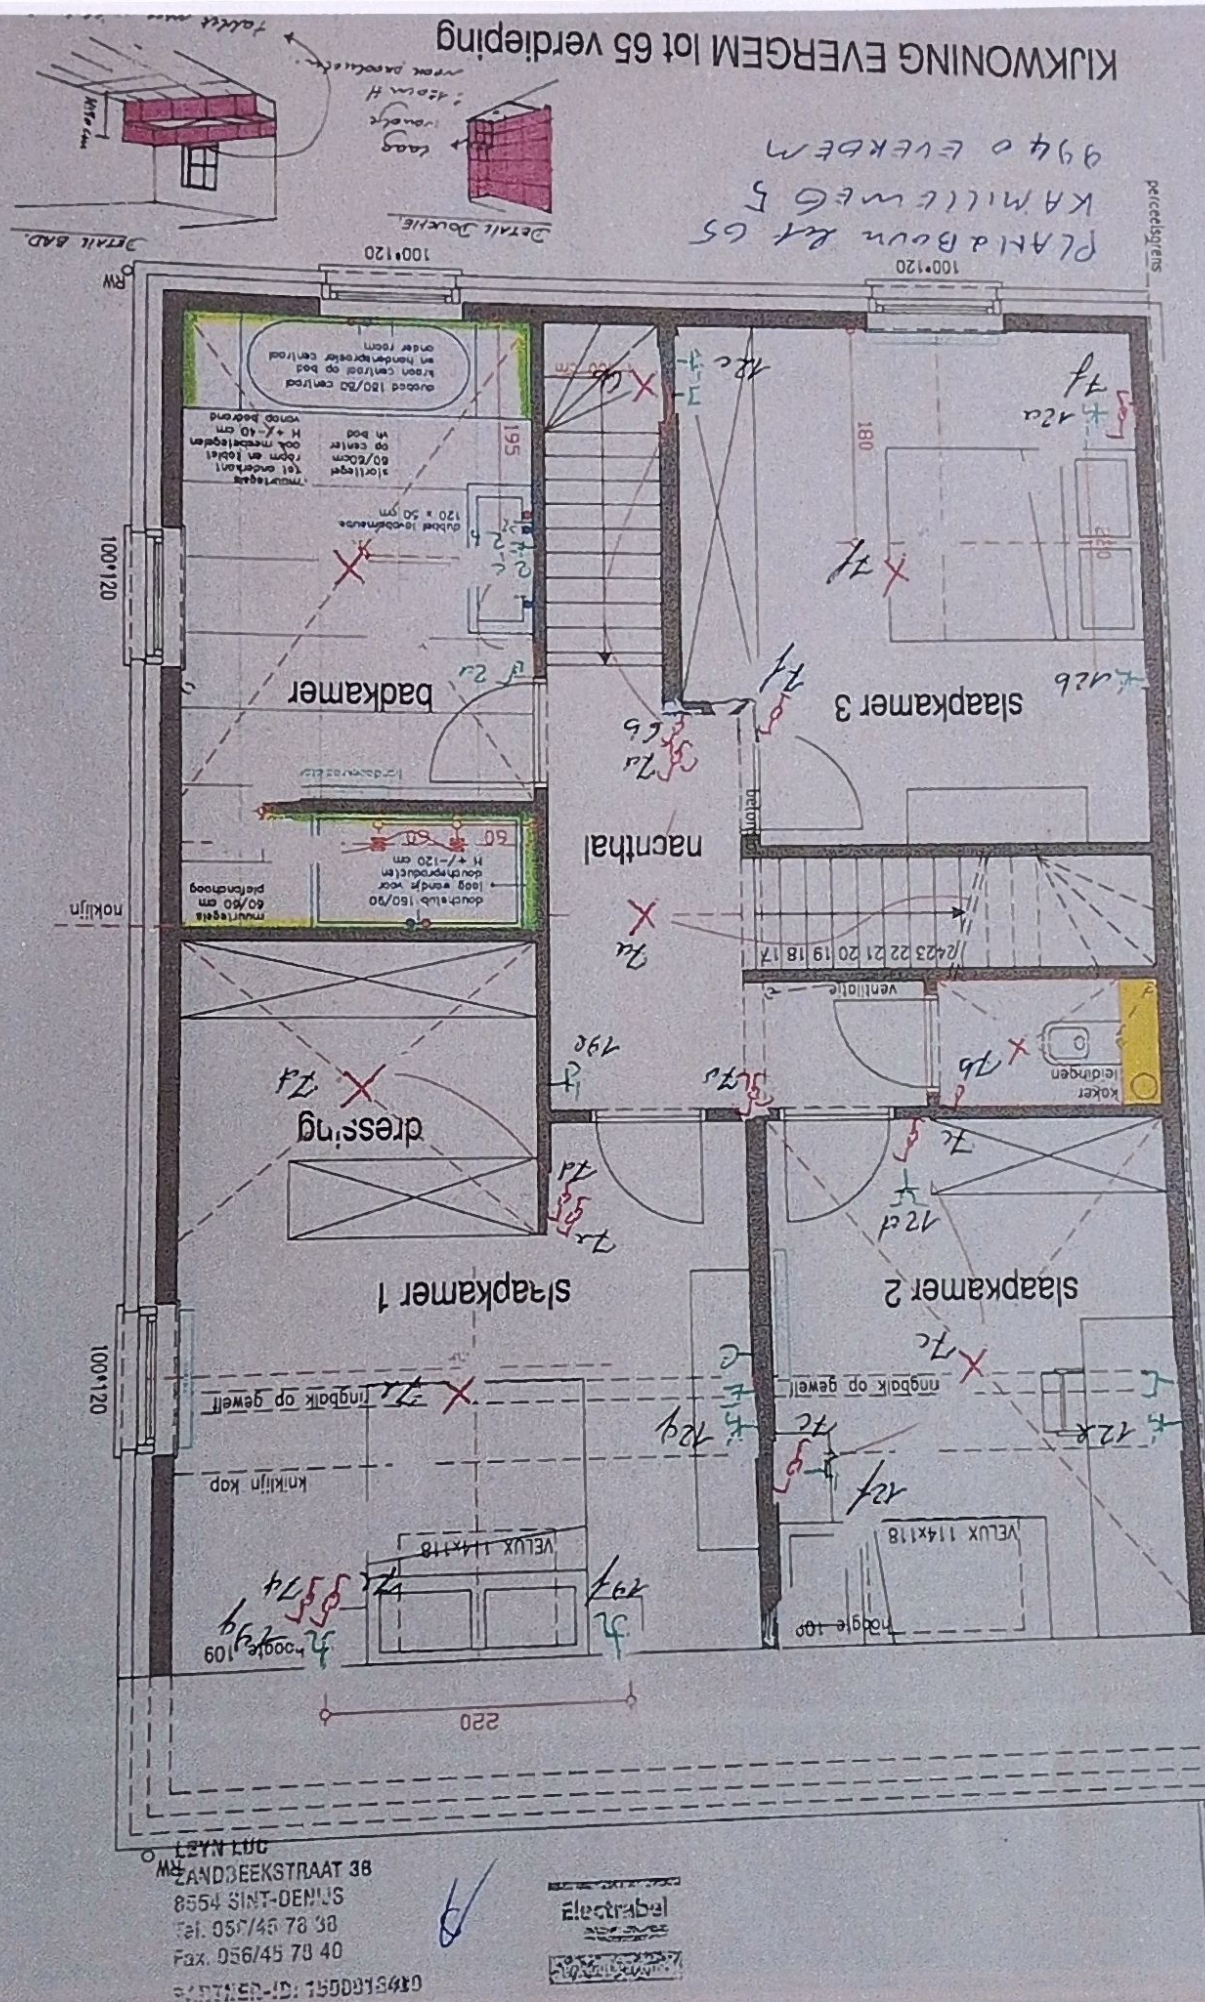

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

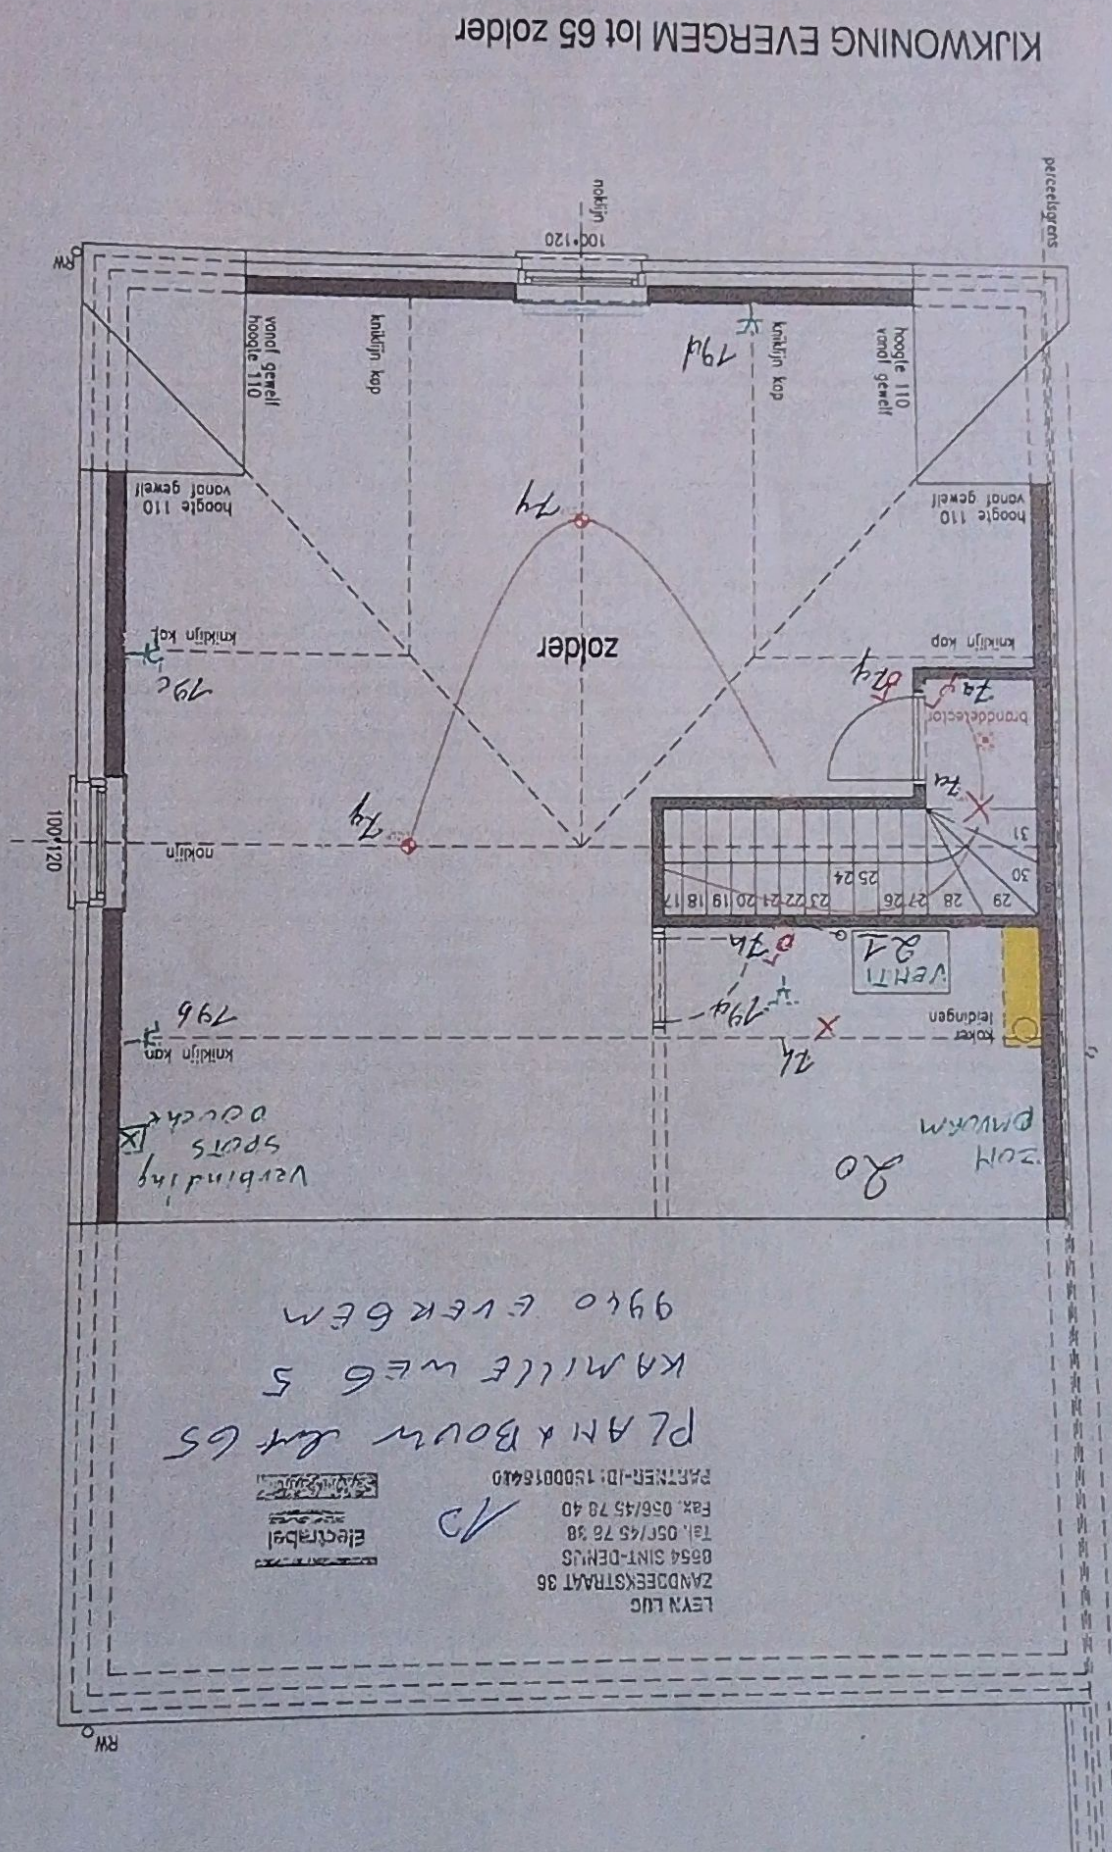

Verslag van onderzoek: controle van een zonnepaneelinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation de panneaux solaires

Verslagnummer: N° de rapport:	154/2021/6/25/1	Datum van bezoek / Date de visite:	25/06/2021
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	SOLAR CONSTRUCTS BVBA Ambachtenlaan 2 - 9080 LOCHRISTI BTW BE 0568.828.685		
Controle volgens Boek 1 - Elektrische installatie op LS en ZLS: Controle selon Livre 1 - Installations électriques à BT et à TBT:	Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname nieuwe installatie (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage nouvelle installation (6.4) Beveilig. tegen de onrechtstreekse aanrakingen / Protect. contre les contacts indirects: Huishoudelijk (4.2.4.3) / Domestique (4.2.4.3) Specifieke en/of regionale reglementen / Réglementation spécifiques ou locales: voorschriften netbeheerder / prescriptions gest. de réseau C10/11		
Betreft: Concerne:	pv-installatie woning		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Karnilleweg 5 - 9940 EVERGEM		
Eigenaar / Propriétaire:	Plan & Bouw		
Installateur:	SOLAR CONSTRUCTS BVBA	BTW/TVA:	BTW BE 0568.828.685
Aanwezigen: Personnes présentes:	Deblock Jouri		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS-PV (ELS4) (Controle van een zonnepaneelinstallatie)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:	OK	NOK POK	NVT PA
Elektrisch dossier: Dossier électrique:	Zie schema's: ter plaatse nagezien / voir schémas vérif. sur place	✓	

Modules:														
CE-attest / CE-attestation:	OK			Klasse / classe:	II									
Aantal / Nombre:	1	st./p.	Type:	sunpower P19-310-BLK	Wp / module:	310	Totaal vermogen / Puissance totale:	310	Wp					
U _N per module: U _N par module:	35,4	V	U _N totaal: U _N total:	35,4	V	I _N per module: I _N par module:	8,76	A	I _N totaal: I _N total:	8,76	A	I _{SC} module:	9,28	A
CE-attest / CE-attestation:	OK			Klasse / classe:	II									
Aantal / Nombre:	1	st./p.	Type:	sunpower P3-325-BLK	Wp / module:	325	Totaal vermogen / Puissance totale:	325	Wp					
U _N per module: U _N par module:	35,9	V	U _N totaal: U _N total:	35,9	V	I _N per module: I _N par module:	9,05	A	I _N totaal: I _N total:	9,05	A	I _{SC} module:	9,69	A

Omvormer(s) / onduleur(s):												
Merk en model: Marque et modèle:	Growatt 750S	P _{ac} max:	0,97	kVA	U _N (DC):	55-450	V	I _N (DC):	10	A	Serienummer omvormer: N° de série onduleur:	DHE3A2800X



Aansluiting in verdeelbord / connection au tableau distribution:													
Beveiliging: Protection:	automaat	I _N :	20	A	I _{cc} :	3000	A	Curve: Courbe:	C	U _N :	400	V	
Klasse groene teller: Classe compteur vert:		Serienummer groene teller: N° de série compteur vert:	-						Stand groene stroom teller: Index du compteur vert:	-			kWh
ID/DSI: DA/DD:	40A.0.3	Voedingspunt: Point d'alimentation:	Bord										

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:		OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles/contrôles visuels:		✓		
PE continuïteit en equipotentiaaliteit/continuité PE et liaisons équipotentiellees:		✓		
1.4.1.1 + 1.4.1.2 + 5.1.1	Attest van het systeem is aanvaardbaar (modules + omvormer) / L'attestation du système est acceptable (modules + convertisseur)	✓		
1.4.1.3	$U_{\text{omvormer}} > U_{\text{modules totaal}} / U_{\text{convertisseur}} > U_{\text{modules totaux}}$	✓		
	$I_{\text{omvormer}} > I_{\text{modules totaal}} / I_{\text{convertisseur}} > I_{\text{modules totaux}}$	✓		
	Aansluitingen? / Raccordements?	✓		
4.2.2.1	Directe aanraking? / Contact direct?	✓		
4.4.1	Voldoet de overstroombeveiliging? / La protection contre la surintensité est elle efficace?	✓		
7.112.2	Indien klasse I – geaard? / Si classe I – mise à la terre?			✓
5.3.3.1 + 7.112.3	Veilige ontkoppeling is mogelijk? / Sectionnement sûr est-il possible?	✓		
3.1.2.1	Schema's aanwezig? / Schémas présents?	✓		
1.4.2 + 9.1.2	Fabrikanteninstructies gevolgd? / Instructions du fabricant, sont-elles suivies?	✓		
6.4.5.1 + 5.4.2.1	Meetresultaten in orde? / Résultats des mesures en ordre? Isol. U ≤ 250 V max.	✓		
5.2.7.2 + 5.2.7.3	Verbinding DC/AC omzetter? / Connexion onduleur DC/AC?	✓		
7.112.2	Pictogrammen / Pictogrammes?	✓		
Spreidingsweerstand van de aardverbinding / Résistance de dispersion de la prise de terre: $R_A = 4,4 \quad \Omega$		✓		
hulpelektroden / sondes de référence				
Isolatiweerstand / Résistance d'isolement: $R_{\text{iso}} = 22 \quad M\Omega$		✓		

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

ean-541448860021113684

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Netbewakingparameters niet kunnen verifiëren / Paramètres de surveillance du réseau ne peuvent pas vérifier

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 25/06/2046

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of) waren" verzegeld. /

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 25/06/2046

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

GOEDHUYTS Johan

Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

- Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
- De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
- De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
- Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
- Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
- De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.


Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

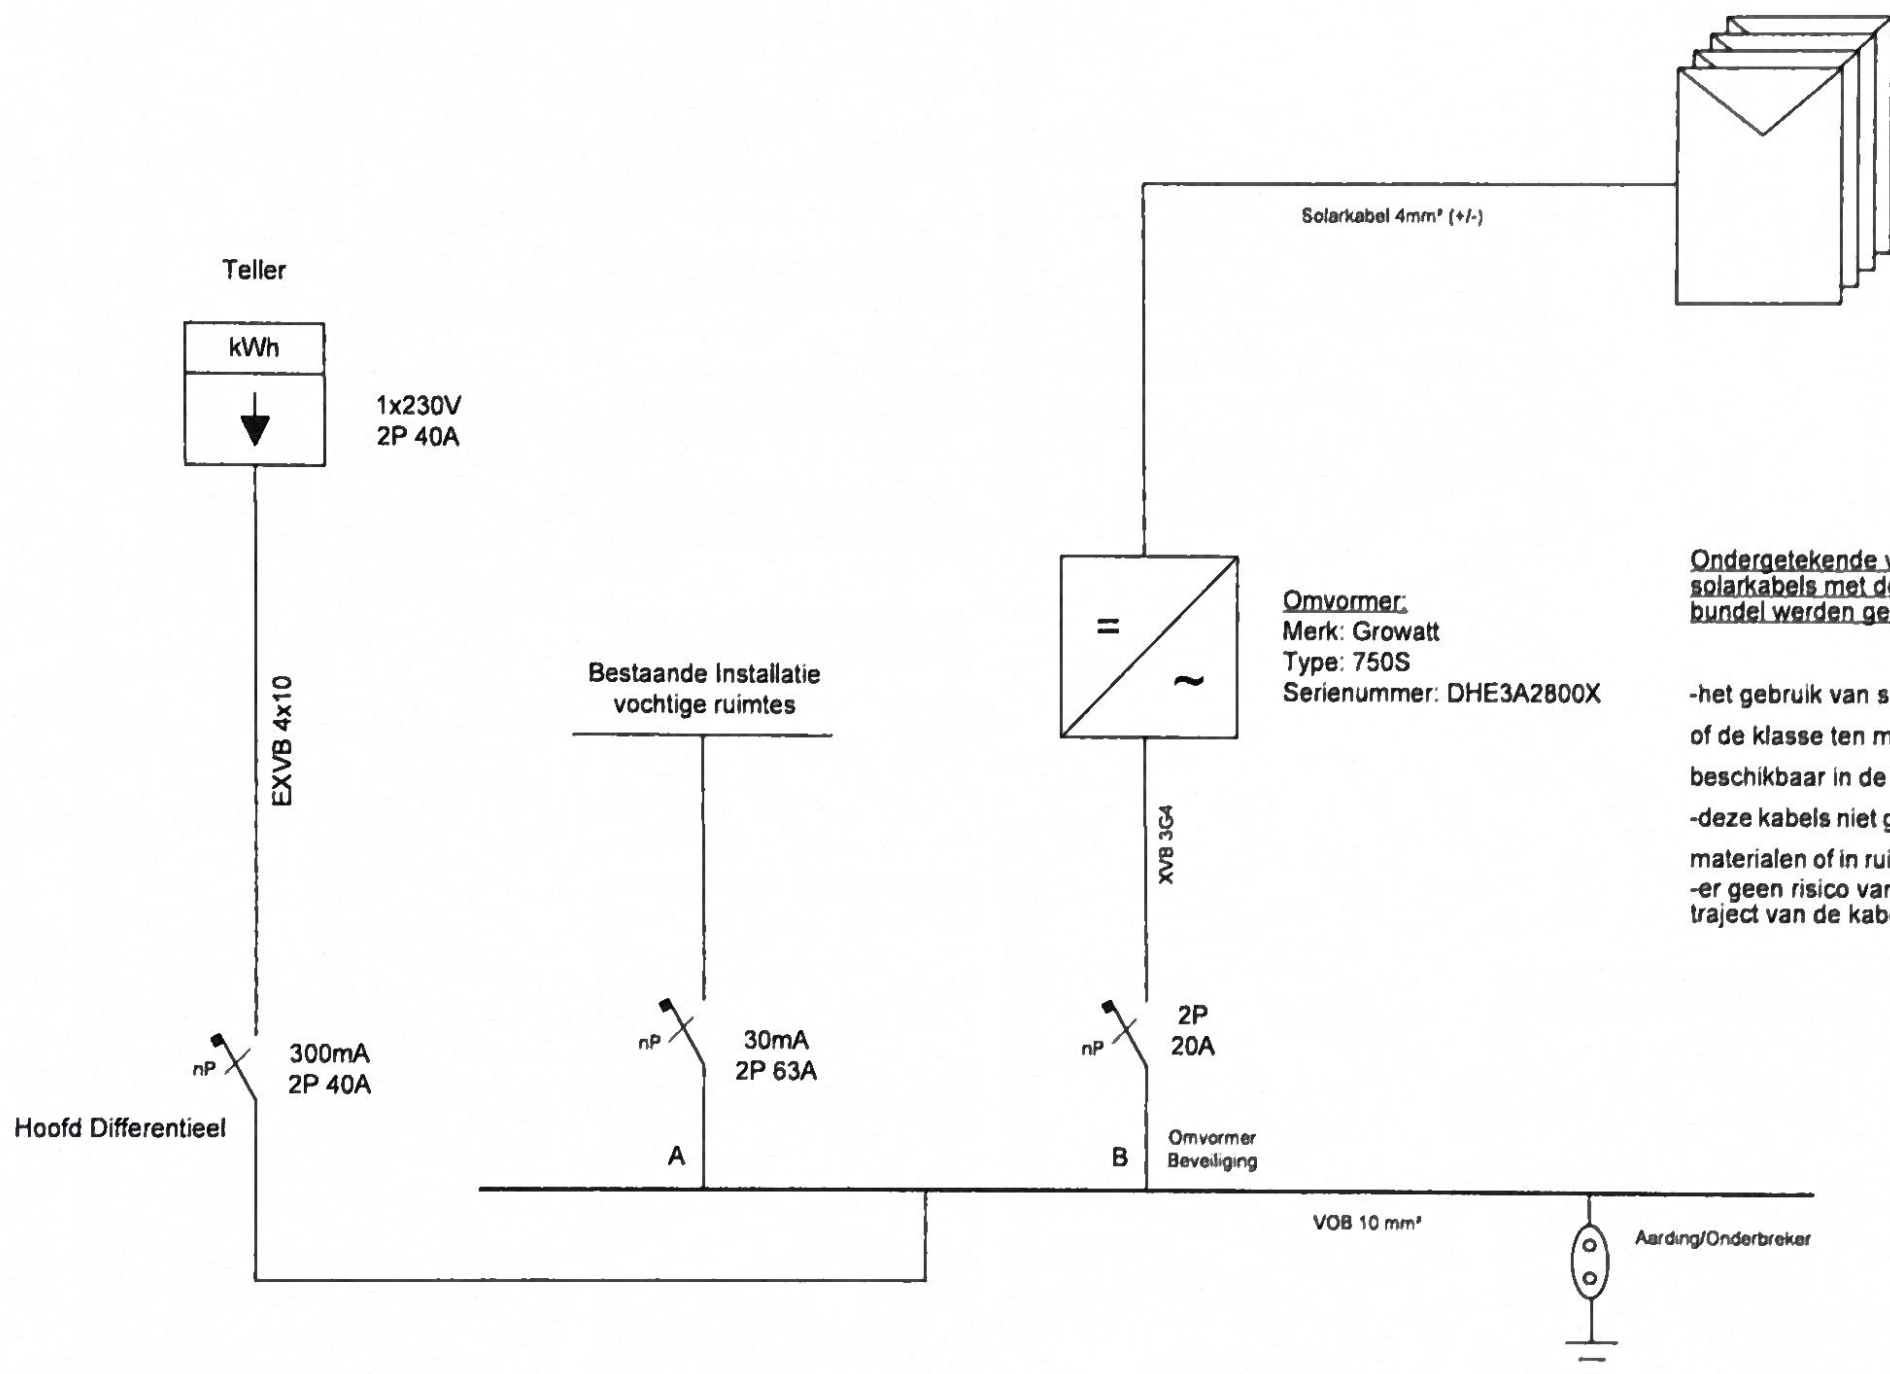

Merk: SunPower P19/310 & P3/325
Aantal Panelen: 2
Aantal Strings: 1
Vermogen per paneel: 310 & 325WP
Totaal vermogen: 635 Wp
Kanaal A: 2

Ondergetekende verklaart dat, op het betrokken installatie-adres, solarkabels met de karakteristieken F1, Eca of Dca in laag of in bundel werden geplaatst, en waarbij:

- het gebruik van solarkabels met het kenmerk ten minste F2 of de klasse ten minste Cca onmogelijk is, wegens niet beschikbaar in de handel;
- deze kabels niet geplaatst werden langs brandbare materialen of in ruimten met een verhoogd brandgevaar;
- er geen risico van mechanische beschadiging langs het traject van de kabels bestaat.

KEURINGSORGANISME

INSTALLATEUR

Solar Constructs bvba
Ambachtenlaan 2
9080 Lochristi
BE 0568.828.685

SOLARconstructs.be
voor uw groene energie

Gegevens Eigenaar


Plan & Bouw
Kamilleweg 5
9940 Evergem

Leading - edge Technology


- ▶ Maximum efficiency of 97.6% and wide input voltage range
- ▶ Internal DC switch
- ▶ Transformerless GT topology
- ▶ Compact design
- ▶ Ethernet / RF technology / Wi-Fi
- ▶ Sound control
- ▶ Easy installation
- ▶ Comprehensive Growatt warranty program



Growatt 1500-S efficiency

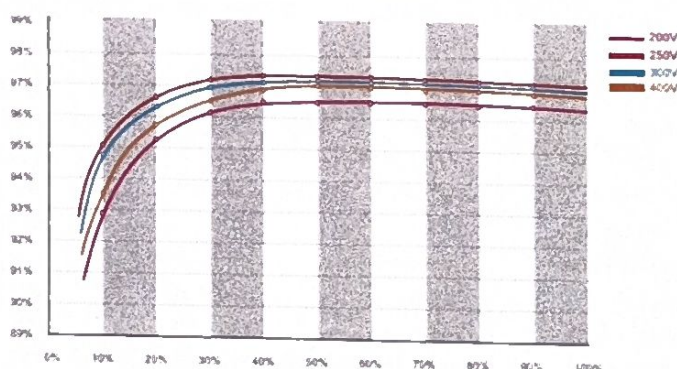

Growatt 750-3000 -S topology

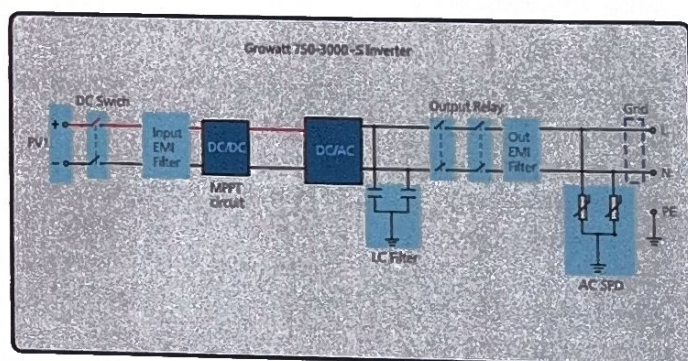

GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY Co.,LTD

A: No.28 Guangming Road, Longteng Community, Shiyao, Baoan District, Shenzhen, P.R.China.
 T: +86 755 2747 1900 E: +86 755 2749 1460 E: info@ginverter.com

Renzy de Lannoy

Renzy de Lannoy
(handtekening klant)

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

A: 'est uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lni.be en www.verlueverwarmen.be.

onderhoud (keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest:)

ndige)

BVBA
ENWEG 19 A
ANZEGEM

Technicus
voornaam en achternaam: Kenzy De Cabooter

erkeningsnummer: GV 05502 / TV

ENET.BE
1.611

Datum onderhoud: 24.06.2013
Arbeidsduur: van tot

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Kenzy De Cabooter
Enweg 19 A
3400 Edegem.

(bids aan wat van toepassing is)

- ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749
- ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
- ☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
- ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

MOMASTER 25/30 -A (E-BE)



1400100160781610006465N1

Brander (enkel CV)

merk:

type:

bouwjaar:

fabricatienummer:

debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting ** ☐ Laaglast ☐ Hooglast	OK	Niet OK
°C	1,2		50°		
	1		/		
	1		/		
graden	1		/		
bar	1		/		
gasdruk teller	2		23,3		
gasdruk gasblok	2		19		
branderbred	2		/		
rookindex	1		/	☐	☐
zuurstof (O₂)	1,2		3,6	☐	☐
koolstofdioxide (CO₂)	1,2		9,86	☐	☐
koolstofdioxide (CO)	1,2		10,4	☒	☐
rookgastemperatuur (t₁)	1,2		48,5		
temperatuur verbrandingslucht (t₂)	1,2		19,1		
nettotemperatuur (t₃ - t₄)	1,2		29,4	☐	☐
rookgasrendement (bovenwaarde; Hₛ)	1,2		98,6		
rookgasrendement (onderwaarde; Hᵢ)	1,2		103,2	☒	☐
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling	1	☐ OK	☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)	1,2	☐ OK	☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook	3	☐ OK	☐ Niet OK		
Veilige staat van werking					
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK		
verluchting en ventilatie stooklokaal	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK		
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)	1, 2	☒ OK	☐ Niet OK		
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)	2	☒ OK	☐ Niet OK		

* Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt

(bids aan wat van toepassing is)

☒ goed ☒ veilig

☐ niet goed ☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 24.06.2013

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Andere opmerkingen:

Kenzy De Cabooter

voor kennisname

Klont niet aanwezig.

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

(handtekening klant)

A. test uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de warmte van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lni.be en www.vrijverwarmen.be.
