

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

1 Dit verslag vervangt verslag 118-161209-07. Het vorige verslag dient vernietigd te worden.

Besluit

De installatie is conform.

De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.

De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 9/12/2041 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0118 TIM TEVELS

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

- Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)
- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroming en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.




STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 9/12/2041.

STAP 4

BTV Oost-Vlaanderen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Schema's

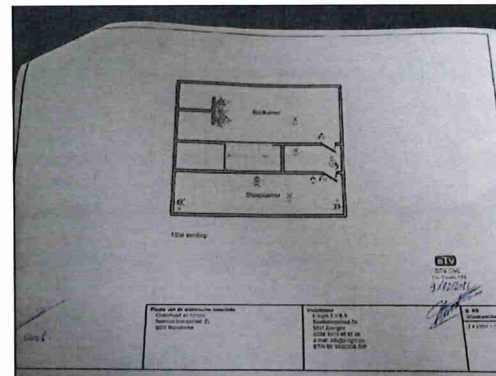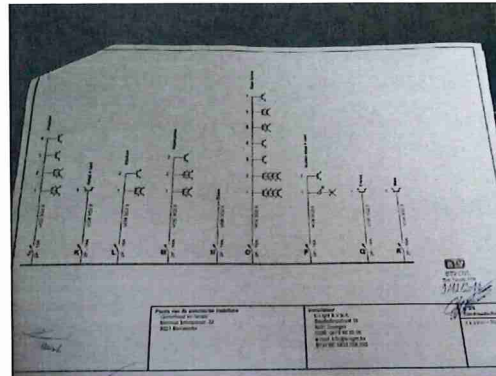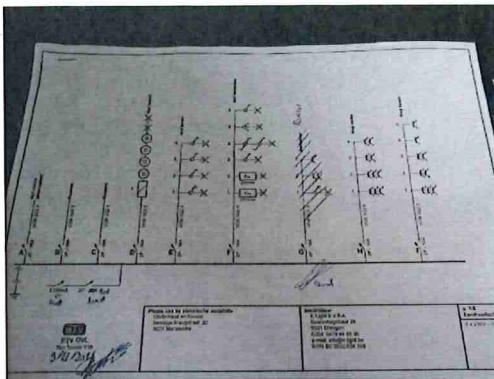

Nota voor het leggen van leidingen

Klant :	Desaca	Uitvoering door klant
----------------	---------------	------------------------------

N°	Elektrische aansluiting	Bedrading	Stopkontakt
1a	Schakelaar bediening verlichting b1	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
1b	Verlichting (afzonderlijke 1a te voorzien)	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
2	Stopcontacten boven aanrecht	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
3	Dampkap	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
4	Koelkast	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
5	Elektrische oven + kookplaat * 3 fazen 220V of 380V + N * enkelfazig 220V	4 x 4mm ² + 4mm ² 2 x 6mm ² + 6mm ²	Via inbouw neusdoos
6	Elektrische kookplaat * 3 fazen 220V of 380V + N * enkelfazig 220V	4 x 4mm ² + 4mm ² 2 x 6mm ² + 6mm ²	Via neusdoos
7	Vonkontsteking voor gaskookplaat	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
8	Vaatwasmachine (afzonderlijke kring)	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	Inbouw
9	Boiler (afzonderlijke kring)	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
10	Oven (zonder kookplaat) (afzonderlijke kring)	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
11	Powerport	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
12	Wasmachine (afzonderlijke kring)	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
13	Droogkast (afzonderlijke kring)	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
14	Bordenwarmer	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
15	Friteuse (afzonderlijke kring)	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
16	Microgolf (afzonderlijke kring)	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
17	Combi oven (afzonderlijke kring)	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
18	Wokbrander	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
19	Grill	2 x 2,5 mm ² + 2,5mm ²	inbouw
20	Stoomoven * 3 fazen 220V of 380V + N * enkelfazig 220V	4 x 4mm ² + 4mm ² 2 x 6mm ² + 6mm ²	Via inbouw neusdoos

!!! Alles dient uitgevoerd te worden volgens de op dit ogenblik geldende reglementering van het A.R.E.I. !!!

AF	Afvoer spoeltafel diam. 40mm	
AFST	Afvoer stoomoven diam. 40mm (hittebestendig tot 80°)	
K	Koud water toevoer 1/2"	OPGELET : voorzien van dubbeldienstkraan voor vaatwasser
W	Warm water toevoer 1/2"	Voorzien van enkele dienstkraan
GA	Gasaansluiting 1/2" + afsluitkraan	OPGELET : voorzien van gekeurde gasslang

AFDA	Opening voorzien volgens maatvoering plan	Flexibel voorzien aub
-------------	--	-----------------------

Plaatsing van vloertegels


Vloertegels worden geplaatst voor plaatsing keuken / gelieve door te vloeren onder de kasten

!!! DEZE GEGEVENS DIENEN STRIKT NAGEVOLGD TE WORDEN !!!

Opmerkingen

Onder voorbehoud van opmeting door onze diensten


Belangrijk : er mogen geen leidingen op de muur of op de vloer geplaatst worden ter hoogte van de vaatwasser !

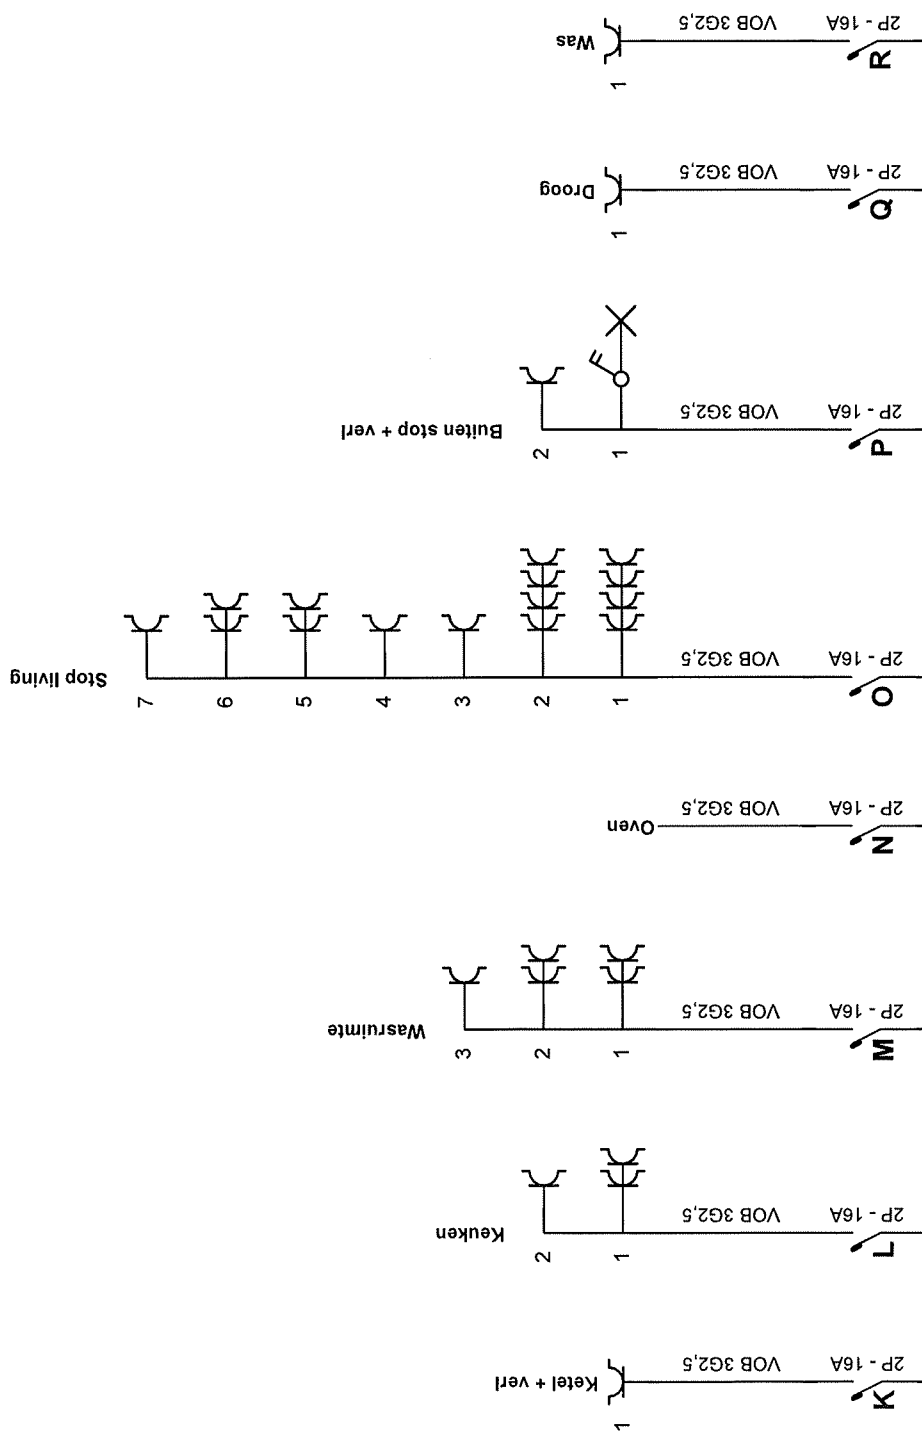

Plaats van de elektrische installatie
Onderhoud en herstel
henricus braccstraat 32
9031 Mariakerke

Installateur
E-Light B.V.B.A.
Baarledorpstraat 59
9031 Drongen
GSM: 0479 48 85 06
e-mail: info@e-light.be
BTW BE 0832.638.595


p. 2/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

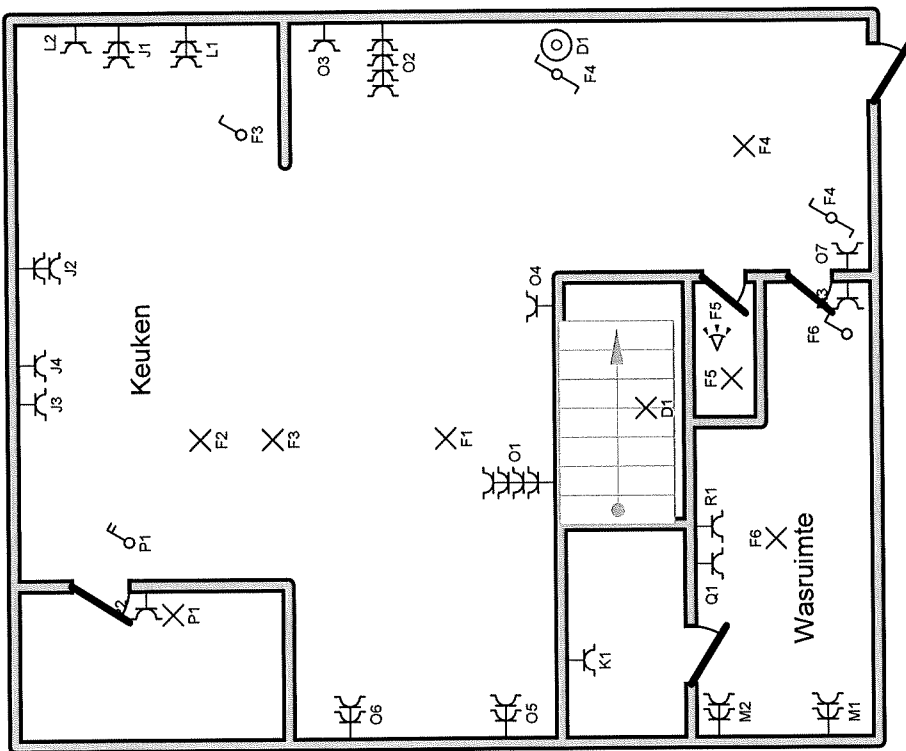

Gelijkvloers

Plaats van de elektrische installatie
 Onderhoud en herstel
 henricus bracqustraat 32
 9031 Mariakerke

Installateur
 E-Light B.V./B.A.
 Baarledorpstraat 59
 9031 Drongen
 GSM: 0479 48 85 06
 e-mail: info@e-light.be
 BTW BE 0832.638.595

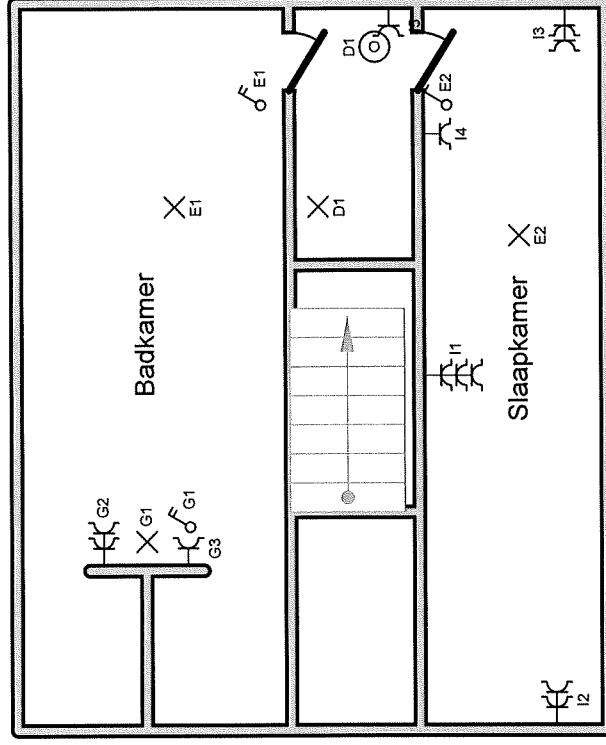


1Ste verdiep

Plaats van de elektrische installatie
 Onderhoud en herstel
 Henricus Bracqstraat 32
 9031 Mariakerke

Installateur
 E-Light B.V.B.A.
 Baarledorpstraat 59
 9031 Drongen
 GSM: 0479 48 85 06
 e-mail: info@e-light.be
 BTW BE 0832.638.595

p. 4/6
Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

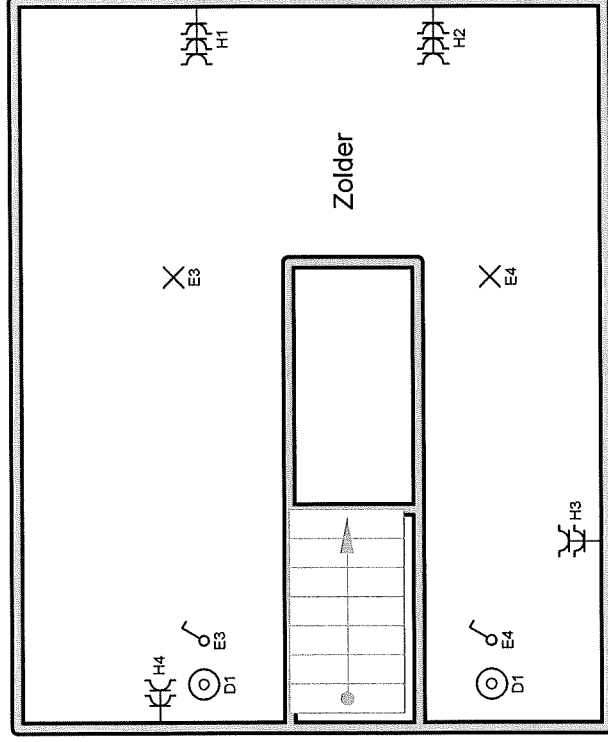

Zolder

Plaats van de elektrische installatie
Onderhoud en herstel
henricus bracqustraat 32
9031 Mariakerke

Installateur
E-Light B.V.B.A.
Baarledorpstraat 59
9031 Drongen
GSM: 0479 48 85 06
e-mail: info@e-light.be
BTW BE 0832.638.595
