



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 26/09/2022 Inspecteur: Antoni Cassiman Mentor: Installateur: RUDI VAN MOL
ID-label: B.T.W. nr.: Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serienummer: 19370727

Datum verslag: 27/09/2022

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Sint-Martinusstraat
Huisnummer 11
Busnummer
Postcode 1880
Gemeente Kapelle-op-den-Bos
Land België

Eigenaar

Naam RUDI VAN MOL
Straatnaam ST MARTINUSSTRAAT
Huisnummer 11
Busnummer
Postcode 1880
Gemeente Ramsdonk
Land België

Installateur


Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

EAN : 54
☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: : 1SAG1100342306

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

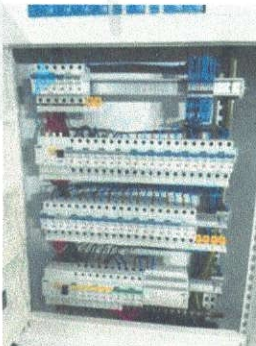

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.
Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 27

Ri algemeen: 81,7 MΩ

OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 15,95 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A		NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	6		2	1,5
5	C	16		2	1,5
2	C	16		2	2,5
16	C	20		2	2,5
2	C	25		3	4

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang. Administratieve aanpassing 13/10/2022: Wijziging dienstspanning en maximale aansluiting (3x230V + 40A).

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 26/9/2047
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Antoni Cassiman
De werknemer,
Antoni Cassiman
ACEG VZW - #118

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.


- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Eik ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaanisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be +32 2 880 88 90 BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481



Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 26/9/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

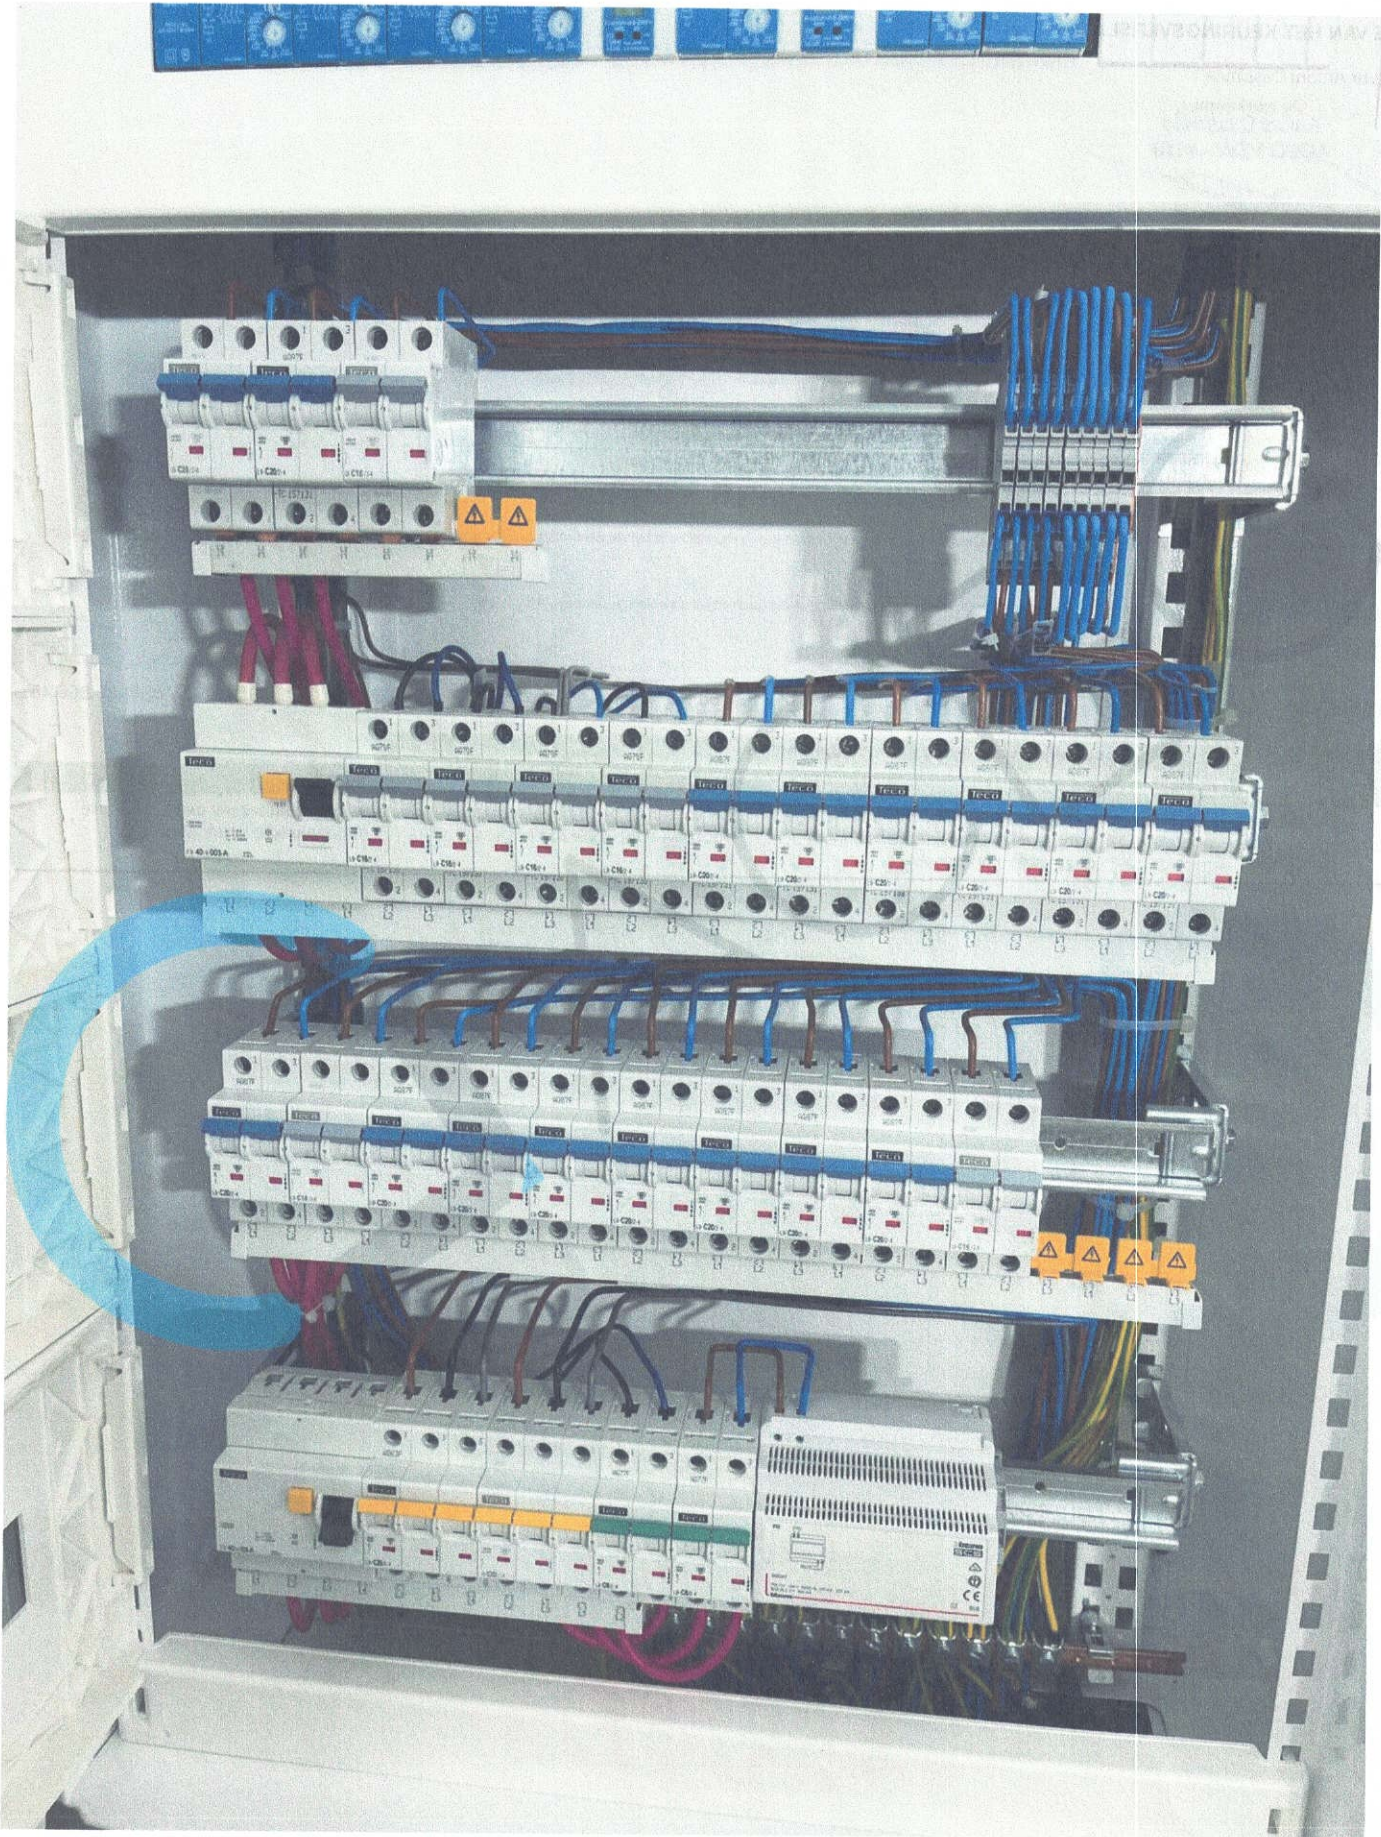


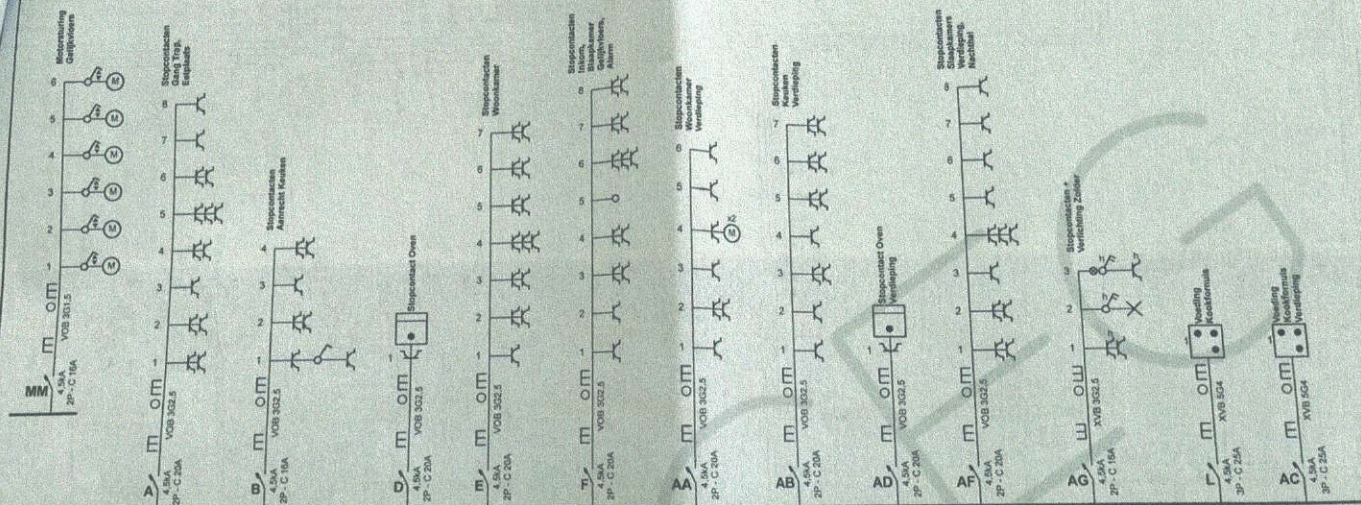

Handwritten signature and date:
26/5/2022

Plaats van de elektrische installatie	Installateur: EASYKIT-Simme Zelfbouw Aarschotsesteenweg 33 3110 Rotselaar BTW BE 0453.767.582	p. 2/3 Eendraadschaar 3 x 230V - 50Hz
---------------------------------------	---	---

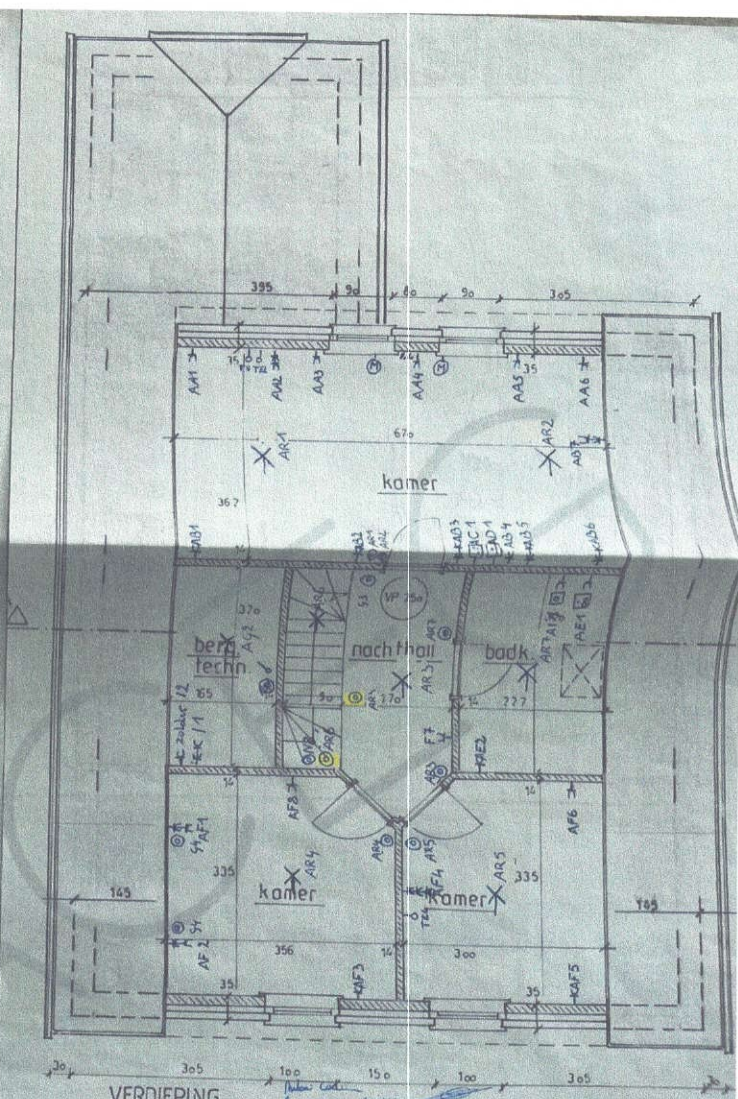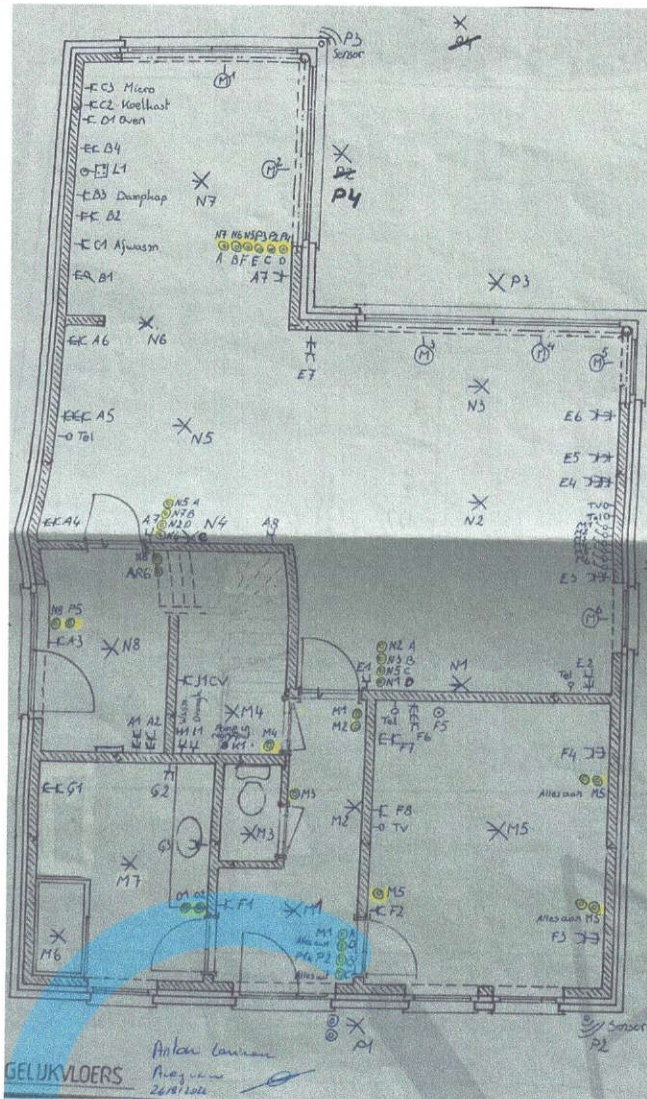



p. 1/3
Eendra
3 x 230

