

**VINÇOTTE CERTIGO vzw**

Erkend Controleorganisme
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW: BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: SEN/19/12/17/1787

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gemboux@vincotte.be



CN **051540**

Resi code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie:

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam <u>Eigenaar</u>	Naam, voornaam : <u>Neyten Willem</u>	Eigenaar of beheerder : <u> </u>
Ident. Kaart nr. : <u> </u>	Adres : <u>Stationsstraat 38</u>	<u> </u>
BTW nr.: BE <u> </u>	Post nr. + Stad : <u>2090 Melle</u>	<u> </u>
	Tel. : <u> </u>	<u> </u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270 <input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname <input type="checkbox"/> wijziging <input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86 <input type="checkbox"/> Art 271 bis <input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> mobiel <input type="checkbox"/> tijdelijk	<input type="checkbox"/> Art 87 <input type="checkbox"/> Art 278
<input type="checkbox"/> Art 271 <input type="checkbox"/> periodiek <input type="checkbox"/> controle <input type="checkbox"/> <u> </u>	<input type="checkbox"/> Art 88 <input type="checkbox"/> Art <u> </u>
<input type="checkbox"/> Art 276 : verzwaren	<input type="checkbox"/> Art <u> </u> <input type="checkbox"/> Art <u> </u>
<input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	<input type="checkbox"/> Art <u> </u> <input type="checkbox"/> Art <u> </u>
	<input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
	<input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN <u>541448820068721709</u> <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <u>1587049</u> meterstand dag : <u>280</u> nacht : <u>32</u> <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter
	Bescherming aansluiting (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input checked="" type="checkbox"/> 032 <input type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> <u> </u> nr. : <u> </u> meterstand : <u> </u>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : <input type="checkbox"/> 230 V <input checked="" type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> <u> </u> Type aardelektrode : <input type="checkbox"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> pen / baar
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input checked="" type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> <u> </u> <input type="checkbox"/> <u> </u>
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type : <u>KVVB</u>
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A <u>1000</u> mA Aantal borden : <u>1</u> Aantal eindstroombanen : <u>23</u>
<input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage(n)	<u>zie bijlage</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> > doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>0,15</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u> </u> MΩ	<input type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input checked="" type="checkbox"/> was verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>geen</u>	Visum DNB of aangestelde : <u> </u>
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u> </u>	
<input type="checkbox"/> Nihil		
Opmerkingen	<u>Definitieve verlichting en keurken nog niet geplaatst</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : Agent nr. : Datum : 18/12/2017

Voor de directeur generaal :

Bijlage(n) : Situatieschema(s) : Eéndraadsschema(s) :

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Situatieschema verdiep

Installateur:

Frederick Ledoux

Datum: 17/12/2017

Handtekening:

Frederick Ledoux

Erkend Organisme:



Datum:

Handtekening:

18.12.2017

Adres van installatie:

Stationstraat 38
8890 Moorslede

Datum: 17/12/2017

Handtekening:


Myriam Nuytten

Datum:

14/12/2017

bijlage 2 van 2

Gv = gelijkvloers
1v = 1ste verdiep

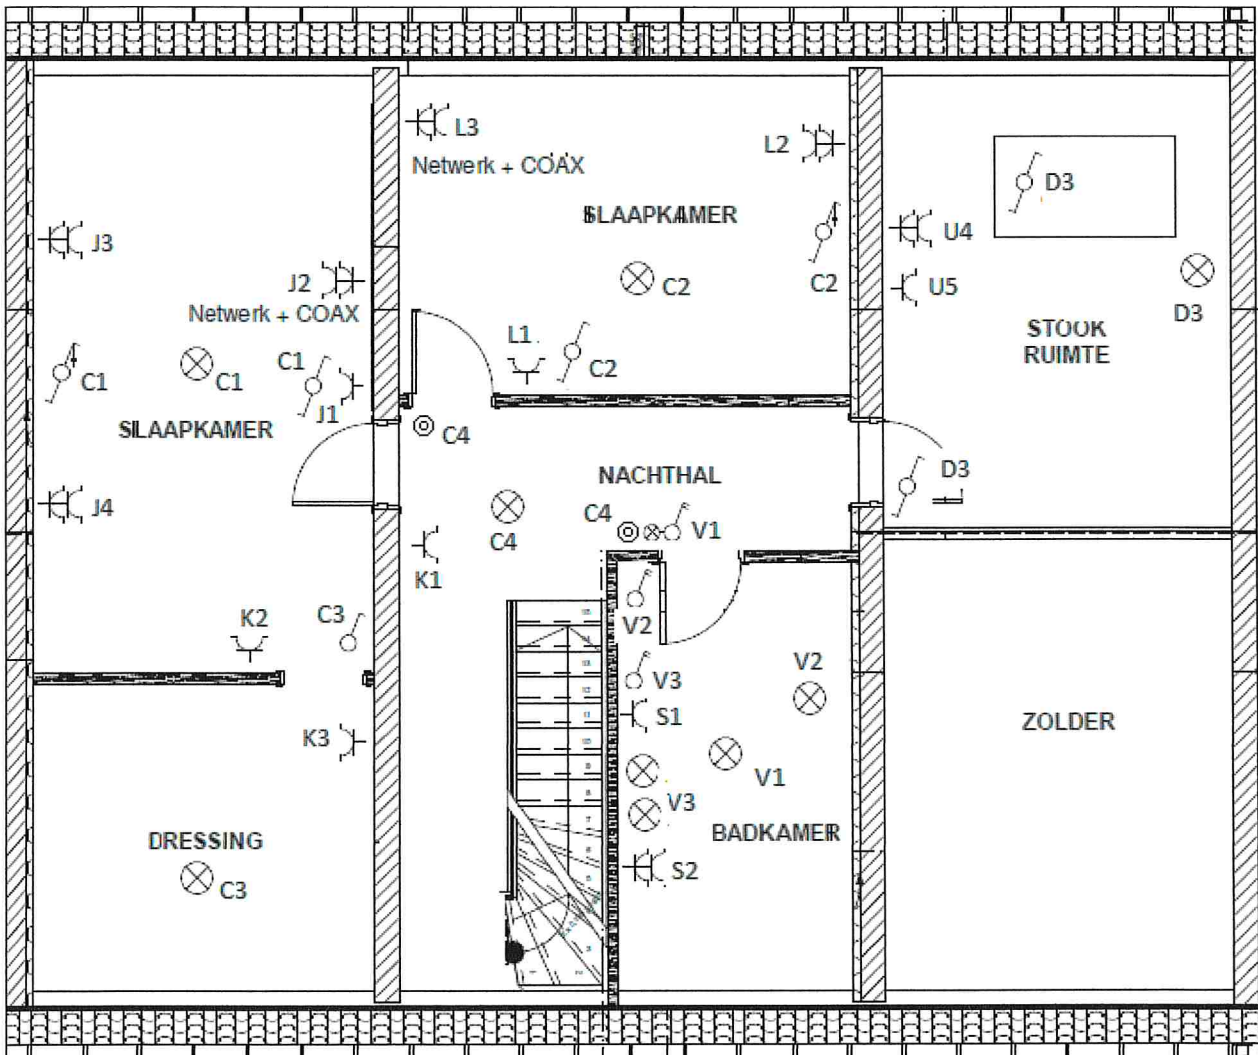

Installatie Stationstraat 38 Moorslede

Y: Diff 300mA

- A: Verlichting living + keuken + eiland
- B: Verlichting wasplaats + toilet + inkom
- C: Verlichting slaapkamer 1 + slaapkamer 2 + dressing + nachthal
- D: Verlichting garage + berging + stookruimte + achterdeur
- E: Stopcontacten living
- F: Stopcontacten keuken + microgolf + dampkap +frigo
- G: Stopcontacten eiland
- H: Stopcontacten zithoek
- I: Oven
- J: Stopcontacten slaapkamer 1
- K: Stopcontacten inkom + dressing + slaapkamer 1 links + nachthal
- L: Stopcontacten slaapkamer 2
- M: Stopcontacten garage
- N: 3 fasen verdeelbord
- O: Kookplaat
- P: 3 fasen voorziening tuinhuis
- Q: Deurbel

X : Diff 30mA

- R: Vaatwas + stopcontacten voorziening strijkijzer
- S: Stopcontacten badkamer
- T: Stopcontacten wasplaats + wasmachine + droogkast
- U: Stopcontacten berging + CV + Waterpompen + ventilatie
- V: Verlichting badkamer
- W: Verlichting buiten

Situatieschema gelijkvloers

Installateur:

Frederick Ledoux

Datum: 17/12/2017

Handtekening:



Erkend Organisme:



VINÇOTTE CERTIFICADO vzw
David Franck

Datum:

18.12.2017

Handtekening:




Adres van installatie:

Stationstraat 38
8890 Moorslede

Datum: 17/12/2017

Handtekening:



Datum:

14/12/2017

bijlage 1 van 2

Gv = gelijkvloers
1v = 1ste verdiep

