

Register nr: Zegel nr: 10.26.70.
 ADRES INSTALLATIE: Heilbome 335 EREBODESEM
 EIGENAAR (Naam - Voornaam):
 Adres:
 OPDRACHTGEVER: Het Energiebureau
 Adres:
 INSTALLATEUR:
 Adres:
 BTW of IK:

DNB: Teller nr: 4176286 Index: EAN Code:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: B2038 Isolatiemeter SGS nr: B2038 Continuïteitsmeter SGS nr: B1984
 Netsysteem: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102
 Controledatum: 26/01/2011 (AREI art.87/86) TEC EE 211-212
 Aard van onderzoek: ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
☒ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
☒ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
☒ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)
 Aard van installatie: bestaande - nieuwe - uitbreiding - wijziging - voorlopig - wervel
 Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere:
 Bouwjaar: fundering vóór - na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór - na 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: ja / nee
 Aansluiting: spanning: 3x400 + N VACDC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: 20 A - voorzien: A
 Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm², type: EXUB; Algemene schakelaar: 4P40 A, type: ADSI 300mA 30mA
 Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider
 Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; Ra = Ω; Ri tot = MΩ

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - inbreuk - opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - inbreuk - opmerking
- Bestaat er: badkamer - wasmachine - afwasmachine - droogkast - deuchekamer: ja - neen
- Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: ja - neen (als ja, zie in bijlage)
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ja - neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: ja - neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed - inbreuk - opmerking
- Staat van het elektrisch materiaal: goed - inbreuk - opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed - inbreuk - opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed - inbreuk - opmerking
- Vast of vast opgesteld materieel: goed - inbreuk - opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed - inbreuk - opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN :

open

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde

BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde).

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

- ☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI is verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.
- ☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).
- ☐ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor
- ☐ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.
- ☐ De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek op de vastgestelde gebreken moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd.

INSPECTEUR:

Nr + naam + handtekening

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:

Inspecteur gezien op vermelde datum

VISUM VAN DNB:

DATUM:

Blad LS nr 135807

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SSB_BIEE10.12N - 16/10/09

SGS Statutory Services Belgium VZW

Internationalelaan, 55/D

1070 Brussel

t +32 (0)2 411 60 35

f +32 (0)2 411 38 70

e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com

Grote baan, 76/1

3530 Houthalen

t +32 (0)11 80 61 76

f +32 (0)11 80 61 75

e sgs.houthalen.sgsssb@sgs.com

SGS House, Noorderlaan, 87


2030 Antwerpen

t +32 (0)3 545 48 88

f +32 (0)3 545 48 89

e sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com

Situatieschema Gelijkvloers

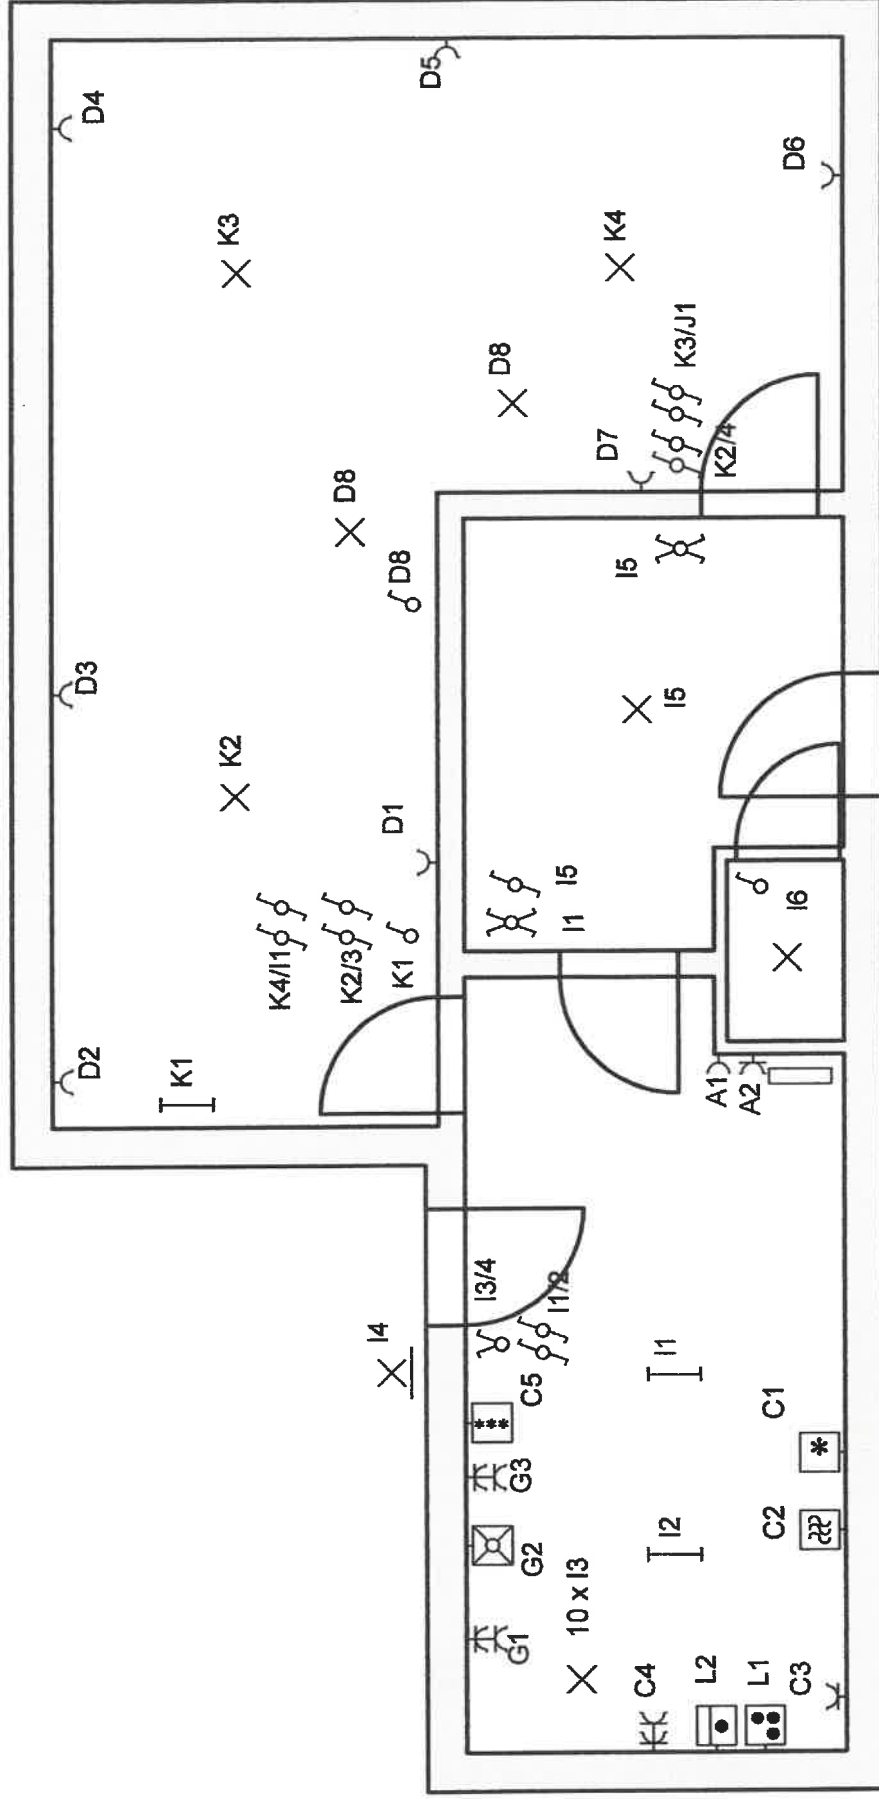

Eigenaar



Heilborre 11
9320 Erembodegem

Controle-organisme

GECONTROLEERD DOOR
SGS-SSB
DATUM 26/11/2011
INSP. 617 P00

Uitvoerder

Situatieschema Verdiep + Garage

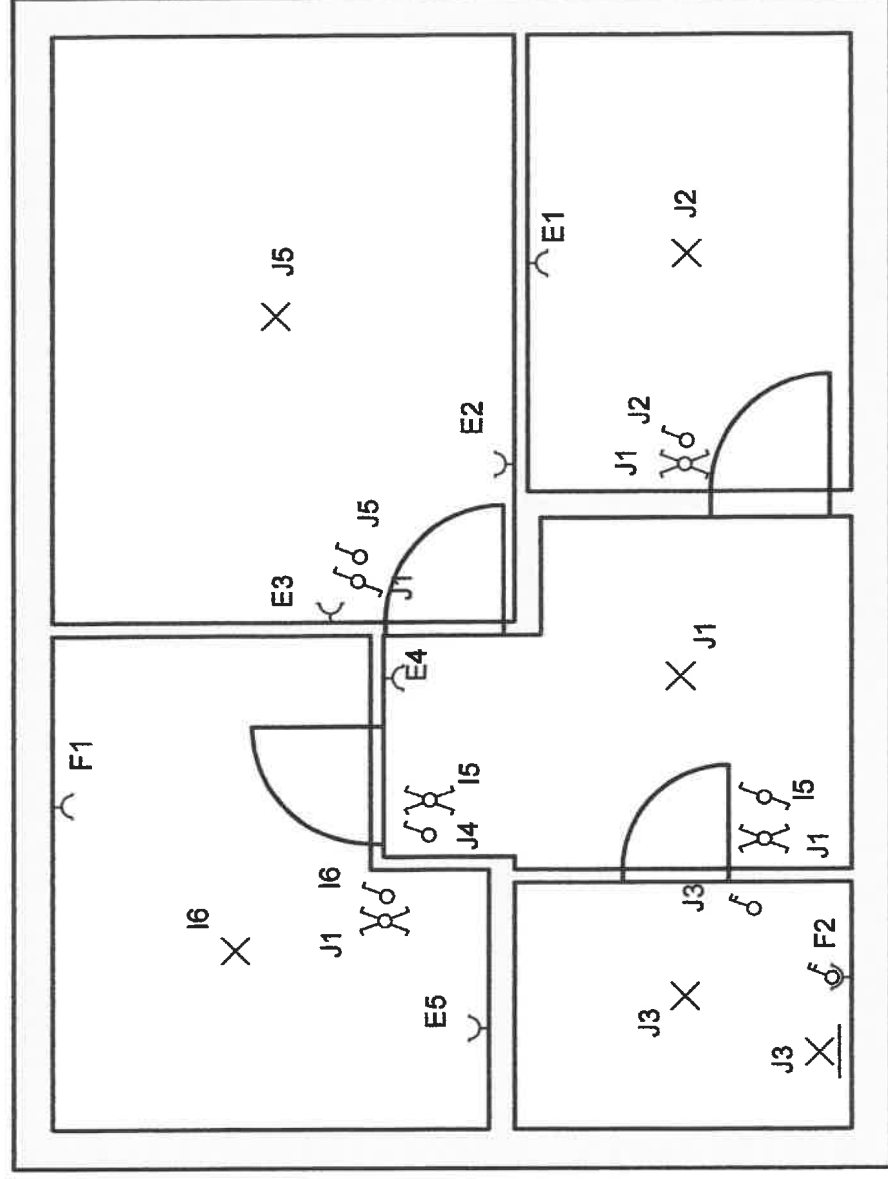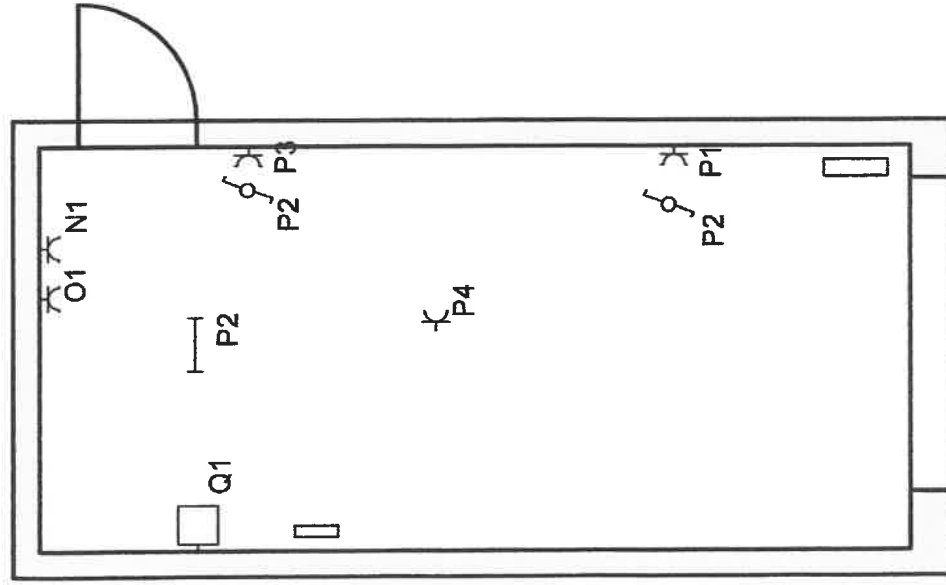

Eigenaar


Heilborre 11
9320 ERembodegem

Controle-organisme

GECONTROLEERD DOOR
SGS-SSB
DATUM: 12/01/2011
INSP. 617 POD

Uitvoerder

Eendraadschema Bord A

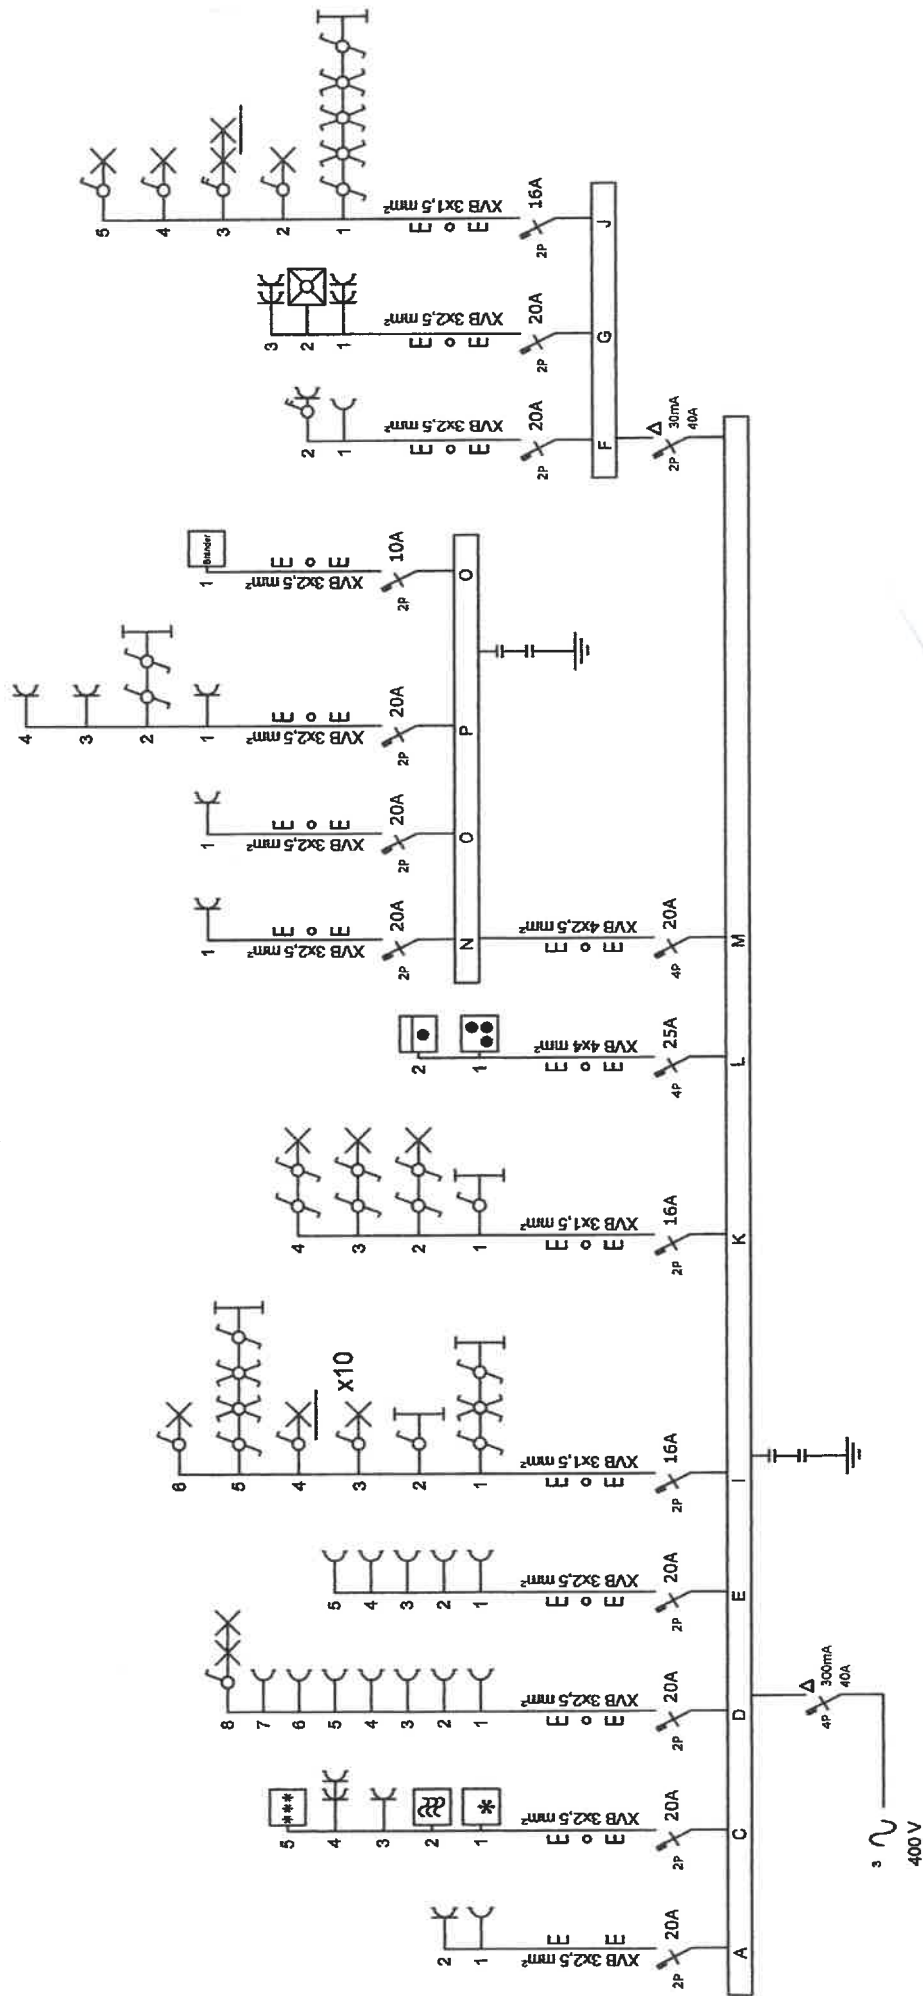

Eigenaar

Heilborre 11
9320 Erembodegem

Controle-organisme

BECONTROLEERD DOOR
SGS-S58
DATUM 26/10/2011
IWSF-617 P00

Uitvoerder

L			M			C			D			K			F			G			J			A			E			I		
25A 4P			20A 4P			Diff 40A 300 mA 4P			20A 2P			20A 2P			20A 2P			20A 2P			16A 2P			20A 2P			20A 2P			16A 2P		

A: Stop verdeelkast

C: Stop keuken 1

D: Stop Living

E: Stop Verdiep

F: Stop Badkamer

G: Stop Keuken 2

I: Licht Keuken, Hall, Toilet, Buiten, Slpk 2

J: Licht Slpk1, Slpk3, Badkamer, Hall

K: Licht Living

L: Kookplaat + Oven

M: Garage

<u>Eigenaar</u> Heilborre 11 9320 Erembodegem		<u>Controle-organisme</u> GECONTROLEERD DOOR SGS-SSB DATUM: 20.11.2011 INSP. 617 PDD	<u>Uitvoerder</u>
---	--	---	-------------------
