

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°: 501500
 Inspecteur: Bergen Francis
 Controle volgens AREI. art.: 86, 270
 Type keuring: Indienststellingsonderzoek

Datum verslag: 19/05/2019
 Datum keuring: 29/04/2019
 Keuring N°: 20191686
 Aanwezigen: [REDACTED]

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Centrumlaan 60/02, 9400 NINOVE
 Distributienetbeheerder: Iverlek (via Eandis)
 Teller n°: GEEN TOEGANG
 Index teller: Dag: 0,00 Nacht: 0,00

EAN-code:

Naam opdrachtgever: ALFA SUN

Adres opdrachtgever: BOVENHOEKSTRAAT 64, 9406 NINOVE

Naam eigenaar: [REDACTED]

Adres eigenaar: [REDACTED]

Installateur: ALFASUN

BTW-n° of ID:

Type lokaal: Appartement (Nummer appartement : 2)

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 1 x 400V + N (230V)
 Type electrode: Lus

Max. beveiliging: 2 x 40 A
 # verdeelborden: 1

Meter – bord verbinding: XVB 4 x 10 mm²
 # eindstroombanen: 1

Differentieelschakelaars:

In:	Id:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	OK	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:
 ALGEMEEN + PV INSTALLATIE # 1

Bescherming:
 1 X C10A 2P Icc 4500A

Sectie:
 2,5mm²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	0,32	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	1,43	MOhm	Aardingscontinuiteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 29 / 04 / 2044 (art. 271).
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

De inspecteur,
 Bergen Francis



ATECON vzw
 Britselei 94 Bus 31
 2000 Antwerpen
 BTW-BE: 0408.677.925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd. ☐
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Extra nota's :

OMSCHRIJVING PV INSTALLATIE ☐

☐

1 X SOLIS 700 ☐

NOMINAAL AC VERMOGEN 700 WATT ☐

SERIENUMMER 112E01187250152 ☐

☐

2 PANELEN VIESSMANN 300 WATT ☐

TOTAAL GEINSTALLEERD DC VERMOGEN 600 WATT PIEK

Raadgevingen

A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.

b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.

c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

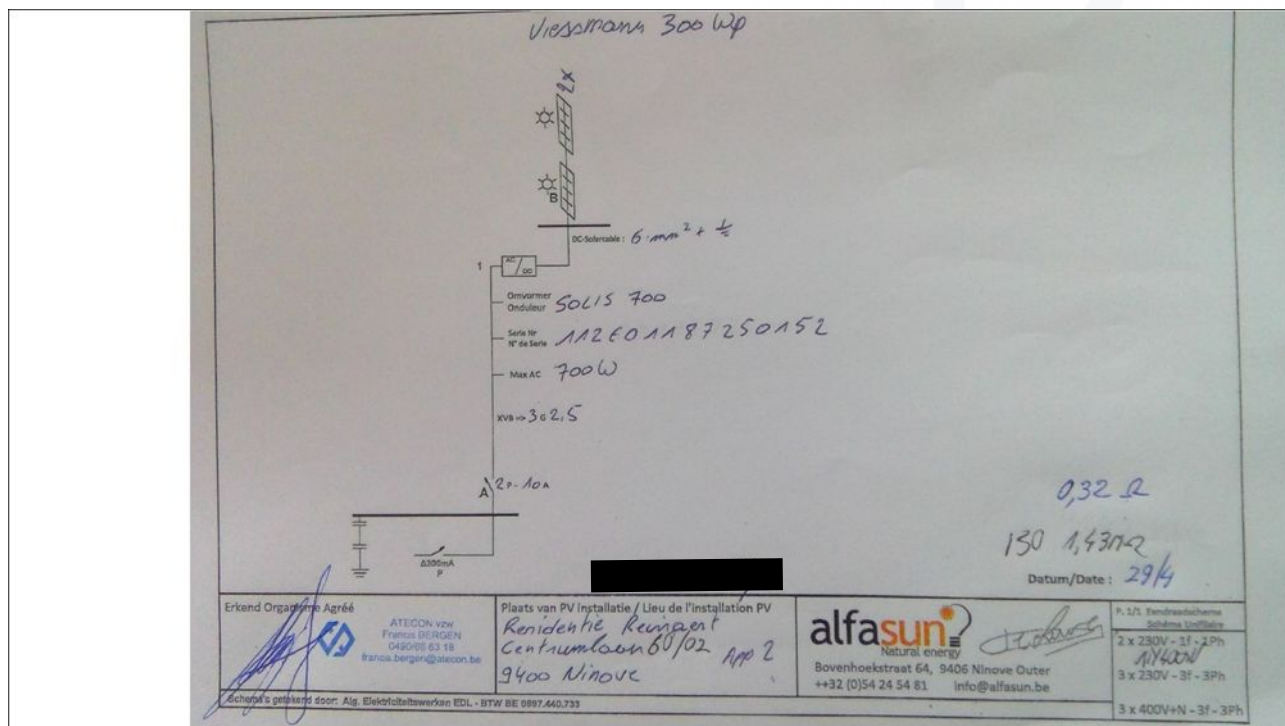


N°618-INSP

Algemene gegevens :

Verslag N°: 501500
 Inspecteur: Bergen Francis
 Controle volgens AREI. art.: 86, 270
 Type keuring: Indienststellingsonderzoek

Datum keuring: 29/04/2019
 Keuring N°: 20191686
 Aanwezigen: [Redacted]

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:
