



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 24/05/2022 Uitgiftedatum verslag: 24/05/2022
Verslagnummer: 0540-220524-03

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 016 63 47 45 E: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0540

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ELEKTRICITEITSWERKEN DAVY PUT
Adres: LEEFKERN 21, 3294 DIEST
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: BEERNAERTS-VERVOORT
Adres: WEERDESTEENWEG 2B, 1982 ELEWIJT
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ELEKTRICITEITSWERKEN DAVY PUT
Adres: LEEFKERN 21,3294 DIEST
BTW-nummer: 0841561409

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: BEERNAERTS-VERVOORT
Adres: WEERDESTEENWEG 2B, 1982 ELEWIJT
EAN- code:
Nummer teller: Nog te plaatsen
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 De PV installatie behoort niet tot de controle
- 2 De keuken is nog niet geplaatst.
- 3 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
- 4 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 5 De werking van de differentieelstroominrichting kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
- 6 Zolder nog niet volledig afgewerkt, (giprock wanden)

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0540-220524-03



1 / 4



RE06_01-08_01 09-21
Verslagnummer 0540-220524-03



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 16 mm²
 Type aardelektrode: Aardingsbaren
 Aantal borden: 2


Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A
 Type algemene schakelaar: 2P 63A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 3 + 25 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

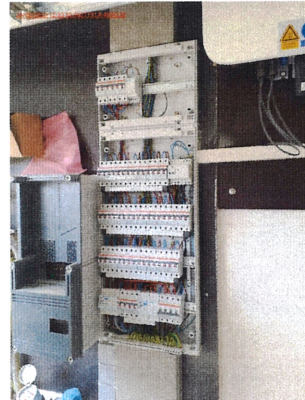

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 2,3 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 100 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 24/05/2047
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

RE06_01-08_01 09-21
 Verslagnummer 0540-220524-03





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0540 i.o. van de technisch directeur
24/05/22 12:36

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.


RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0540-220524-03




4 / 4

nisatie **RTV**
 n m **24 MEI 2022**
 tekening **van Overstraeten**
van der **500**

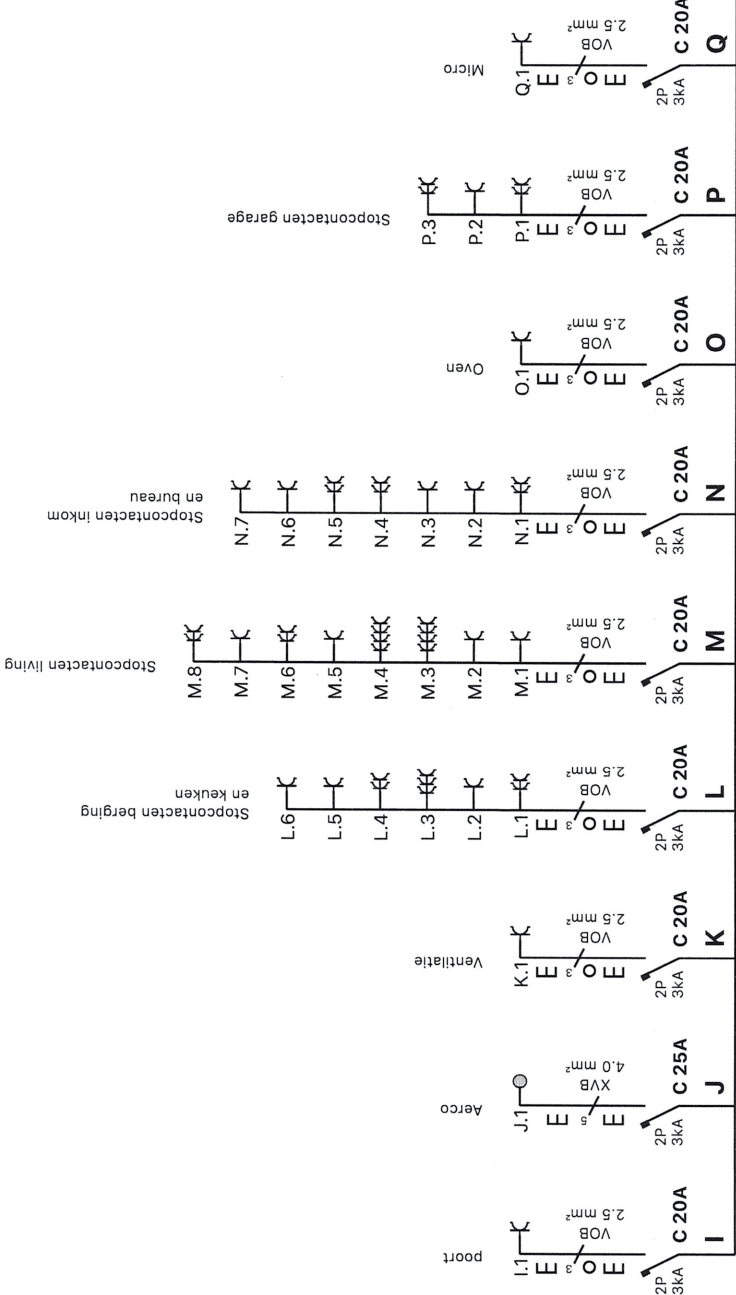


INSTALLATEUR		KEURING		KLANT	WERF	
Naam	Davy Put bvba	Organisatie	BTV	Naam	Beernaert-Vervoort	Spanning
BTW	be0741561409	Naam	Naa	Straat	Weerdesteenweg	380v
Datum	<u>1 mei 2022</u>	Datum	24 MEI 2022	Gemeente	1982 Zemst	
Handtekening	<u>[Signature]</u>	Handtekening	Jelle Van Overstrac 540	Handtekening		

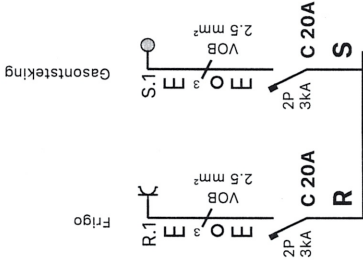


INSTALLATEUR		KEURING		KLANT		WERF	
Naam	Davy Put bvba	Organisatie	BTV	Naam	Beernaert-Vervoort	Naam	Beernaert-Vervoort
BTW	be0741561409	Naam	24 MEI 2022	Straat	Weerdesteenweg	Straat	Weerdesteenweg
Datum	1 mei 2022	Datum	24 MEI 2022	Gemeente	1982 Zemst	Gemeente	1982 Zemst
Handtekening		Handtekening	 Van Overstraeten 540	Handtekening		Handtekening	
			Btv				Spanning
							380v

Zekeringkast


Verlichting en stopcontacten!

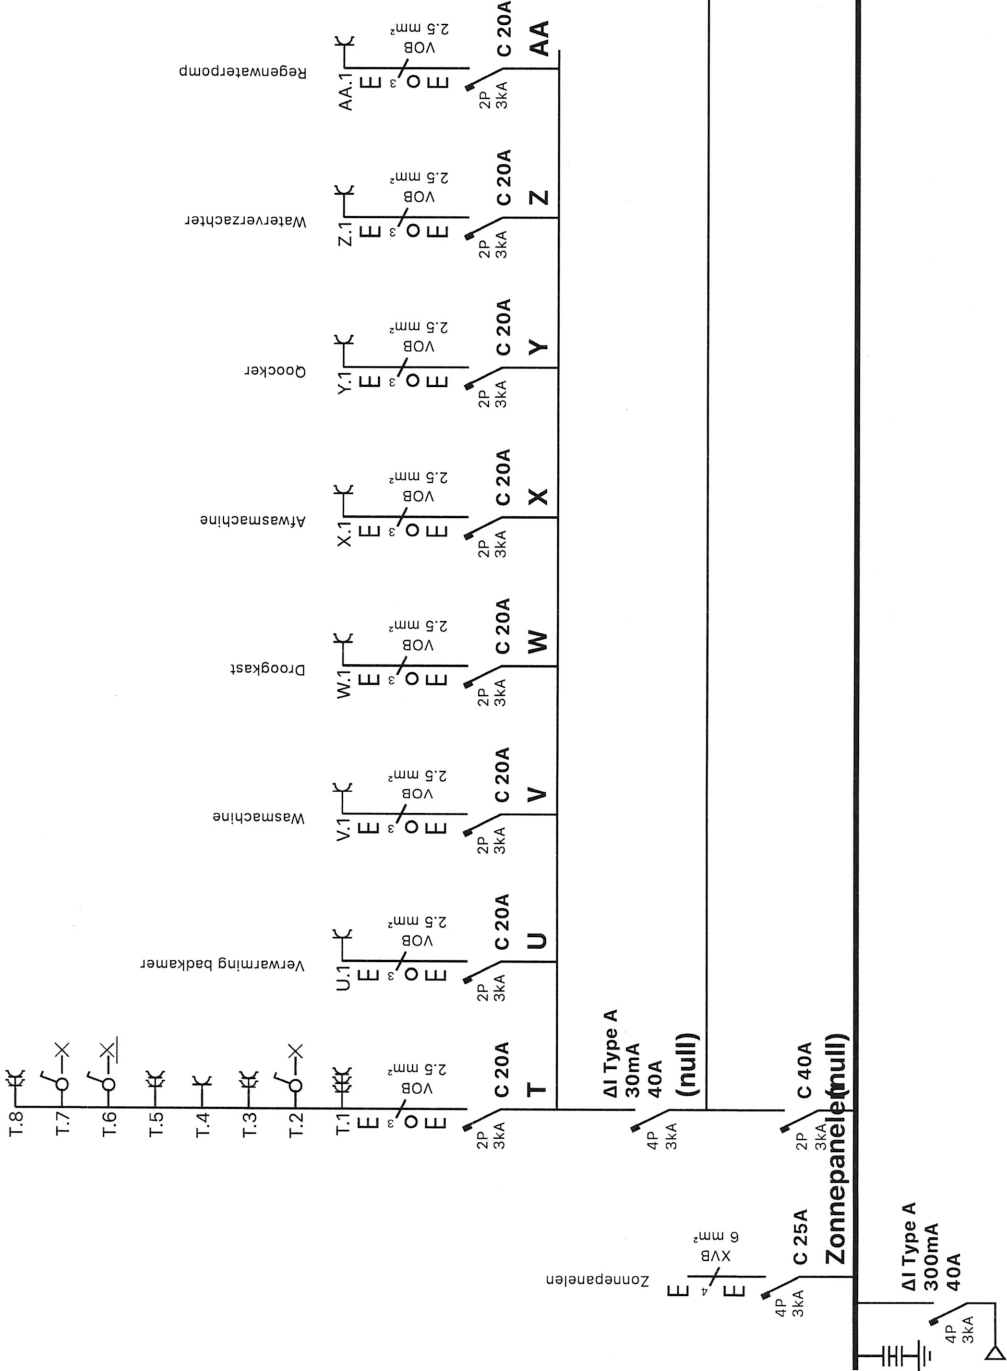

INSTALLATEUR	KEURING	KLANT	WERF	
Naam Davy Put bvba BTW be0741561409 Datum 1 mei 2022 Handtekening	Organisatie Naam Datum 24 MEI 2022 Handtekening Jelle v. Straeten	Btv Naam Straat Gemeente Handtekening	Beernaert-Vervoort Weerdesteenweg 1982 Zemst Naam Straat Gemeente Handtekening	Spanning 380v

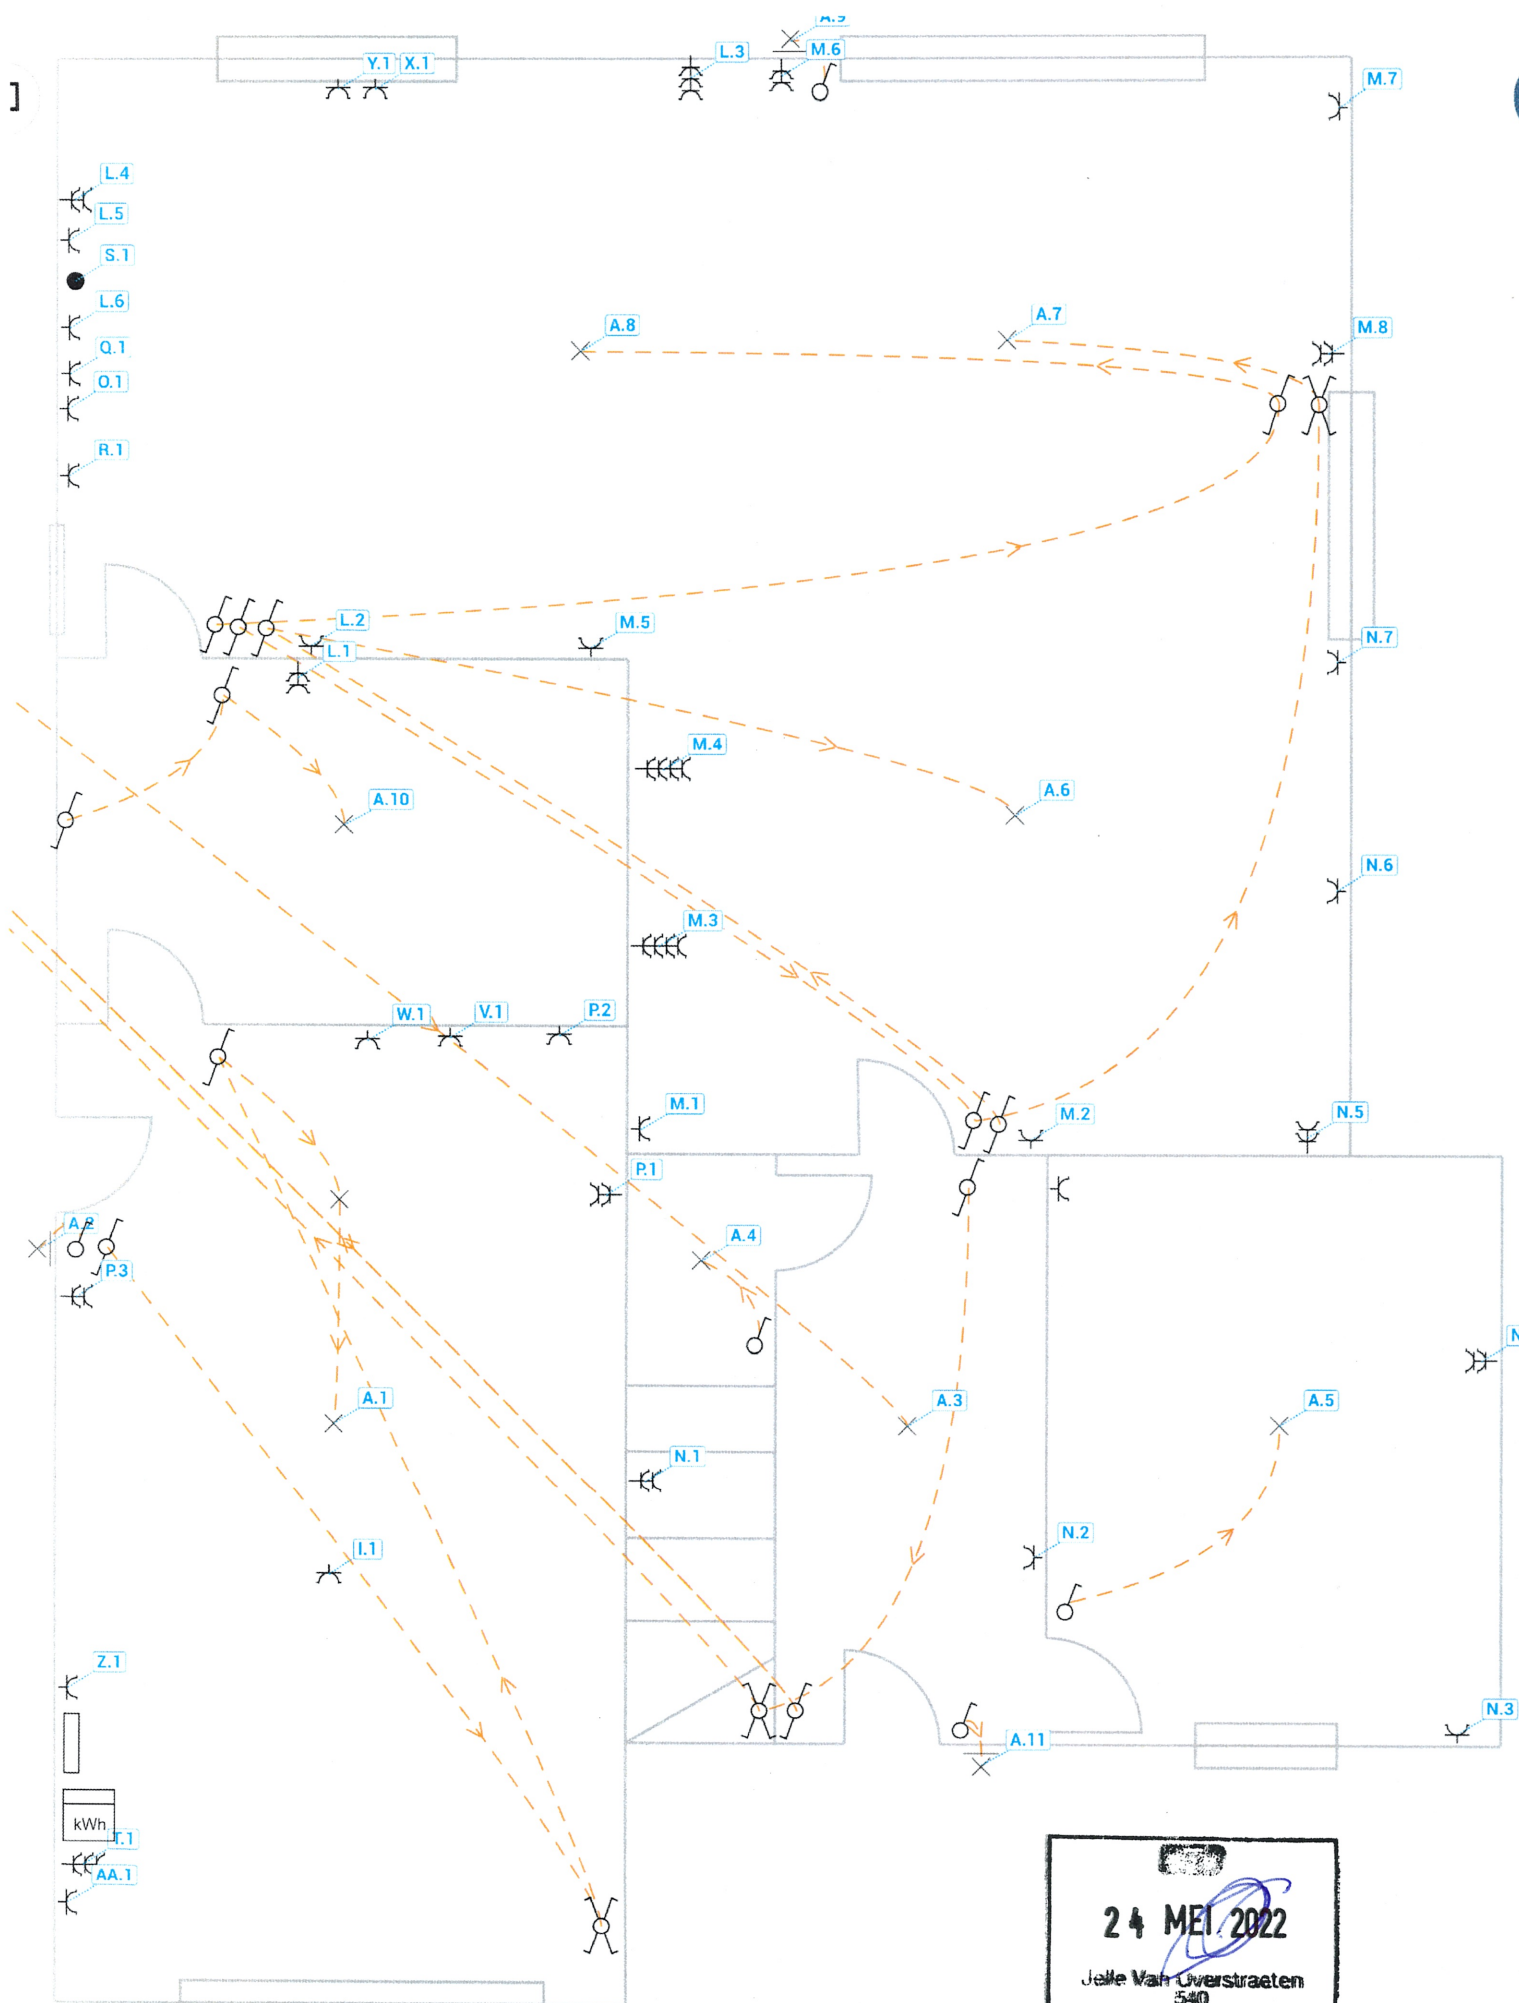

24 MEI 2022
Jelle Van Overstraeten
5410

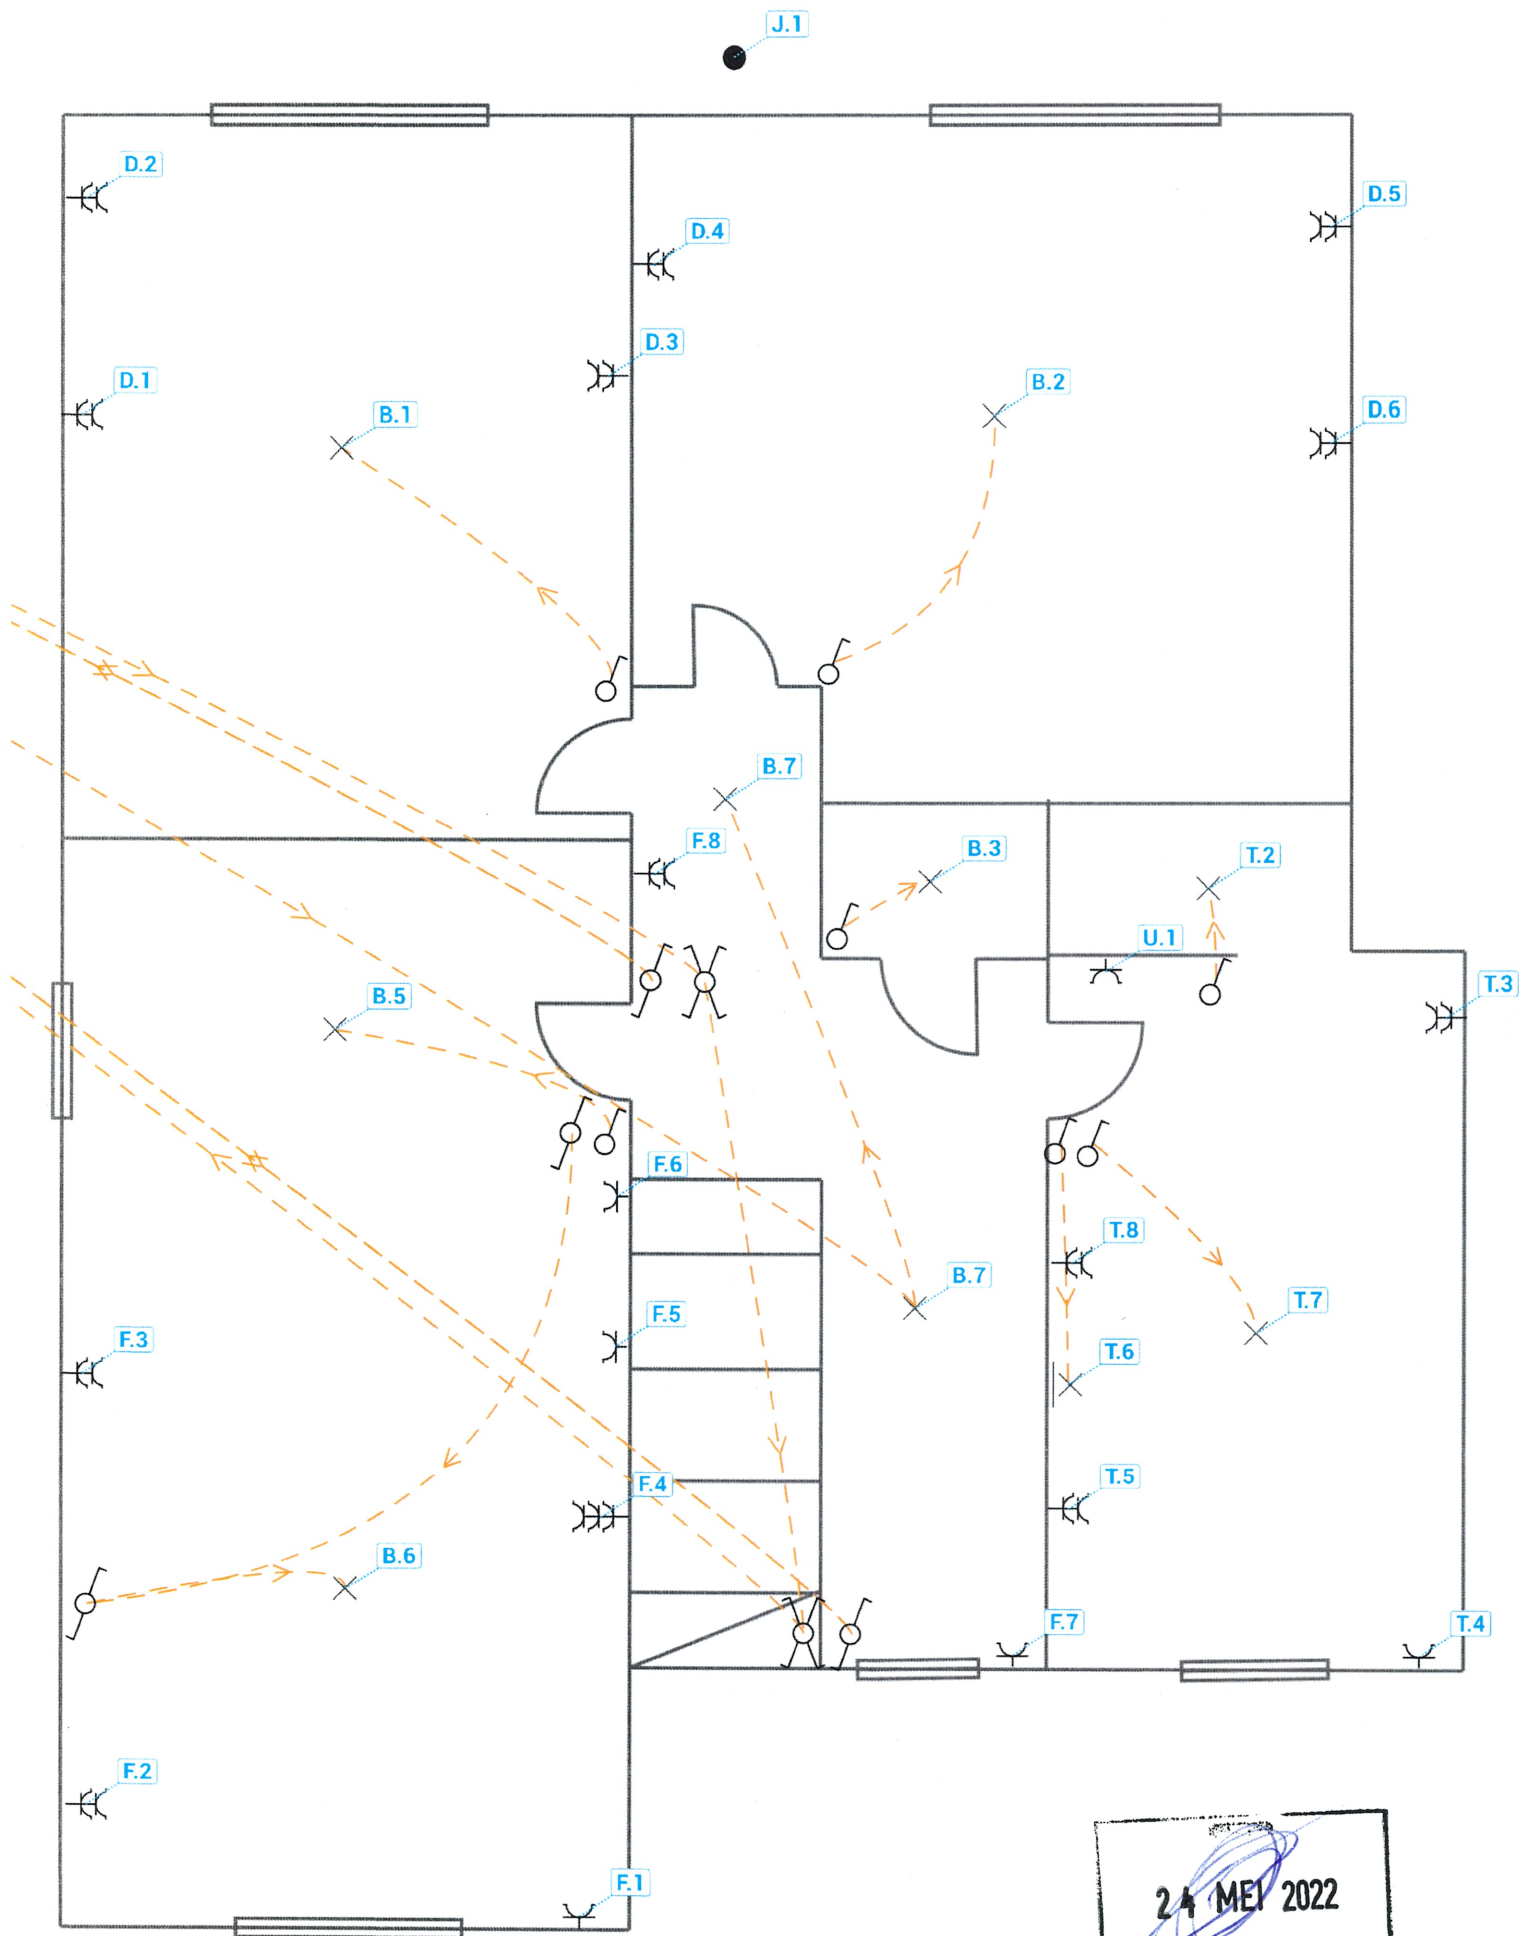

24 MEI 2022
Jelle Van Overstraeten
540



~~Jelle van Overstraeten~~
549
