

SGS



Register nr: Zegel nr: 40 159
ADRES INSTALLATIE: groene Schild 35
3870 Heers
EIGENAAR: Vanhanel Kristof
Adres: Hoselkessemeuweg 10 3720 Kerkraai
OPDRACHTGEVER: J. dan
Adres:
INSTALLATEUR: J. dan
Adres:
BTW of IK:

STROOMLEVERANCIER: IE Teller nr: 28734754 Index: 45573,1

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: A0752 - Isolatiemeter SGS nr: A0752 - Continuïteitsmeter SGS nr:
Netsysteem: TT - ~~TN-S~~ Installatie: Huishoudelijk (AREI art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902
Datum van het onderzoek: 17/10/05 Industriel (AREI art. 87/86 - 88) TEC EE 201 - 202 - 902
Is er noodzaak tot zonerings: Neen / ~~Ja~~ (TEC EE 511-512)
Aard van het onderzoek: ~~Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art. 270) (Voorschr. strooml.)~~
~~Periodiek controlebezoek (AREI art. 271 - ARAB art. 262) (Voorschr. strooml.)~~
Controlbezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art. 276) (Voorschr. strooml.) (belangrijke informatie op keerzijde)
Aard van de installatie: Bestaande - ~~Nieuwe~~ - Uitbreiding - Wijziging - ~~Voorlopig~~ - ~~Werk~~ -
Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere...), ~~huishoudelijke werk eenheid, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid~~
Bouwjaar: fundering vóór - ~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie vóór ~~na~~ 1.10.81 - 1.1.83 - ~~met~~ zonder BA4/BA5
aansluiting: Spanning: 3N 400 V V AC-DC, Bescherming van de aansluiting: Bestaande 40 A - Voorzien: 40 A
Aardingskabel hoofdbord: x mm², type: X.V.B.; Algemene schakelaar 40 A, type: A052
Type van de aardelektrode: ~~lus - baran~~ - pennen - ~~horizontale geleider~~
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; R_a = 28 Ω; R_i tot = 1 M Ω
BESCHRIJVING: Zie schema in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: Ja - ~~Neen~~.
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: Ja - ~~Neen~~.
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - douche-kamer: ~~Ja~~ - Neen.
- Plaatsing van ZLVS-verlichting: ~~Ja~~ - Neen.
- Plaatsing van elektrische verwarming: ~~Ja~~ - Neen.

VASTGESTELDE INBREUKEN - OPMERKINGEN - NOTA'S:

Geen inbreuken.

Nota: Badkamer in verbouwing.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDER : zie keerzijde.

BESLUIT: Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.
De installatie is conform onder voorbehoud van zie keerzijde.
De algemene ADSI is - ~~was~~ verzegeld. De schema's, ééndradig en inplanting zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.
De installatie is niet-conform. De ADSI was verzegeld.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 17/10/2009 (AREI art. 271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.
De installatie mag in dienst gesteld worden.
De installatie mag in dienst gesteld blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken.
De installatie mag niet in dienst gesteld worden = blijven.

AGENT - BEZOEKER:
Nr. + naam + handtekening
Hoeben David

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGDHEID:
Agent gezien op vermelde datum

Blad nr 103264

VISUM VAN DE VERDELER:
[Handtekening]
DATUM: 23/10/2005

Aanvulling bij het besluit :

De installatie zal conform zijn nadat de eendraad- en situatieschema's van de elektrische installatie, gehandtekend door de installateur en/of eigenaar, aan ons overhandigd worden.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS - BEHEERDERS - HUURDERS

– van elektrische huishoudelijke installaties :


- 1) Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- 2) In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- 3) Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Directie Elektrische Energie te worden verwittigd.

Voor de installaties op werkplaatsen, krachtens artikel 14 van Codex, Titel II, Hoofdstuk IV, zal het huidig document ter kennis voorgelegd worden tijdens de eerstkomende vergadering aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk, indien deze bestaat binnen het bedrijf. Dit document moet tevens overgemaakt worden aan iedere preventieadviseur van de huurder(s) van uw installaties. We raden U eveneens aan om een exemplaar van het verslag ter beschikking te stellen van de onderhoudsdienst.

Toepassing van artikel 276 van het AREI (tellerverzwing) :

Volgens artikel 276 van het AREI (Koninklijk Besluit van 10 maart 1981), moeten elektrische huishoudelijke installaties waarvoor een verzwing van aansluiting op het openbaar verdeelnet is aangevraagd, en waarbij overtredingen werden vastgesteld bij het eerste controlebezoek, het onderwerp uitmaken van een nieuw controlebezoek door hetzelfde erkende organisme, na het uitvoeren van de nodige herstellingen en ten laatste één jaar na het eerste controlebezoek.


Indien er bij het tweede controlebezoek overtredingen overblijven of indien het tweede bezoek niet is uitgevoerd door hetzelfde organisme, zijn wij ertoe gehouden (door Koninklijk Besluit) om de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in te lichten en hen een afschrift van het rapport van de eerste controle te bezorgen.

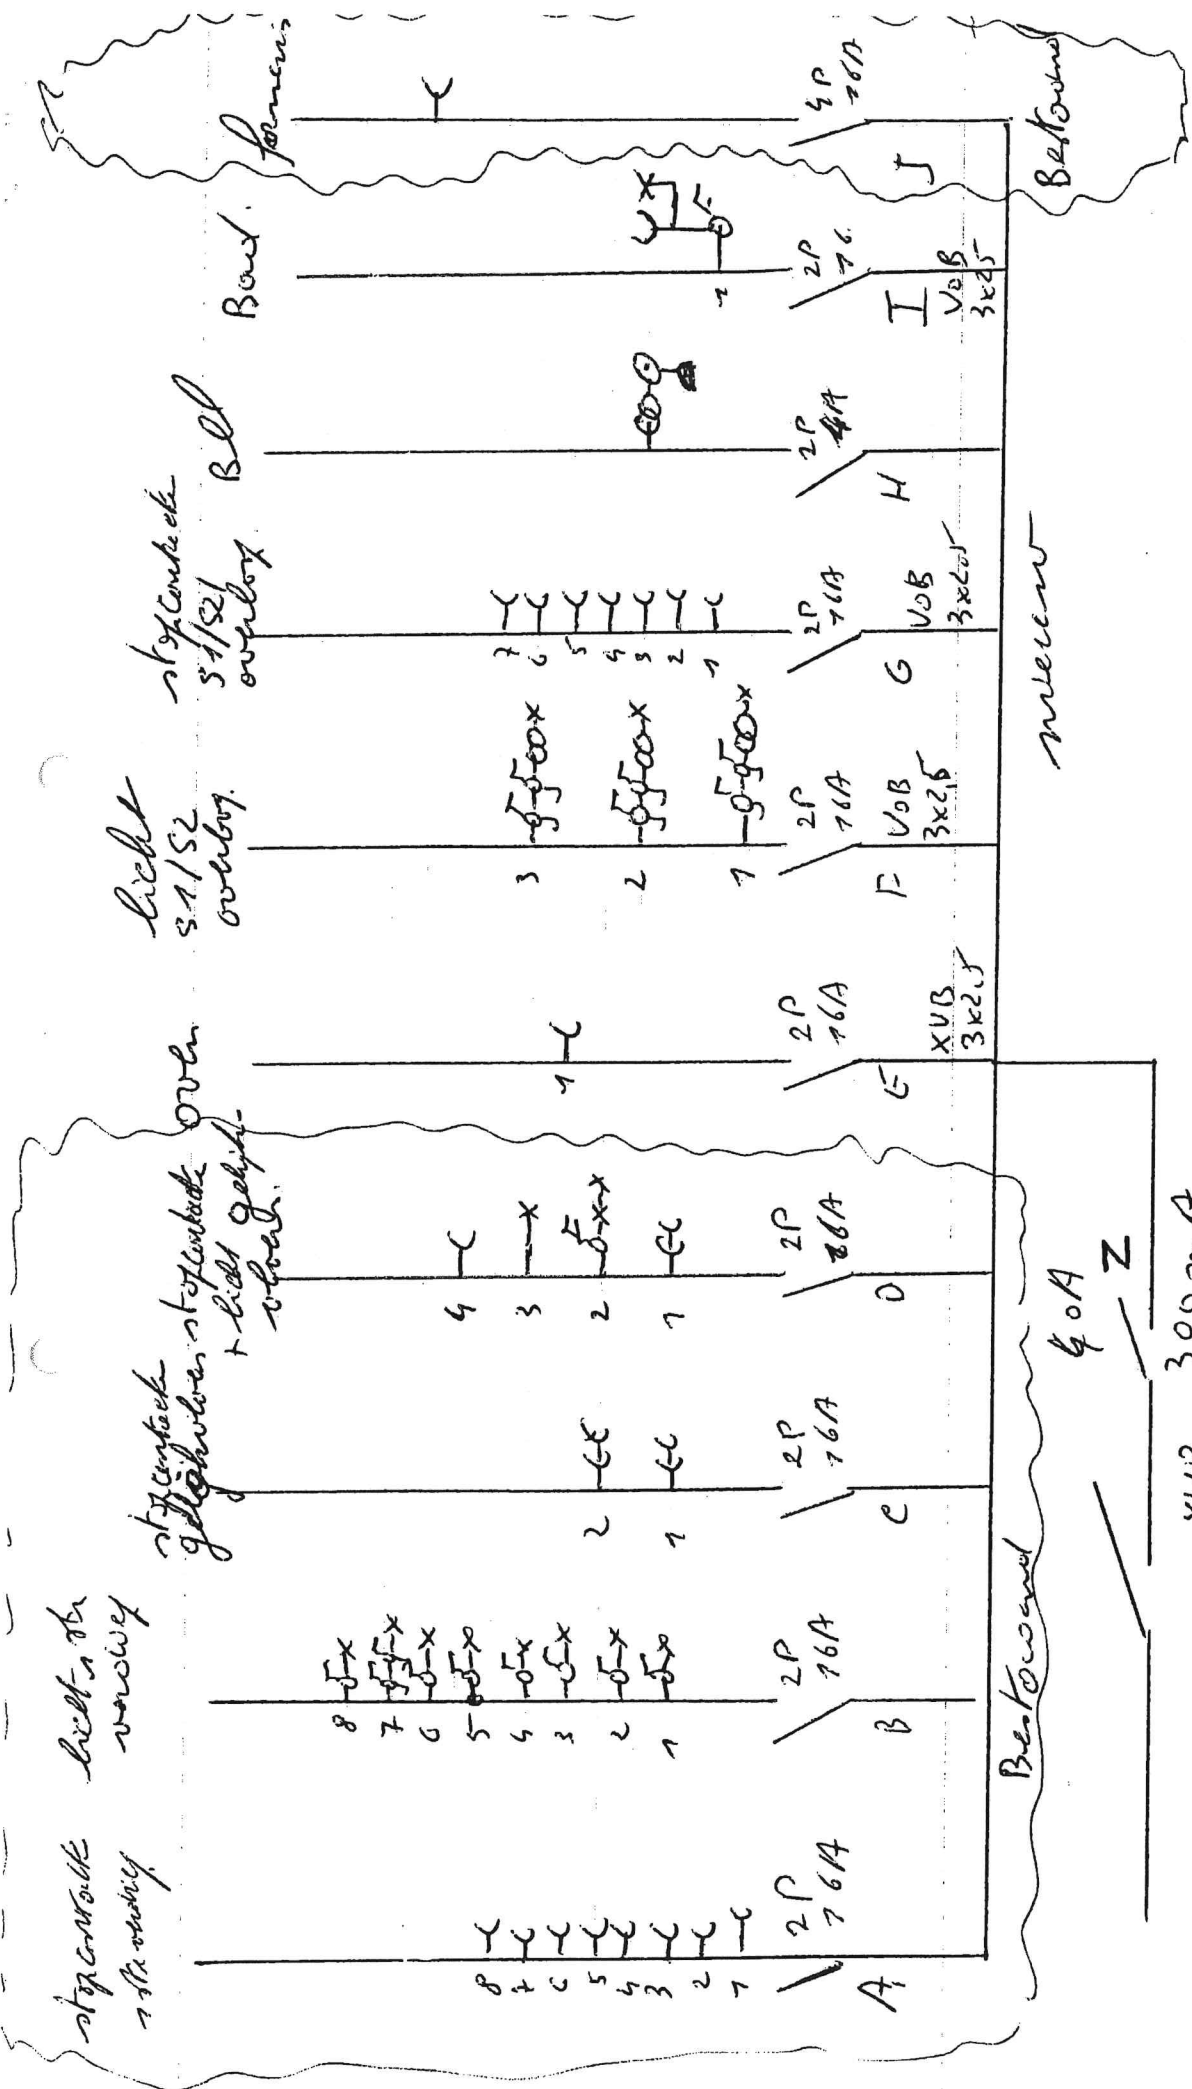

DUPLEX-APP
 GEMESCHILG
 35
 N

40A
 Z
 XUB 300mA
 4x4+4

1. verschaf

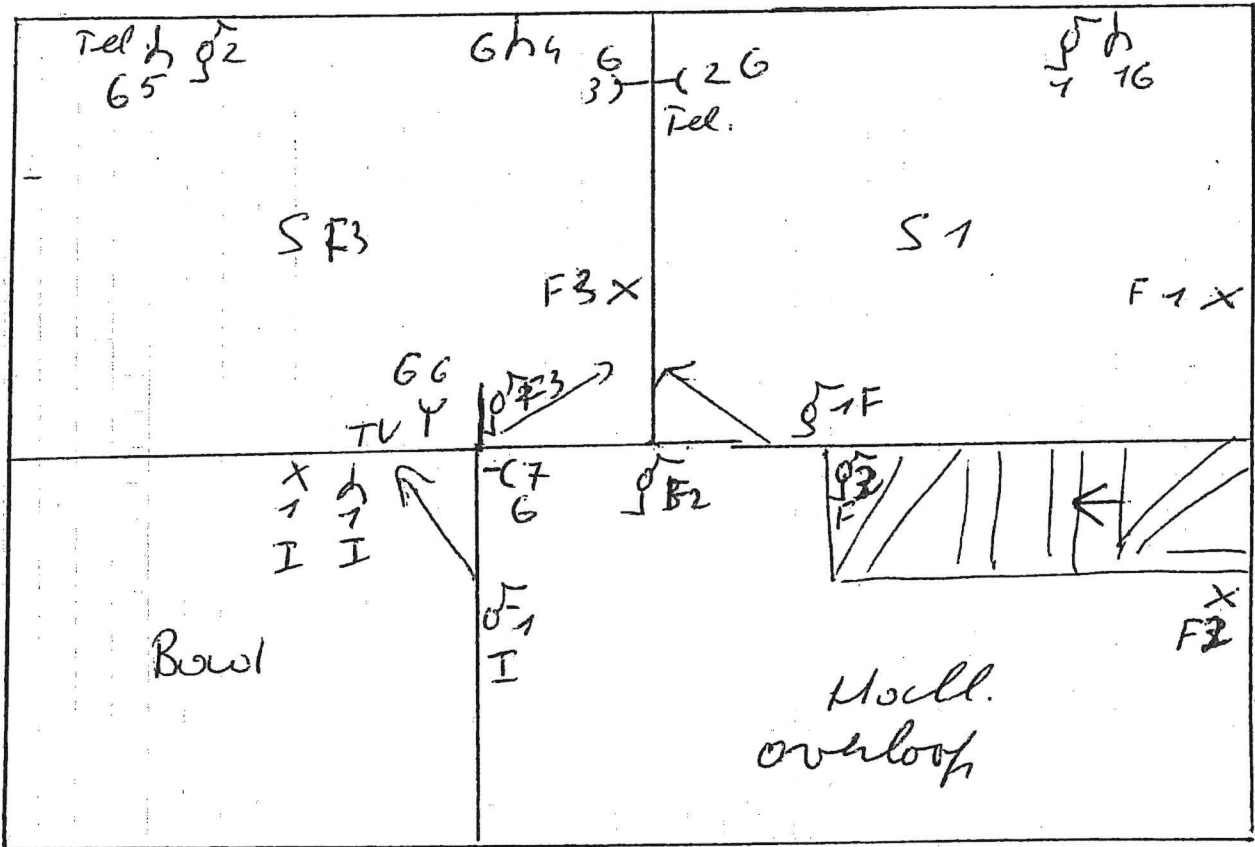

glykholers

