

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 03/07/2019 Inspecteur: Bert Deplae Mentor: Installateur: JDF Bvba
ID-label: Client reference: IK. nr.:-
B.T.W. nr.: BE 667 919 234

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 4472114

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Land Van Waasland
Huisnummer 63
Postcode 9000
Gemeente Gent
Type appartement

Eigenaar:

Naam IOV
Straatnaam Land Van Waasland
Huisnummer 63
Postcode 9000
Gemeente Gent

EAN : 54

Teller Nr.: 34244523

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 2 Aantal kringen: Zie Schema Isolatie: 24,2 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 18 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Zie Schema	ok	ok
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Zie Schema	ok	ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	Zie Schema	ok	ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	☒
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK	niet van toepassing	☐ in afwachting		
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK ☐ NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 3/7/2044
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:



Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 1

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bert Deplae

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is:



Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 3/7/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



Omschrijving zekeringen:

	Zekeringkast Bord 2^{de} verdieping
A	Verliesstroomschakelaar algemeen 40A - Δ300
B	Verlichting en stopcontacten technisch lokaal – slaapkamer 3
C	Verlichting en stopcontacten slaapkamer 2 – nachthal – WC – stopcontact terras
D	Verlichting en stopcontacten slaapkamer 1 – terrasberging – terras
E	Stopcontact microgolfoven – frigo – dampkap
F	Verlichting en stopcontacten aanrecht keuken
G	Verlichting en stopcontacten living – keuken
H	Stopcontact oven
I	Voeding kookplaat
J	Verliesstroomschakelaar gevoelige toestellen 40A - Δ30
K	Verlichting en stopcontacten badkamer
L	Stopcontact vaatwasmachine
M	Stopcontact wasmachine
N	Stopcontact droogkast
O	Stopcontact CV
P	Stopcontacten keuken – zithoek en verlichting zolder
Q	Stopcontacten zolder






Eigenaar : Mevr. Pieters Lien Land van Waaslaan 59-63 9000 GENT	Voor de erkende controle-instelling Naam : Handtekening : Datum : Benaming : BORD 1 appartement 3	Pagina : 1/1 Datum : 26/06/2019	Installateur : JDF Hooistraat 60 9070 Heusden gsm: 0494/083.466 e-mail: info@jdf-elektriciteit.be
--	---	--	---

Voedingskabel niet afgewerkt Niet richtbare spot Richtbare spot Lichtpunt Vloerspot Noodverlichting Wandverlichting LEDverlichting TL verlichting TL verlichting Sierverlichting (buiten) Verstraler Enkel stopcontact met kinderbeveiliging Dubbel stopcontact met kinderbeveiliging 3-voudig stopcontact met kinderbeveiliging stopcontact met kinderbeveiliging en controlelampje Vloerdoos met 1 stopcontact Vloerdoos met 6 stopcontacten Vast aansluitpunt TV distributie Telefoonvoorziening Netwerkvoorziening Wachtbuis	Kookfornuis Dampkap Oven Vaatwasmachine Microgolfoven Koelkast Diepvries Droogkast Wasmachine Deuropener Transformator Deurbel Luidspreker Thermostaat Buitenvoeler Toegangscontrole Sirene (Alarmsysteem) Branddetector Magneetcontact Alarmsensor Alarmluiklancier	Rolluikbediening Bewegingssensor controlelamp Drukknop Draadloze drukknop Dimmer Enkelpolige schakelaar Dubbelpolige schakelaar Serieschakelaar Wisselschakelaar Kruisschakelaar Schemerschakelaar Teleruptor Vierpolige Differentieelautomaat 300mA Vierpolige Differentieelautomaat 30mA Dubbelpolige automatische zekering Boiler	Touchscreen Camera Zekeringkast
Eigenaar : Mevr. Pieters Lien Land van Waaslaan 59-63 9000 GENT	Voor de erkende controle-instelling Naam : Benaming :	Datum : Handtekening :	Installateur : JDF Hooistraat 60 9070 Heusden gsm: 0494/083.466 e-mail: info@jdf-elektricit.be

LEGENDE

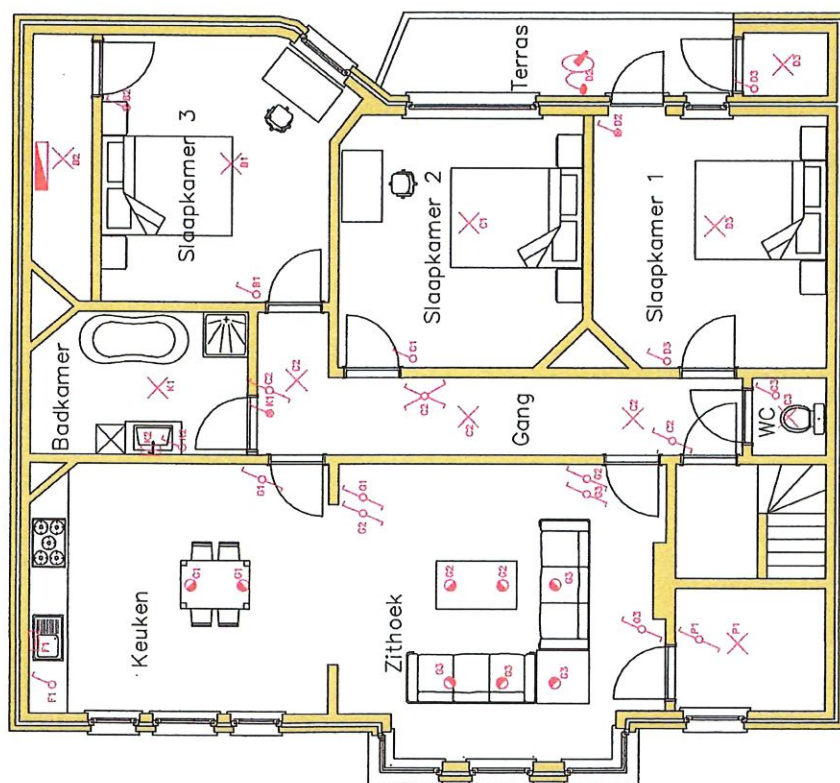

VERLICHTING ZOLDER P1 EN P2

Eigenaar :
Mevr. Pieters Lien
Land van Waaslaan 59-63
9000 GENT

Voor de erkende controle-instelling
Naam : **QACEG**
Benaming : **licht design**


Datum : Handtekening :

Datum :
26/06/2019

Pagina :
1/1

Installateur : JDF
Hooistraat 60
9070 Heusden
gsm: 0494/083.466
e-mail: info@jdf-elektricititeit.be

LICHTPLAN 2E VERDIEPING

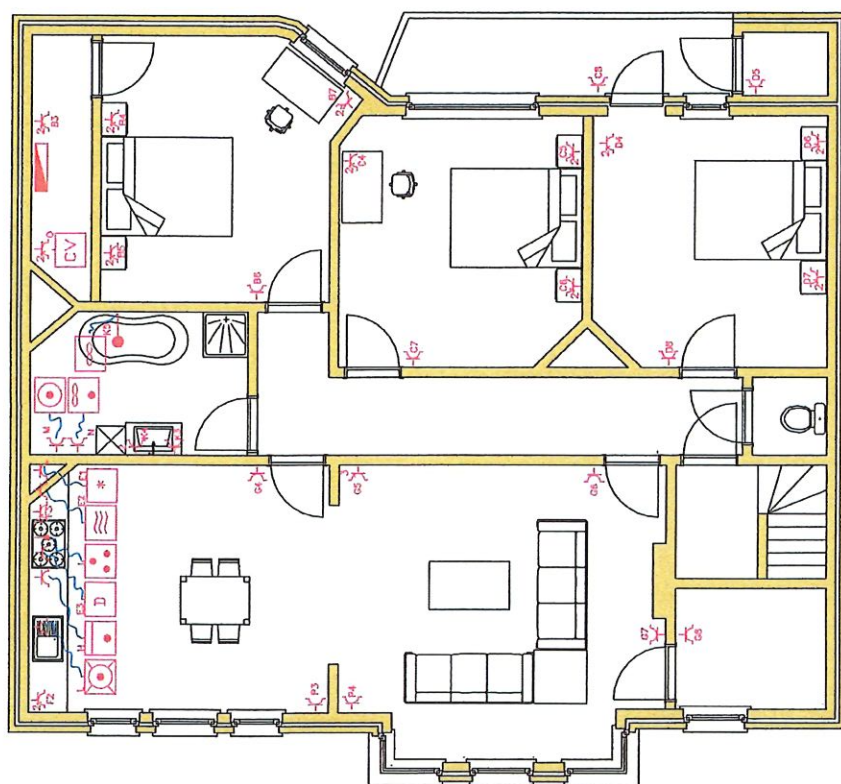

STOPCONTACTEN ZOUDE 01 - 02 - 03 - 04 - 05 EN 06

Eigenaar :
Mevr. Pieters Lien
Land van Waaslaan 59-63
9000 GENT

Voor de erkenning
Naam : **QAGEG**
instelling

Datum : Handtekening :


26/06/2019

Pagina :

1/1

Installateur : JDF
Hooistraat 60
9070 Heusden
gsm: 0494/083.466
e-mail: info@jdf-elektricit.be

STOPCONTACTEN 2E VERD.

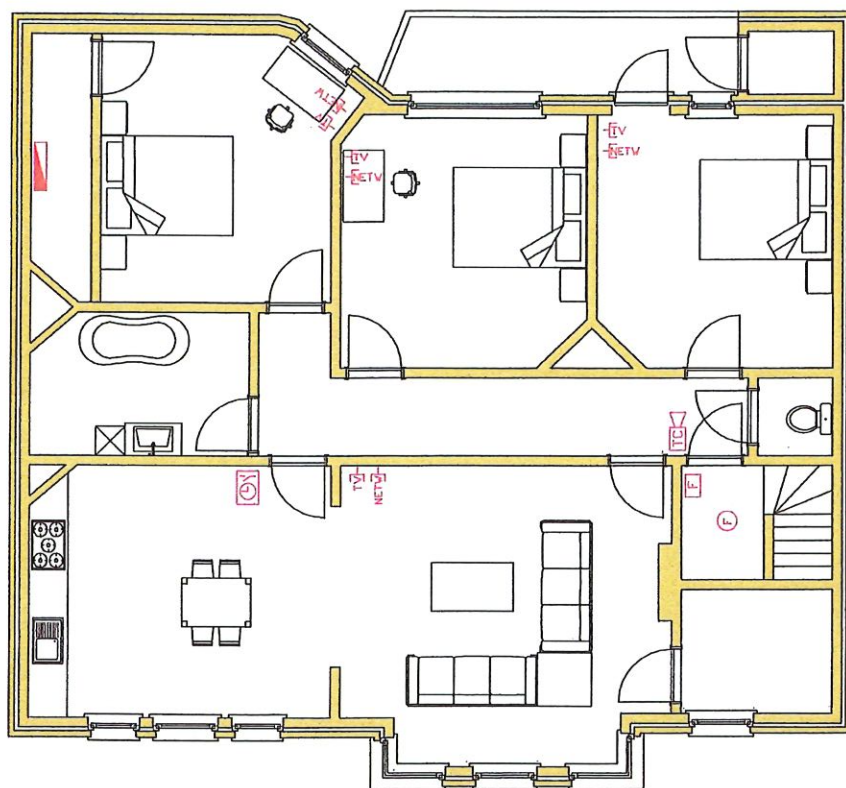

Eigenaar:
Mevr. Pieters Lien
Land van Waaslaan 59-63
9000 GENT

Voor de erkende controle-instelling
Naam: **QACEG**
Benaming: **infocentre**

Datum: Handtekening:

Datum: 26/06/2019

Pagina: 1/1

Installateur: JDF
Hooistraat 60
9070 Heusden
gsm: 0494/083.466
e-mail: info@jdf-elektricit.be

MULTIMEDIAPLAN 2E VERD.
