



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 09/06/2023
ID-label: Damaststraat 41

Inspecteur: Bram Van Nuffel
B.T.W. nr.: BE 0807 490 257

Mentor:
Klantreferentie:

Installateur: Omega Technics BVBA

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557

Serienummer: 19481275

Datum verslag: 09/06/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Damaststraat
Huisnummer	41
Busnummer	
Postcode	9030
Gemeente	Gent
Land	België

Eigenaar

Naam	-
Straatnaam	Damaststraat
Huisnummer	41
Busnummer	
Postcode	9030
Gemeente	Gent
Land	België

Installateur

Naam	Omega Technics BVBA
BTW nr.	BE 0807 490 257
Telefoonnummer	0476862296
E-mail	ridvan.can@telenet.be


Type : woning

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: 32503197

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1

Wijziging of uitbreiding van een huishoudelijke installatie van na 1981 volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.4 en 6.4.7.3
Spanning: 1-230V
Meter / bord verbinding: 10 mm:
Aantal kringen: 10
Max beveiliging: 20 A

De installatie mag verzwaaard worden naar: 40 A, 1-230V

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 37.1 MΩ RE: 13.87 Ω

OK OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22.5kA2s (3000A)	A	10	OK	OK
30	40		22.5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	32		2	6
5	C	20		2	2,5
4	C	16		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 9/6/2048
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.
Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bram Van Nuffel

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Bram Van Nuffel
BN

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 9/6/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

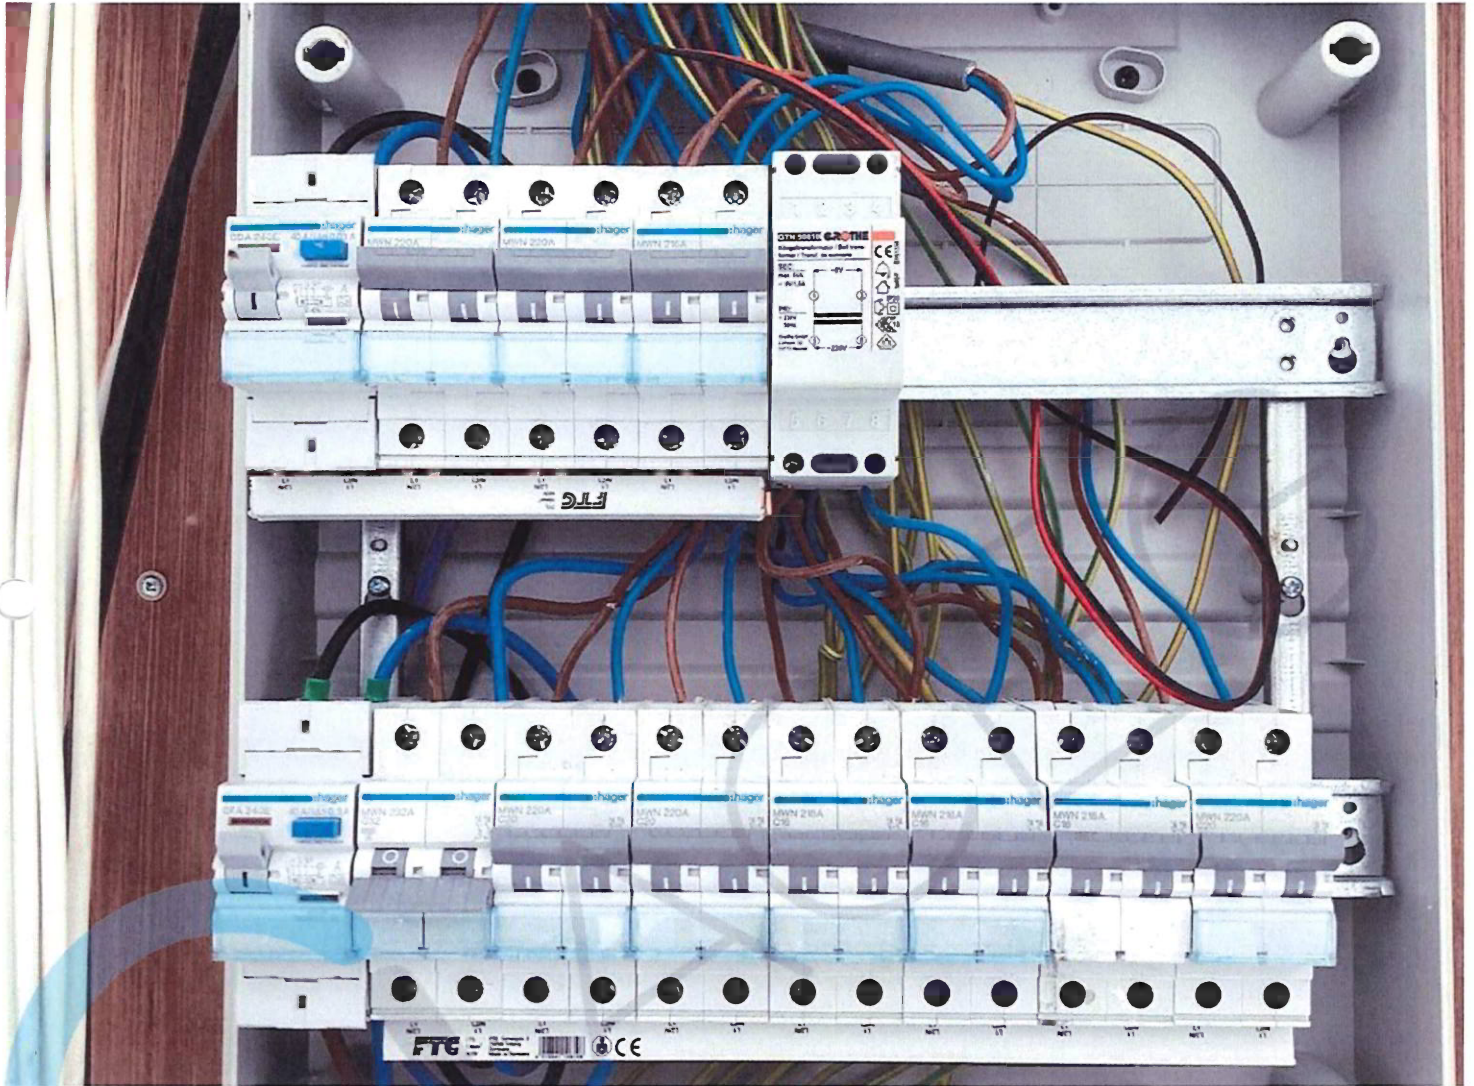







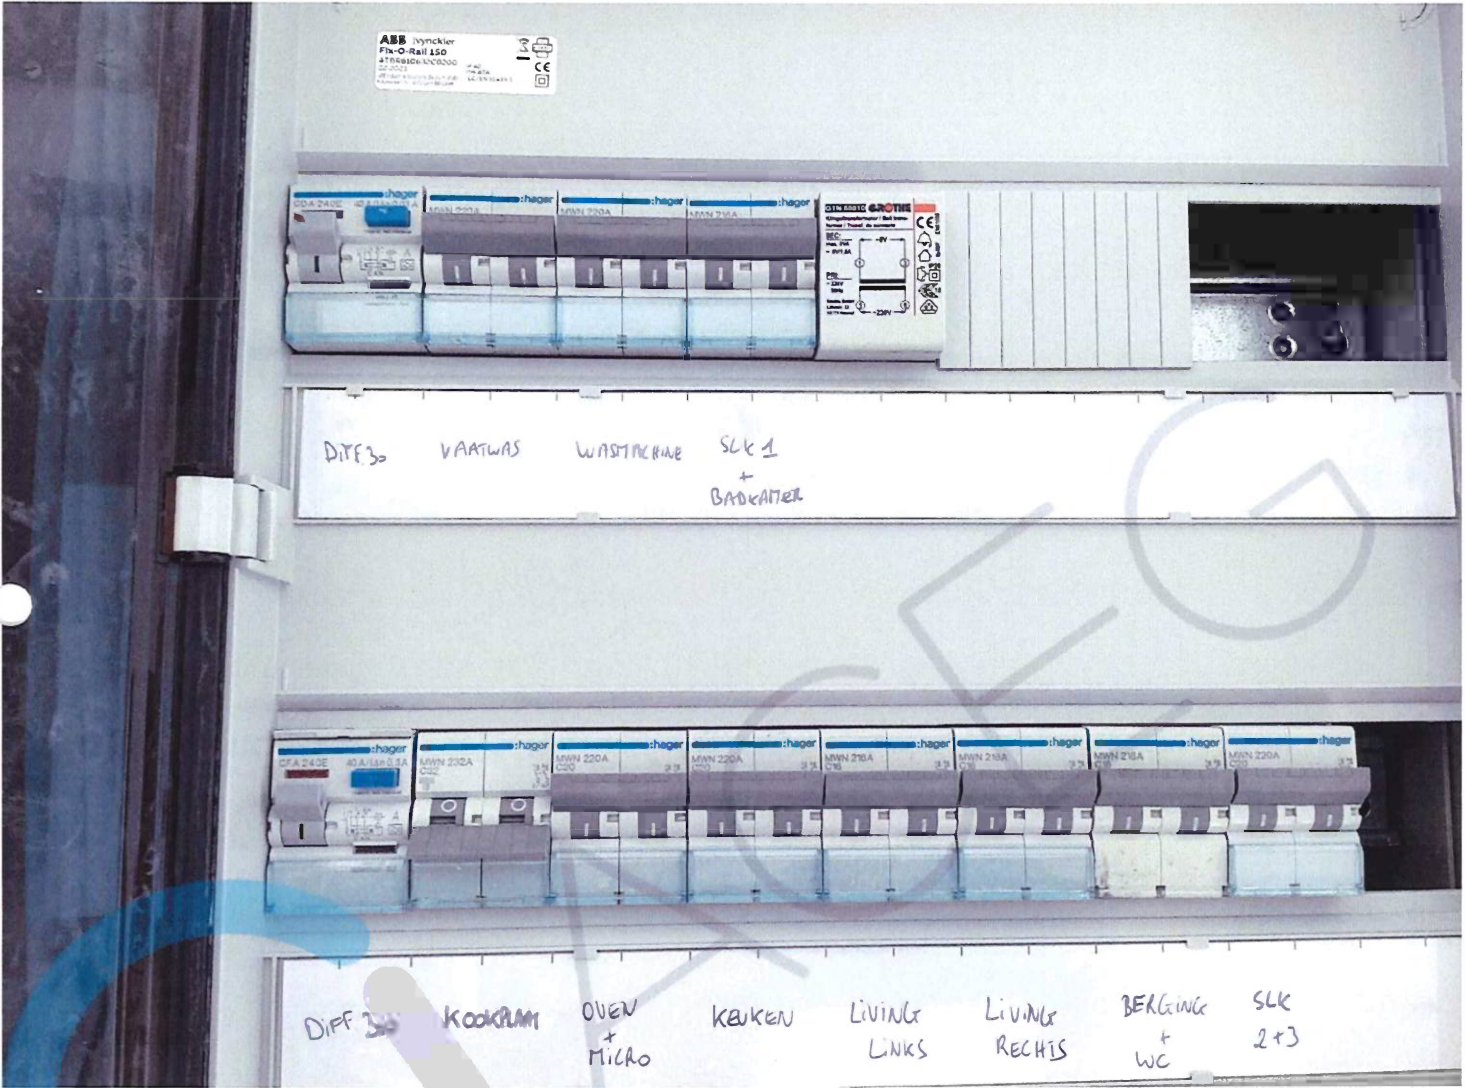


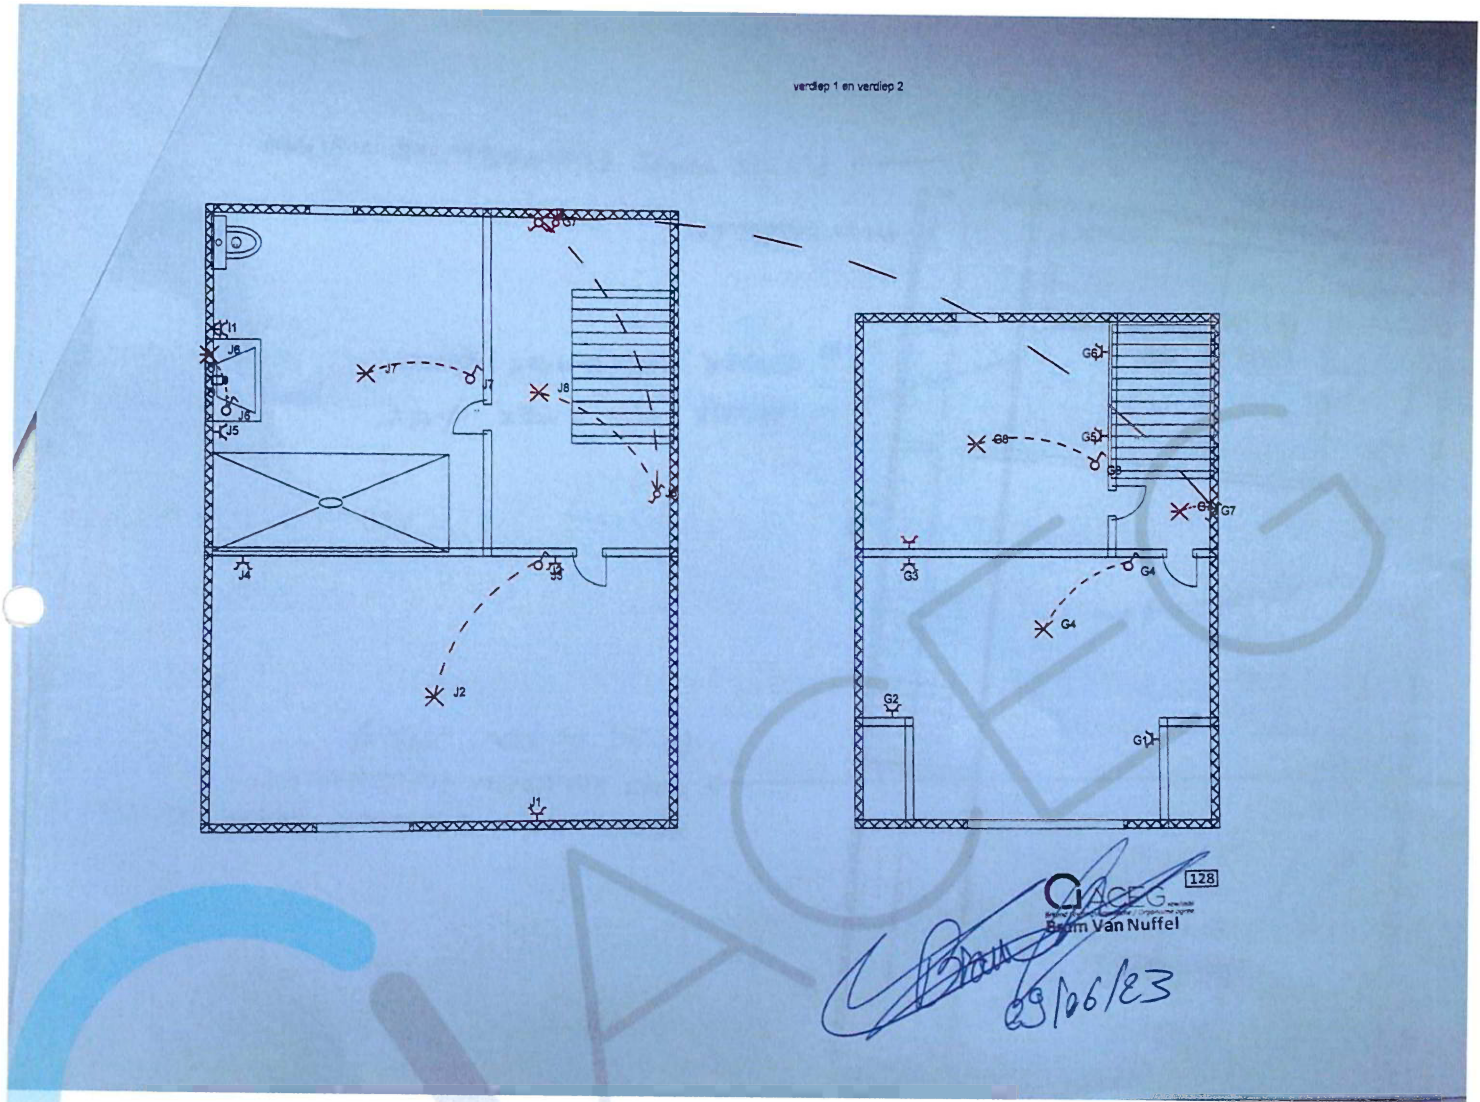




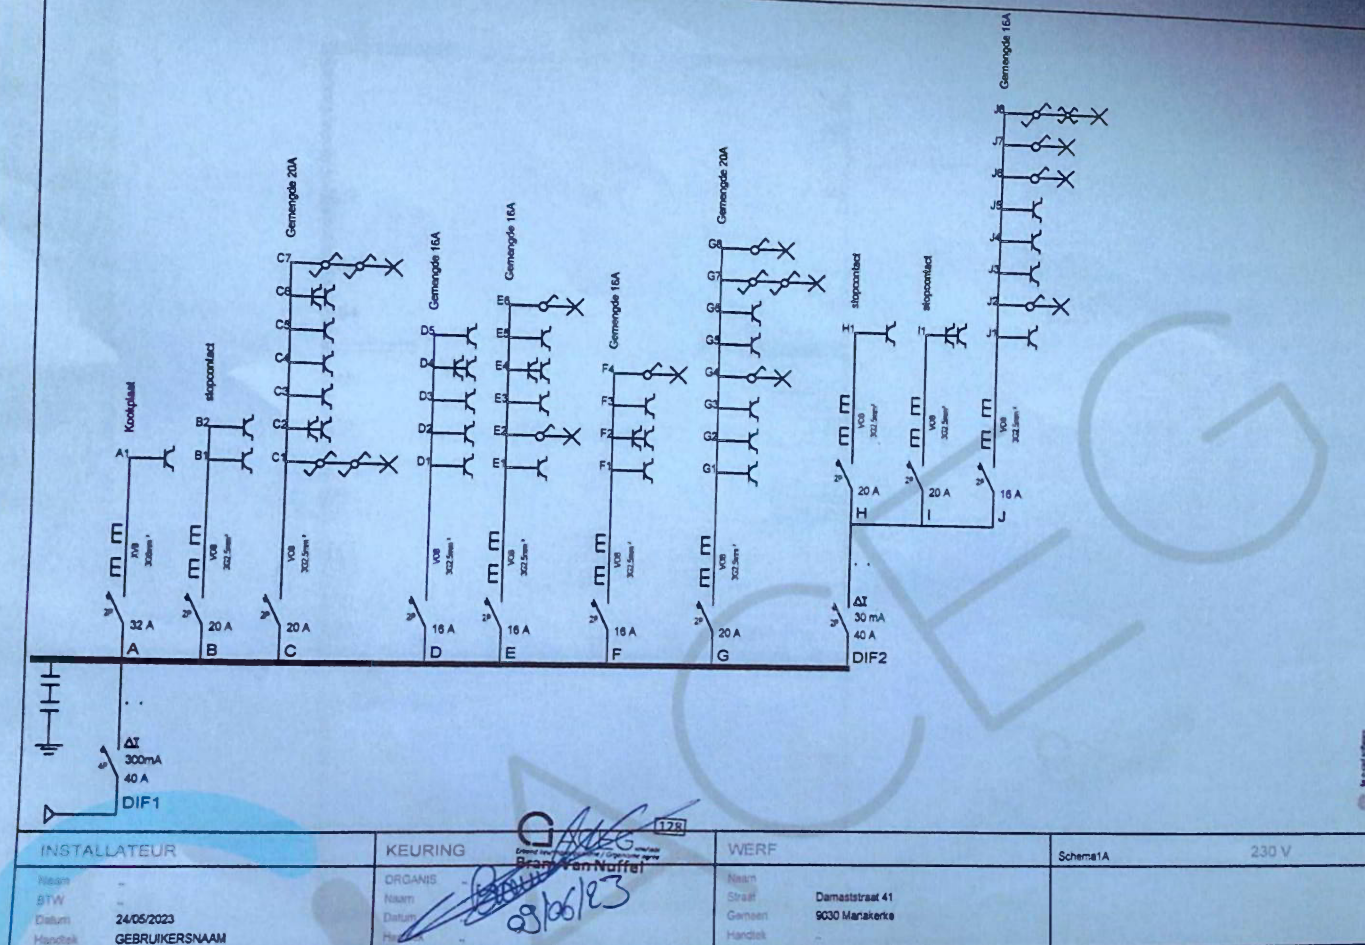






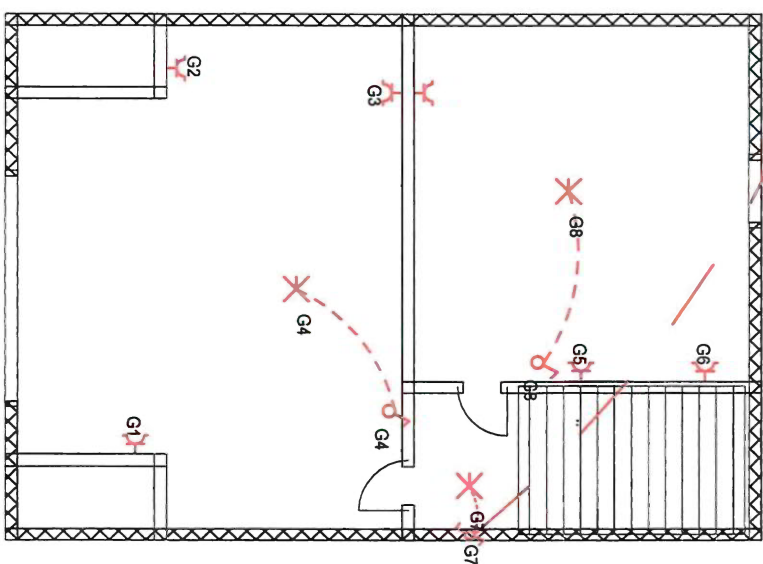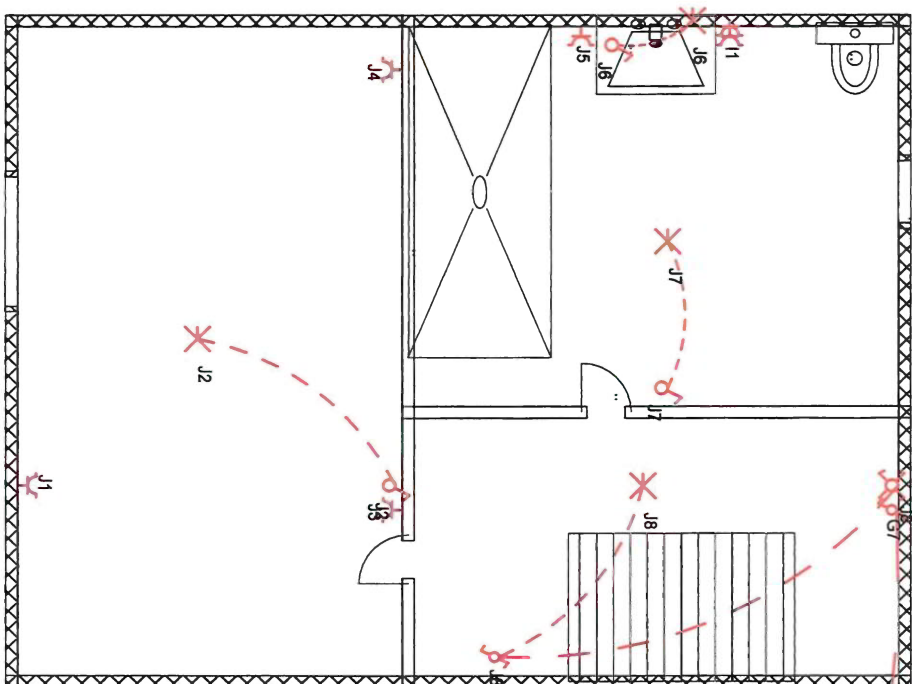

QACEG 128
 Erfend / Erfend / Erfend / Erfend / Erfend
 Ben van Nuffel

65/06/23

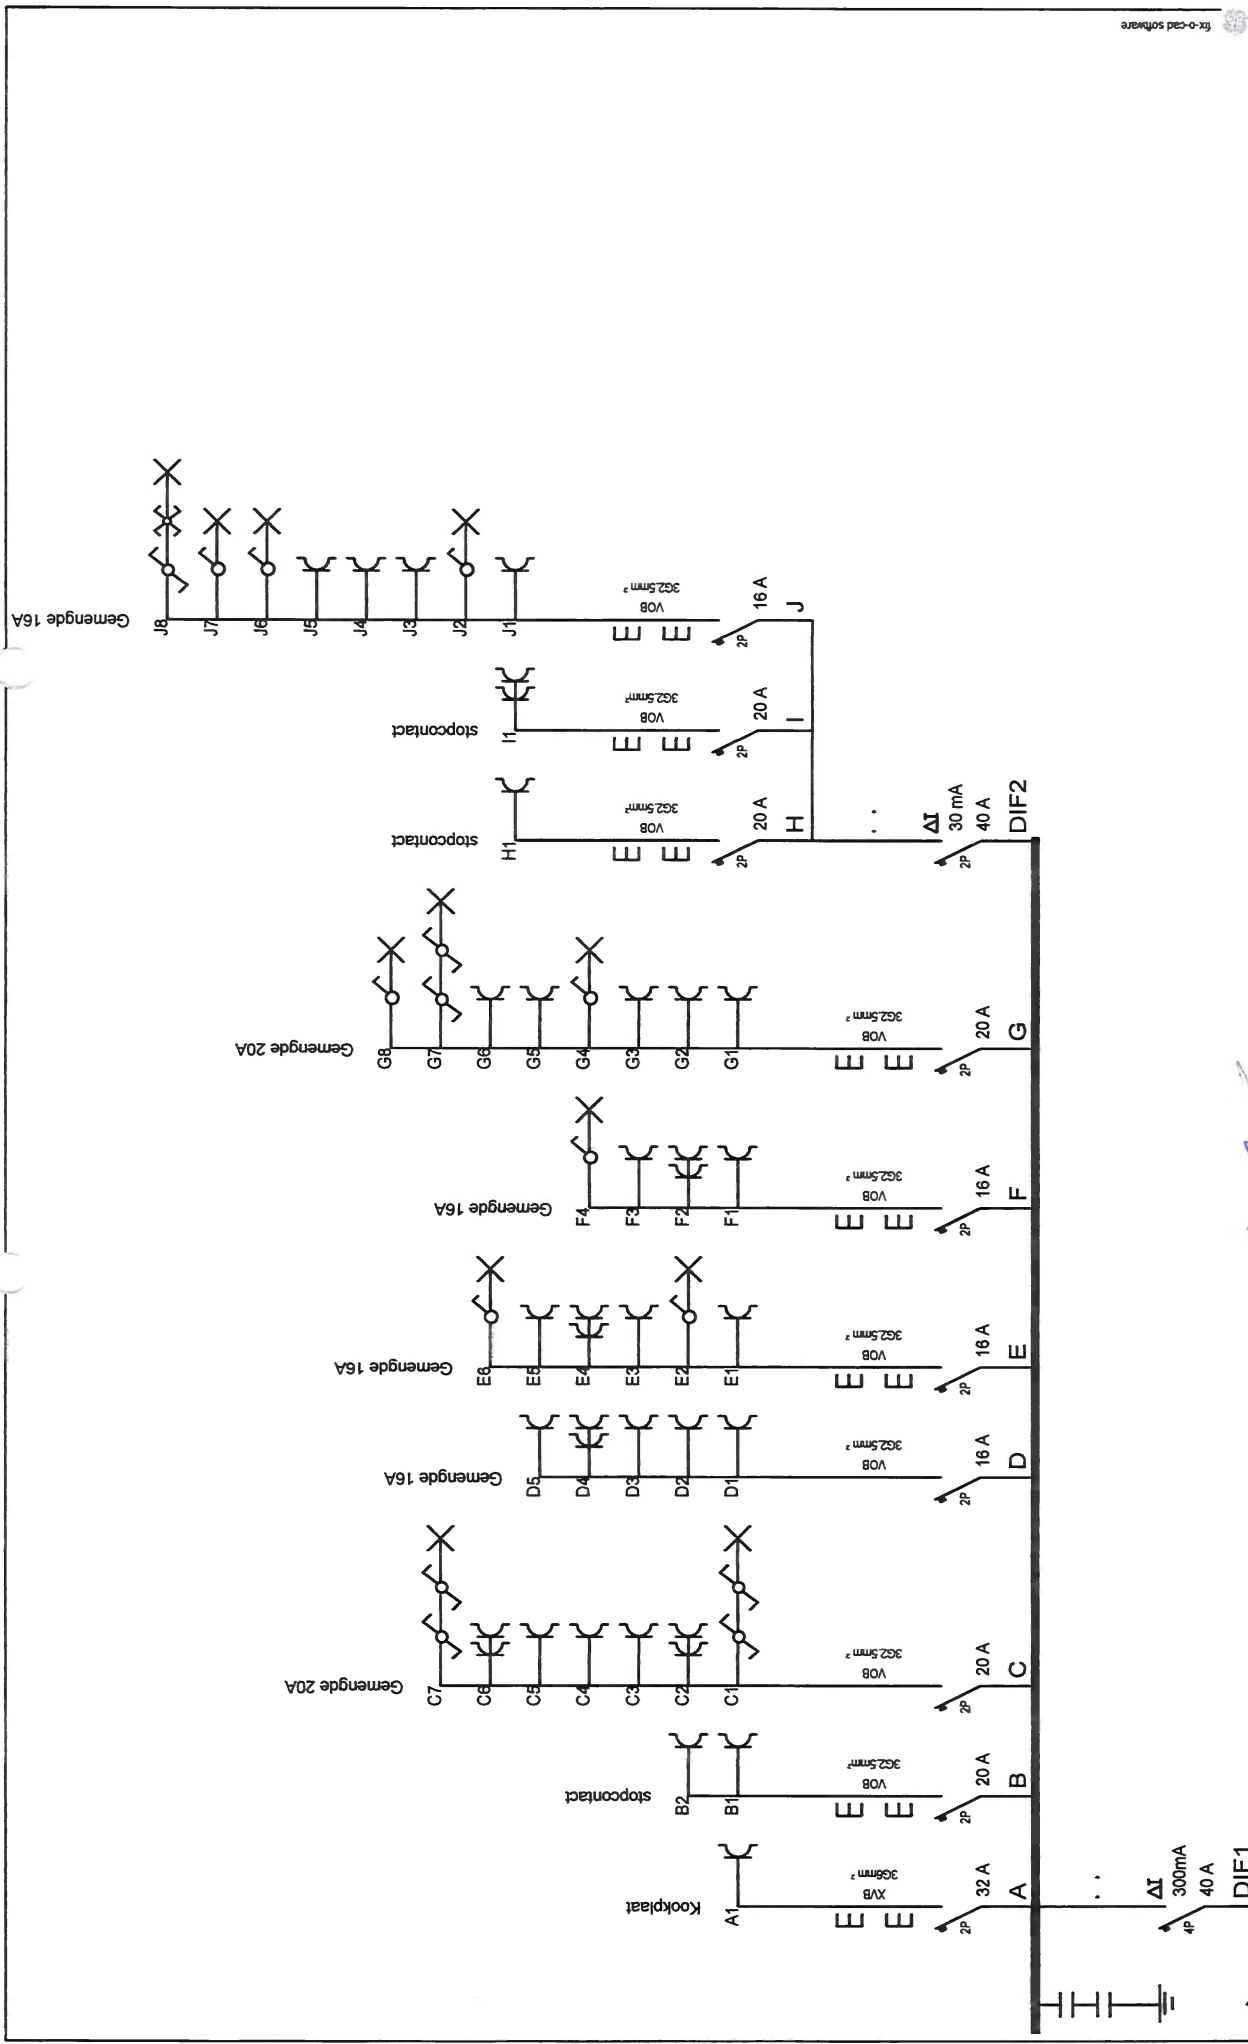

INSTALLATEUR		KEURING	WERF	Schema1A	230 V
Naam	..	ORGANIS.	Naam	Damaststraat 41 9030 Mariakerke	
BTW	..	Naam	Straat		
Datum	24/05/2023	Datum	Gemeente		
Handtekening	GEBRUIKERSNAAM	Handtekening	Handtekening		

1128
KEURING
Prat Van Nuffel
03/06/23
