

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 19/03/2026

Inspecteur: Arben Nuhiji

Mentor:

Installateur: AA BOUW

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:BE 0799 147 861

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT

Serienummer: 23120865

Datum verslag: 19/03/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Izegemsestraat
Huisnummer 1
Busnummer 002
Postcode 8800
Gemeente ROESELARE
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Izegemsestraat
Huisnummer 1
Busnummer
Postcode 8800
Gemeente ROESELARE
Land België

Installateur

Naam AA BOUW
BTW nr. BE 0799 147 861
Telefoonnummer +32 493 48 75 27
E-mail info@aabouw.be

Type : appartement

EAN : 541448820069505087

Teller Nr. : 1LGZ0515737066

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor Nee
01/06/2023?

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 16



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 4,72 MΩ

RE: 5,24 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	NVT	NVT
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	NVT	NVT

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's in bijlage	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N16 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieelschakelaars kon niet getest worden.

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 19/3/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 13:30 tot 13:55

De inspecteur Arben Nuhiji



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 19/3/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.






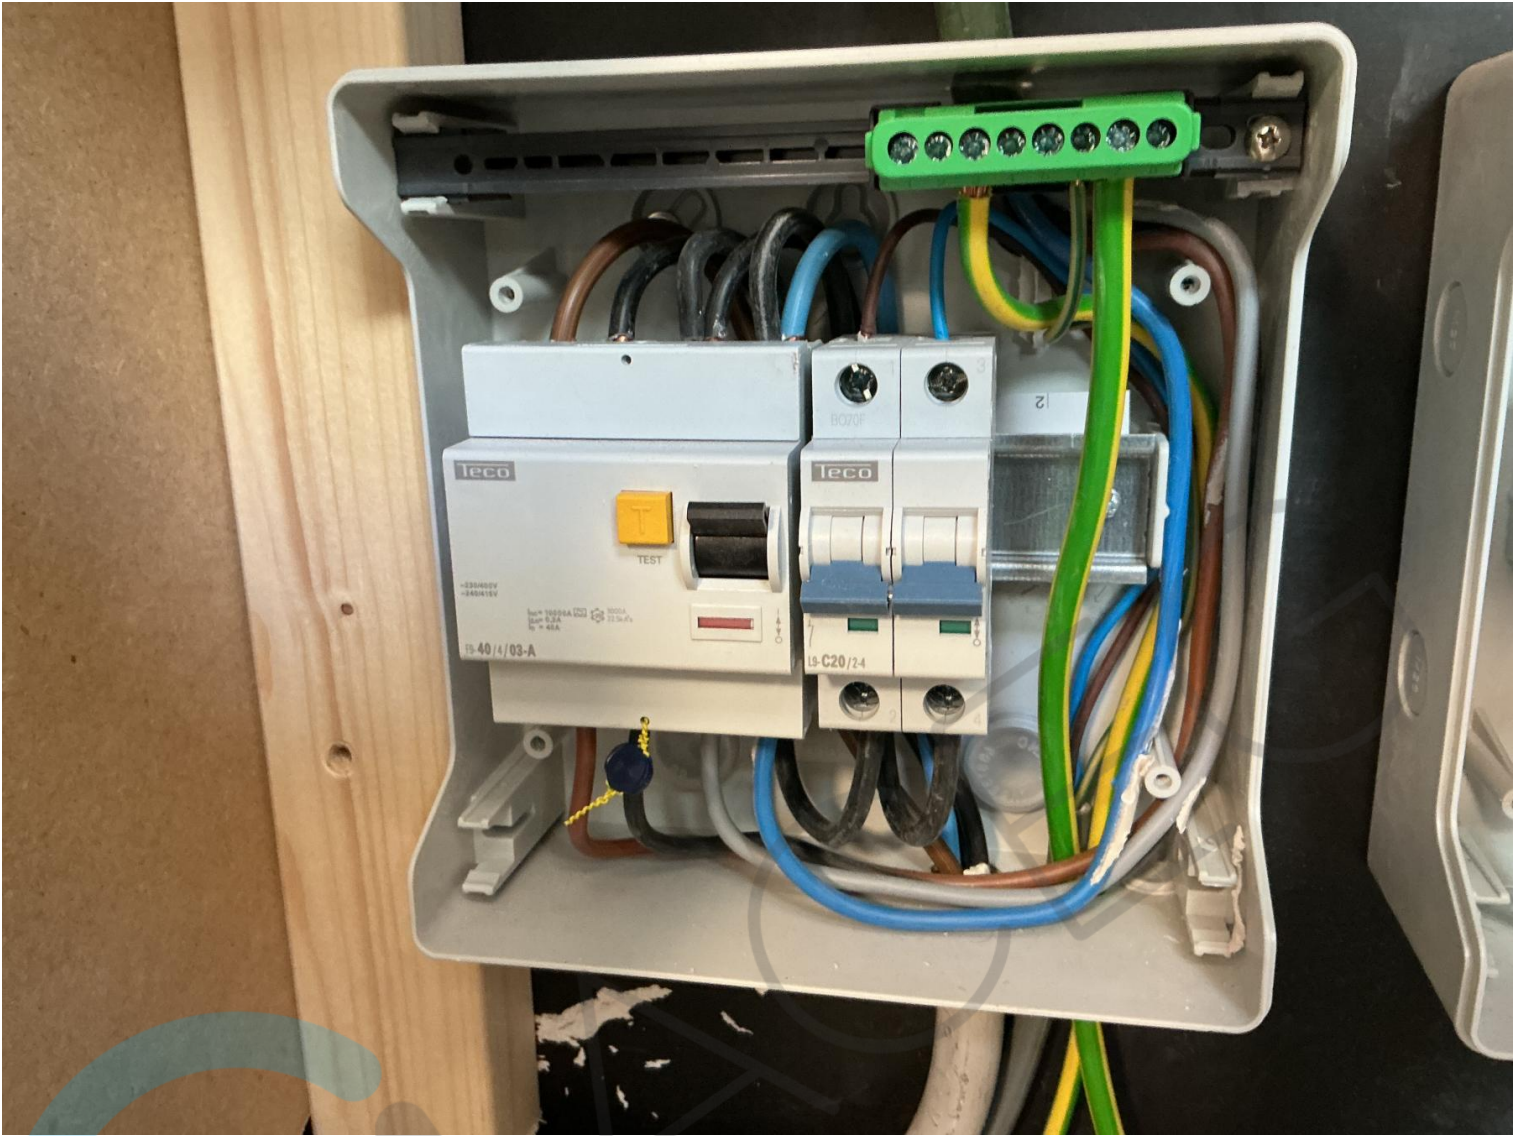


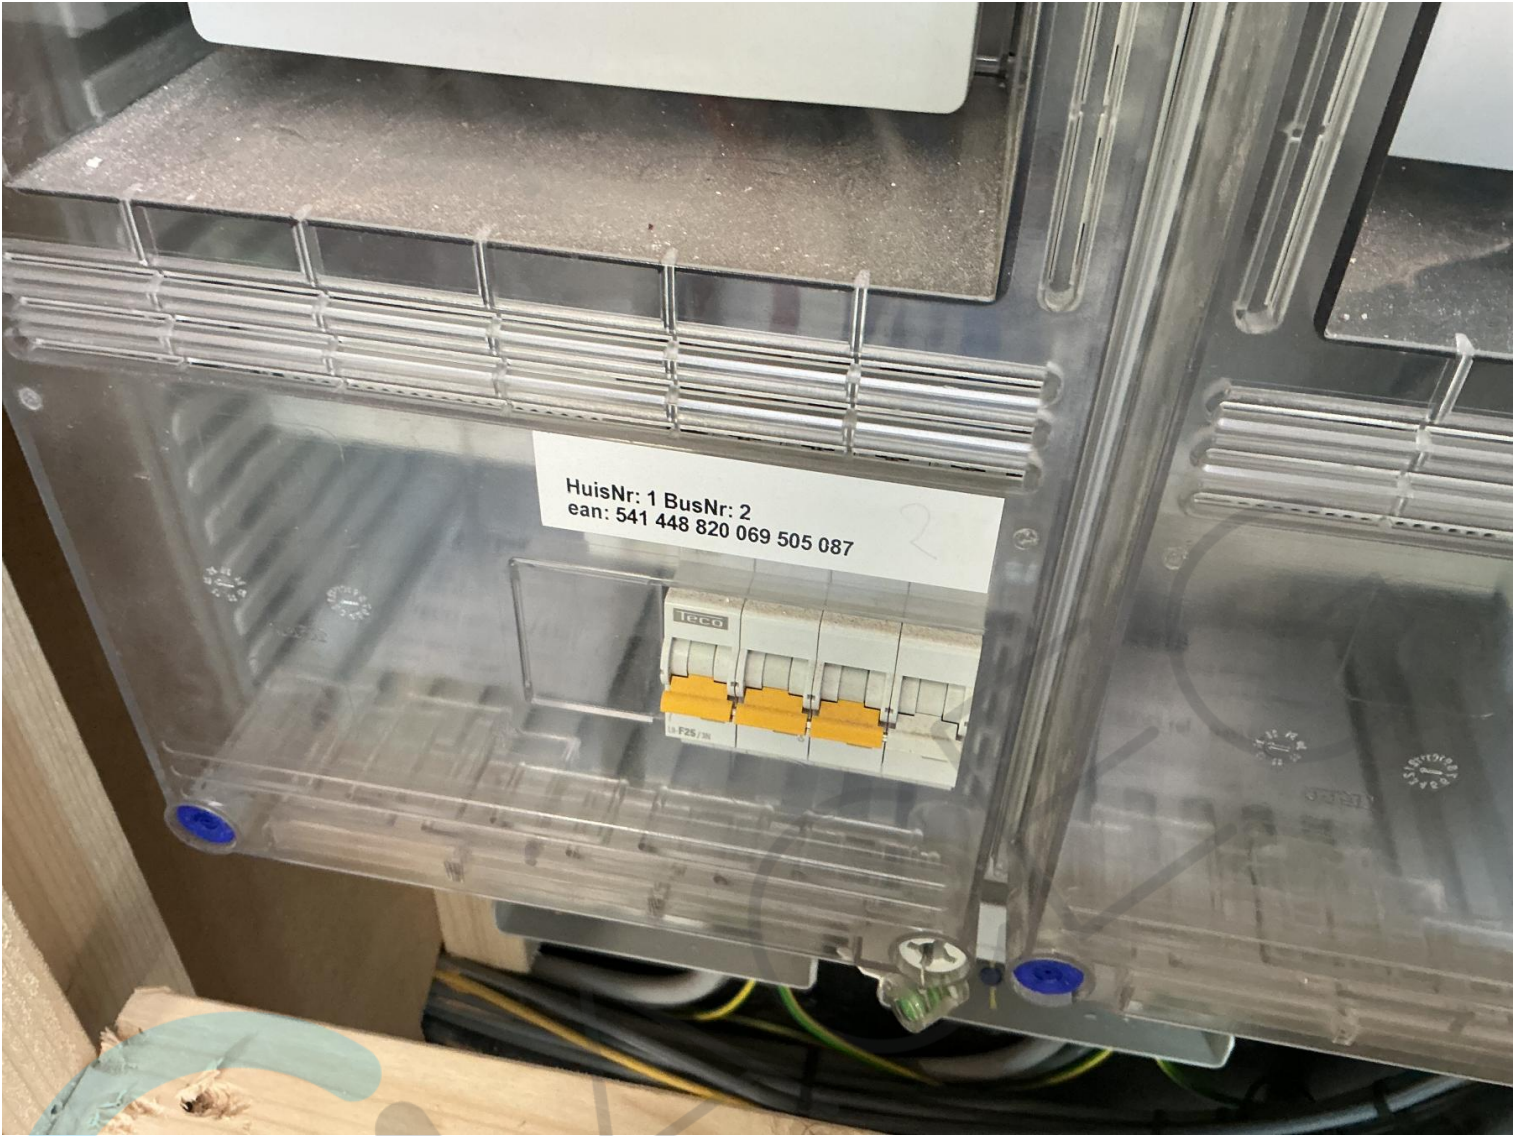



Schema's getekend door: SCG-Electricity - RTW RF 0759 913 341

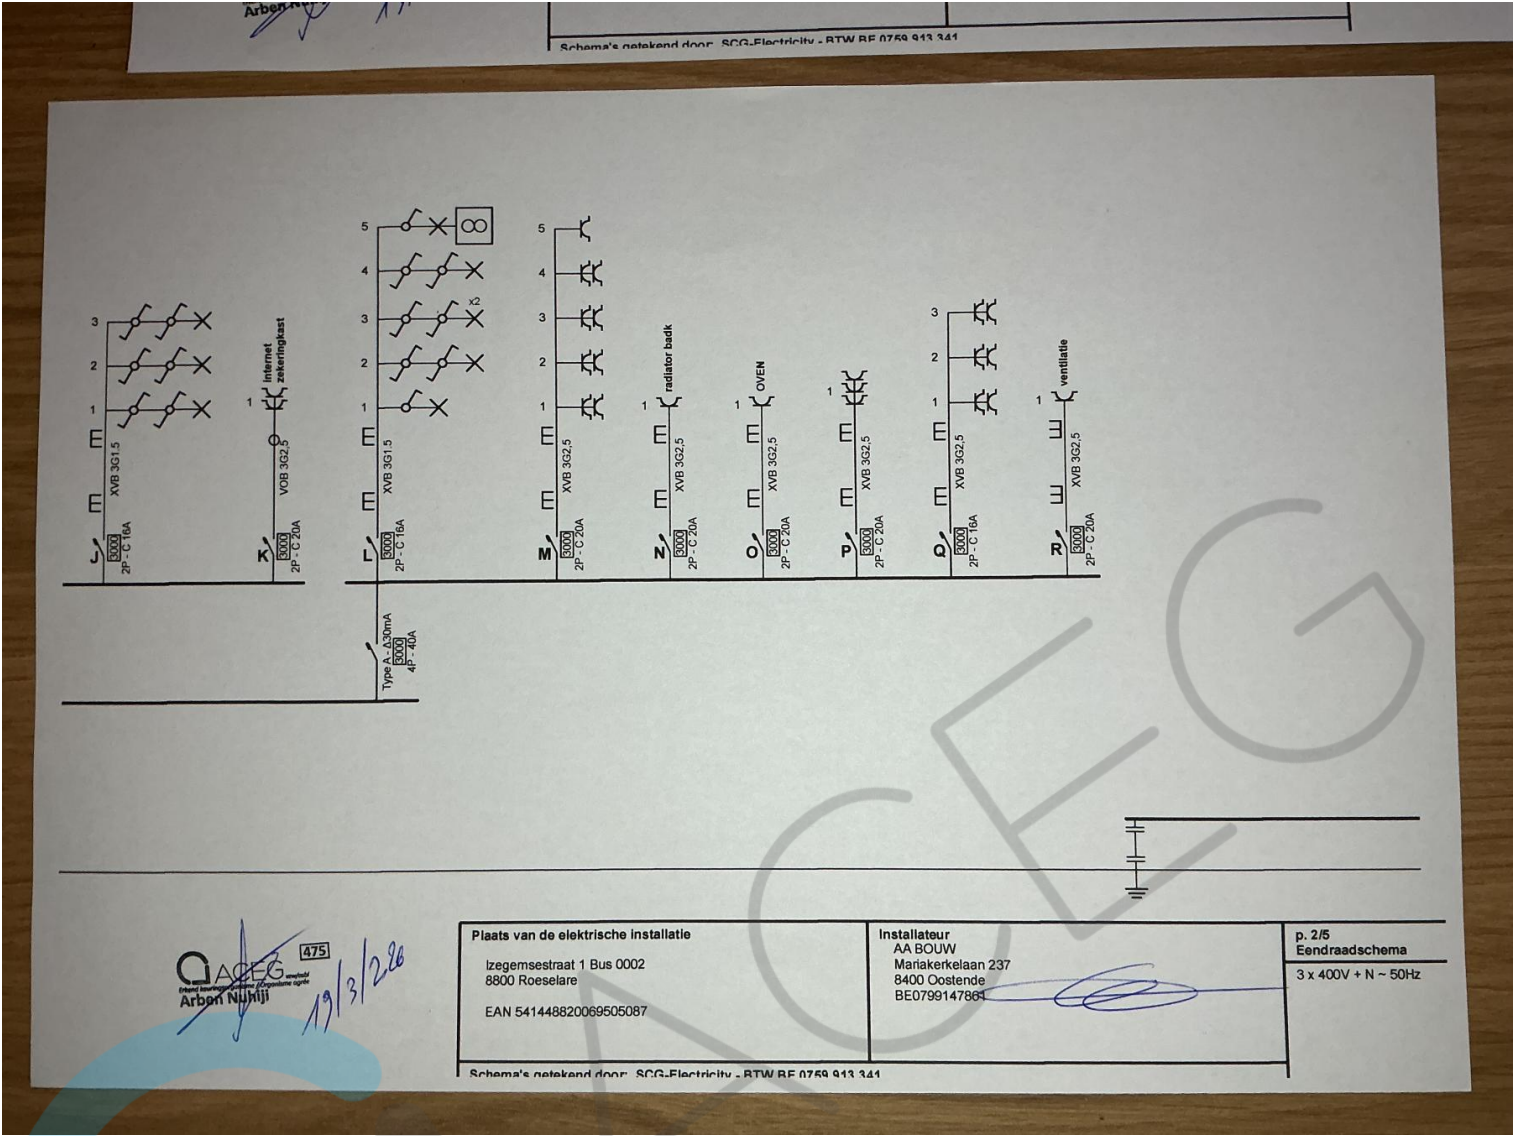



CLACEG
Arben Nuhij
19/13/2026

Plaats van de elektrische installatie Izegemsestraat 1 Bus 0002 8800 Roeselare EAN 541448820069505087	Installateur AA BOUW Mariakerkelaan 237 8400 Oostende BE0799147861	p. 3/5 Eendraadschema 3 x 400V + N ~ 50Hz
---	---	---

Schema's getekend door: SCG-Electricity - RTW RF 0759 913 341

