



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR WV 1.15.14 NO.
ADRES INSTALLATIE: Ant. WERFSESTEENWEG 269
P.S.T.O. KATZEL
EIGENAAR :
Adres :
OPDRACHTGEVER : P.B. DOMTICS BVBA
Adres :
INSTALLATEUR : BEERTEN
Adres :
BTW of IK :

DISTRIBUTIEBEHEERDER :
Meter nr. : 809928
Index : Dag 184.10.8 KWh ; Nacht : --- KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 13/3/2015 ; Aanvulling van verslag nr. --- ; Type der lokalen: Werkruimte
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwarend - Renovatie. Delen
Begin werken : Fundering voor na 1.10.81 ; Installatie vóór na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 -87 -
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: RA 4 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 4A/30mA
Netaftakkabel (type & sectie): EKV3 EK10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 2x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - rennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem TT - TN - IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 5 ; Spreidingsweerstand : 26,8 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 750 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 4A/30 mA VERBODEN A1 -> A5

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 en de technische procedure(s) TPR E12
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode: ja neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: GEEN

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: VERTREK APPARTEMENT GEVL Behaart met tot deze datum


VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.


De algemene automatische differentieelstroominrichting - was --- werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/3/2014
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie voldoet voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER naam + handtekening
[Handtekening]

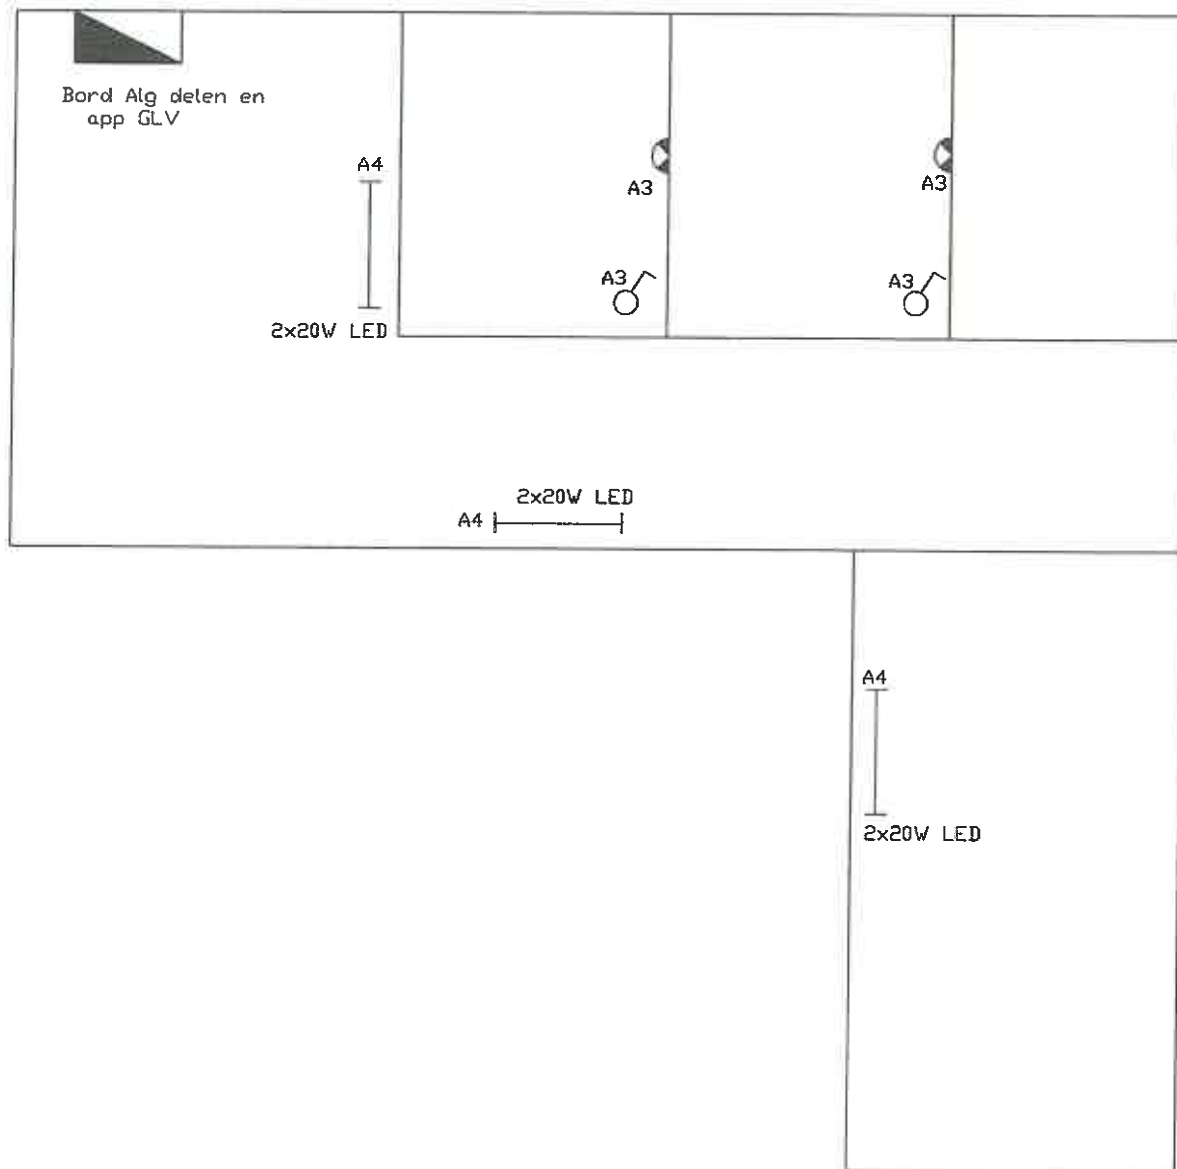

Verlichting en drukknoppen trap hal GLV / 1eV / 2eV op automaat A4

[Handwritten signatures]

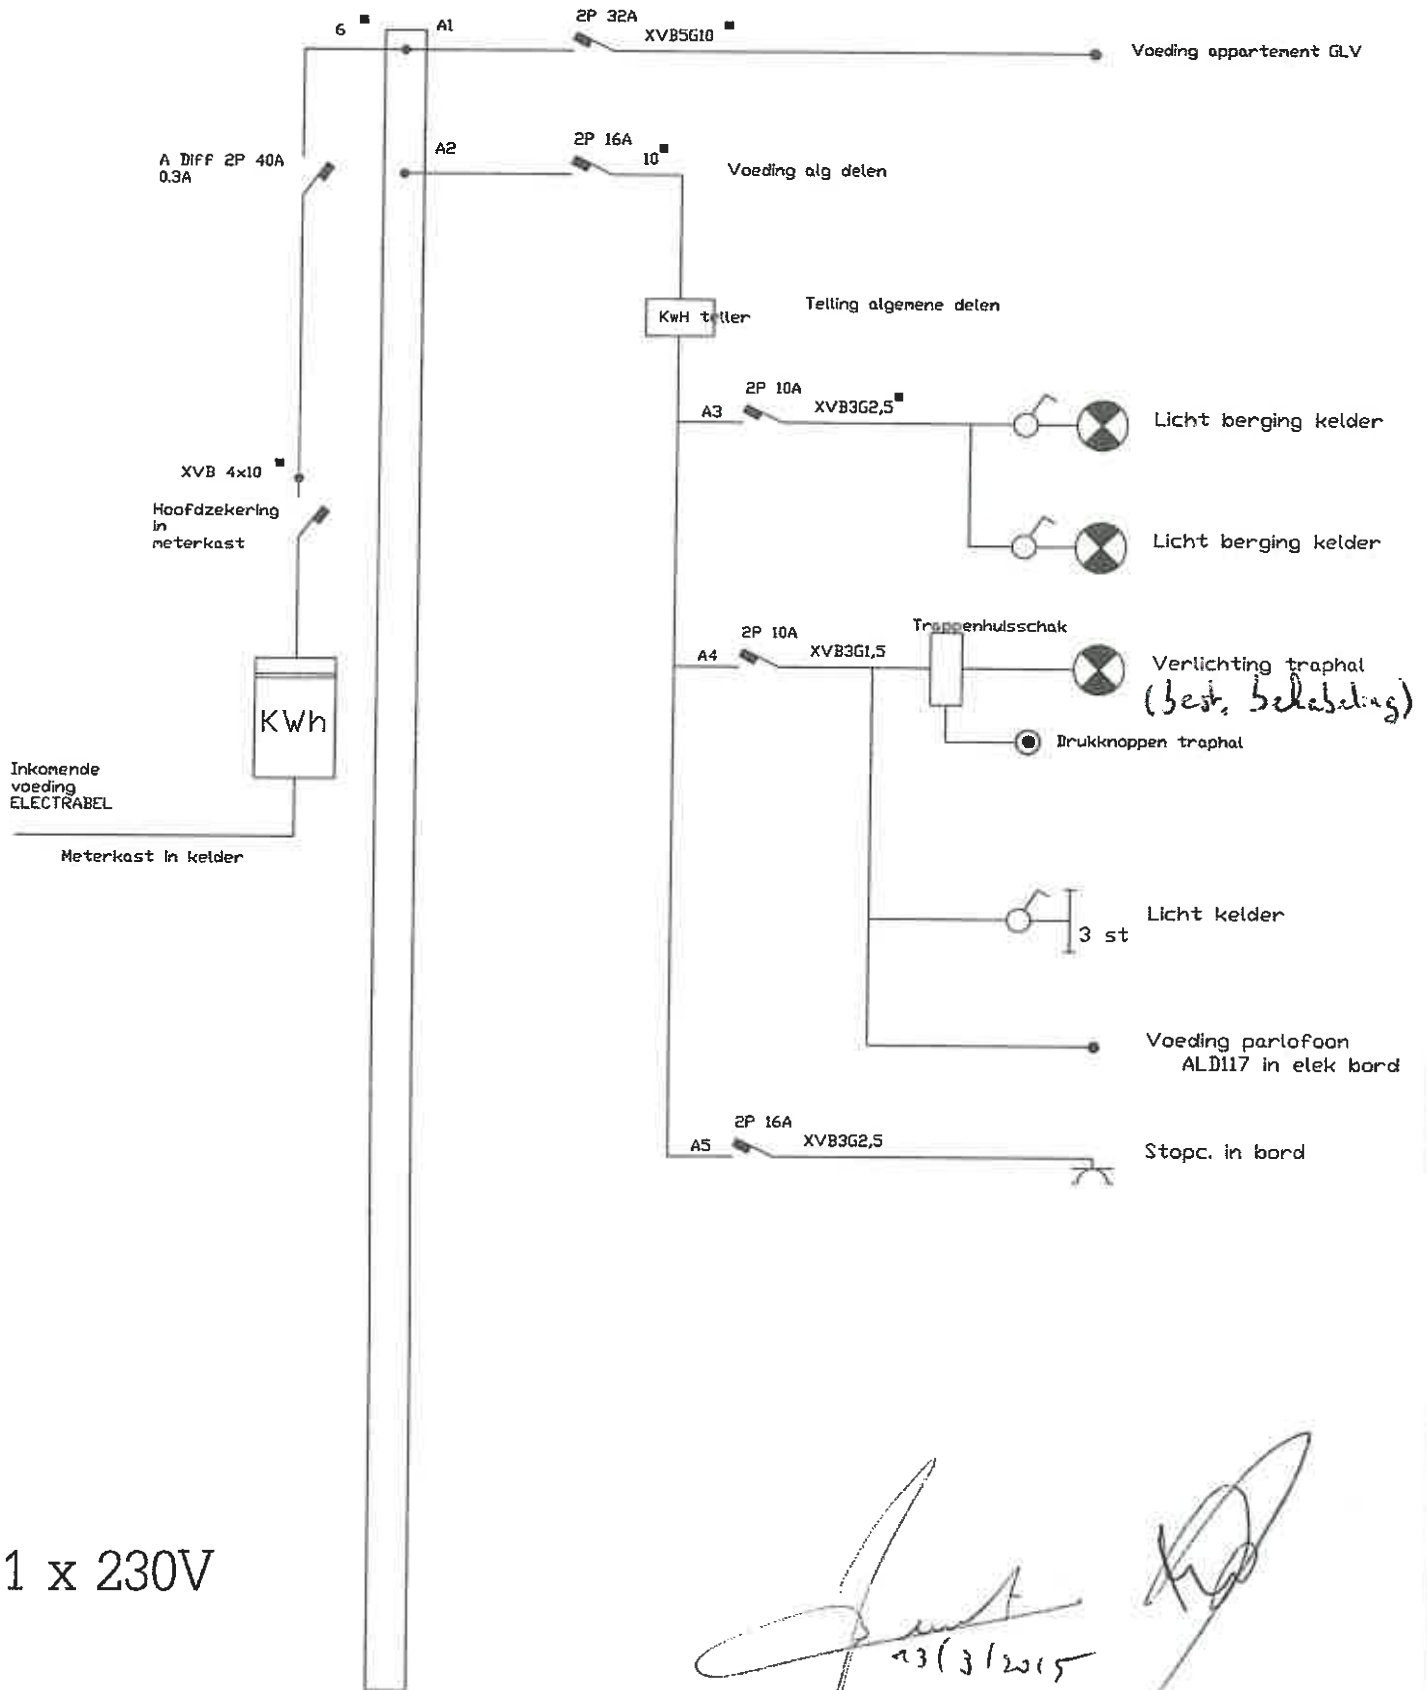

1 x 230V

[Handwritten signature]
 23/3/2015
[Handwritten signature]

APPARTEMENTSGEBOUW
 KELDER / ALG DELEN
 elektriciteit

www.pbdomotics.be
 info@pbdomotics.be

Houwstraat 155
 B - 2580 Beerzel

pbdomotics
 ELEKTRO | HOME AUTOMATISCH | SECURITY

ANTWERPSESTWEG 264 / 2950 KAPellen

GSM +32 491 156 157

BE0553.958.288
