

ATECON vzw
 Britselei 94 – bus 31
 2000 Antwerpen
 Tel: 03/770 75 14
 www.atecon.be / info@atecon.be



ATECON

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens :

Verslag N°: 201871 Datum onderzoek: 12/03/2017
 Agent-bezoeker: Paternoster Michaël Procedure: TP-E-01
 Controle volgens AREI. art.: 86, 270, 276 Keuring N°: 200418
 Type keuring: Indienststelling / Periodiek

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Karterstraat 15 - app 5 , 3070 Kortenberg
 Distributienetbeheerder: Iverlek (via Eandis)
 Teller n°: 42856560
 Index teller: Dag: 31688,00 Nacht:
 EAN-code:
 Naam opdrachtgever: WOJ-TECH Adres opdrachtgever: AVENUE GUILLAUME MELCKMANS 40, 1070 ANDERLECHT
 Naam eigenaar: Rosie Cesar Adres eigenaar: Oude Brugstraat 14, 3650 Dilsen
 Installateur: Woj-Tech sprl
 TW-n° of ID:
 Type lokaal: Appartement (Nummer appartement : 5)

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 3 x 230V Max. beveiliging: 3 x 40 A Meter - bord verbinding: VOB 3 x 10 mm²
 Type electrode: Piket # verdeelborden: 2 # eindstroombanen: 10

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Icu:	Test:	x2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	4	A	3000 A	OK	OK

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 10	A' ; A - I	1,5mm ² , 2,5mm ² , 4mm ²
Algemeen VB app # 9	A - I	2,5mm ² , 4mm ²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ua:	11,00 Ohm	Alg. isolatieweerstand:	999,00 MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK	Indirecte aanraking:	OK	Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK	Equipotentiale verbindingen:	OK	Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's):

Zie bijlage

Besluit:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 12/03/2042 (art. 271). De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

Voor de directeur, de agent-bezoeker

Paternoster Michaël



ATECON vzw
 Britselei 94 Bus 31
 2000 Antwerpen
 Tel: 03/770 75 14
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :


- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

3070 KORTERBERG

KARTESTR. AAT 15 I d.

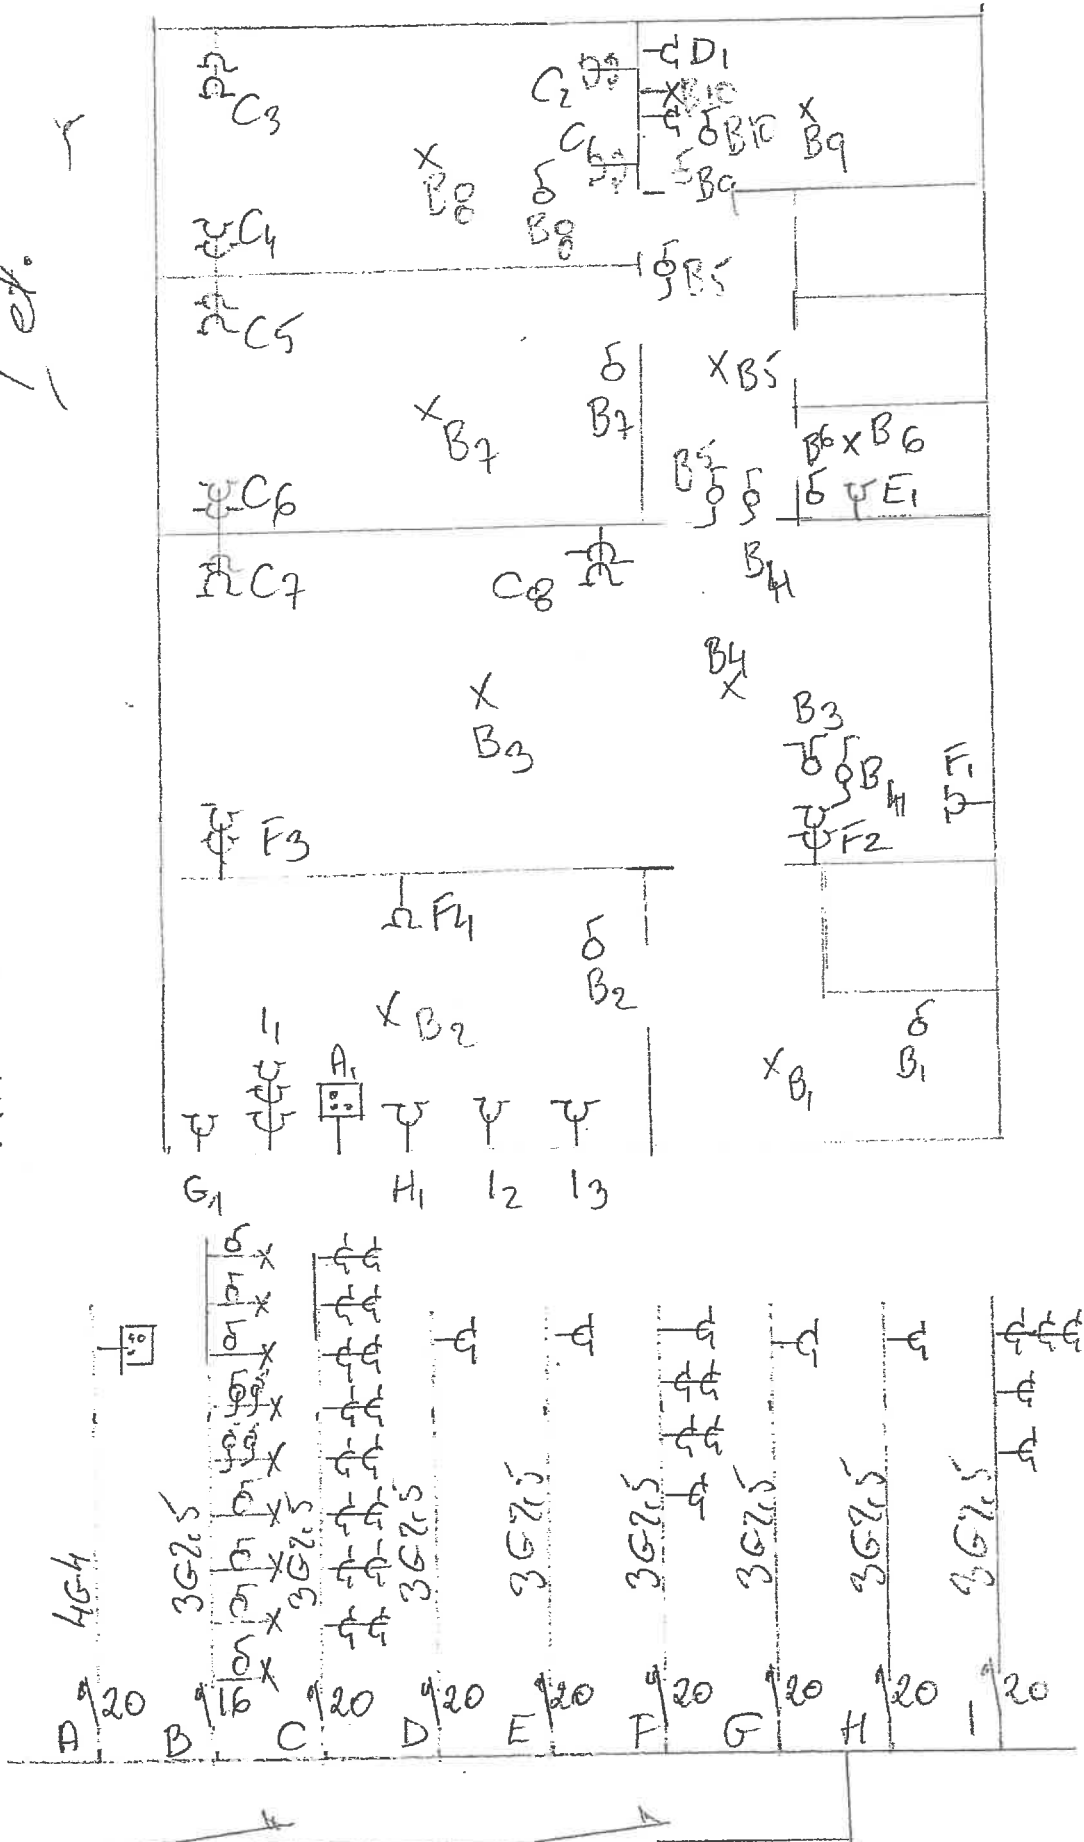

$\Delta-40A/300mA$

$\Delta-40/30mA$
