

ATECON vzw
 Britselei 94 - bus 31
 2000 Antwerpen
 Tel: 03/770 75 14
 www.atecon.be / info@atecon.be



ATECON



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°: 402877
 Inspecteur: Jan Cordens
 Controle volgens AREI. art.: 86, 270, 271
 Type keuring: Indienstelling / Periodiek

Datum verslag: 19/04/2019
 Datum keuring: 17/04/2019
 Keuring N°: 20190702
 Aanwezigen: eigenaar

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Schoonbeekstraat 23, 3740 BILZEN
 Distributienetbeheerder: Inter-energa (via Infrax)

Teller n°:

Index teller: Dag: Nacht:

EAN-code:

Naam opdrachtgever: JOHNNY VANSPAUWEN

Adres opdrachtgever: Molenstraat 39, 3740 BILZEN

Naam eigenaar: Vanspauwen johnny

Adres eigenaar: Schoonbeekstraat 23 bus 1 bilzen

Installateur: Electriciteit Hex Marc

BTW-n° of ID: 0568.734.952

Type lokaal: Woning (Nummer appartement : bus 1)

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 1 x 400V + N (230V)

Max. beveiliging: 2 x 40 A

Meter - bord verbinding: VVB 4 x 10 mm²

Type electrode: Piket

verdeelborden: 1

eindstroombanen: 13

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	2	A	3000 A	OK	OK

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:

Bescherming:

Sectie:

Algemeen # 13

A-M

1,5mm², 2,5mm², 6mm²

Bijkomend # 13

A-M

1,5mm², 2,5mm², 6mm²

0

0

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	26,70	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	0,77	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 19/04/2044 (art. 271).
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

De inspecteur,
 Jan Cordens



ATECON vzw
 Britselei 94 Bus 31
 2000 Antwerpen
 BTW-BE 0408 677 925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 - bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**ATECON**

N°618-INSP

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd. ☐
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend. ☐
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

ATECON vzw
Britselei 94 - bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be


**ATECON**

N°618-INSP

Algemene gegevens :

Verslag N°: 402877
Inspecteur: Jan Cordens
Controle volgens AREI. art.: 86, 270, 271
Type keuring: Indienststelling / Periodiek

Datum keuring: 17/04/2019
Keuring N°: 20190702
Aanwezigen: eigenaar

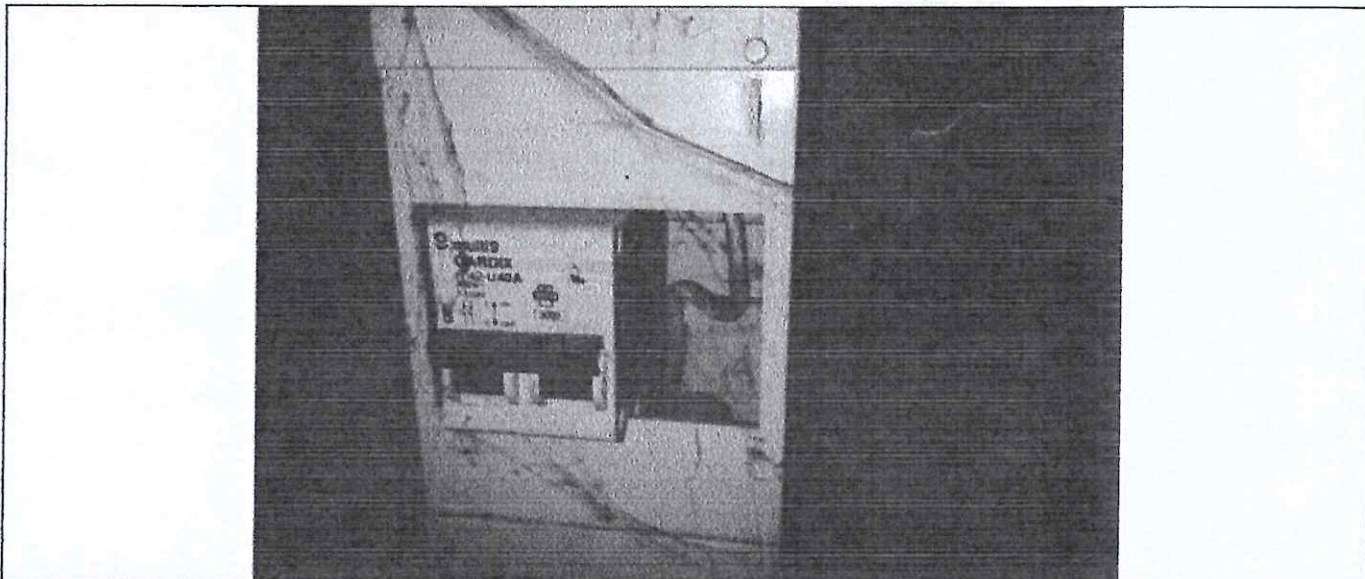SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:

ATECON vzw
Britselei 94 - bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be


**ATECON**

N°618-INSP

Algemene gegevens :



Verslag N°: 402877
Inspecteur: Jan Cordens
Controle volgens AREI. art.: 86, 270, 271
Type keuring: Indienststelling / Periodiek

Datum keuring: 17/04/2019
Keuring N°: 20190702
Aanwezigen: eigenaar

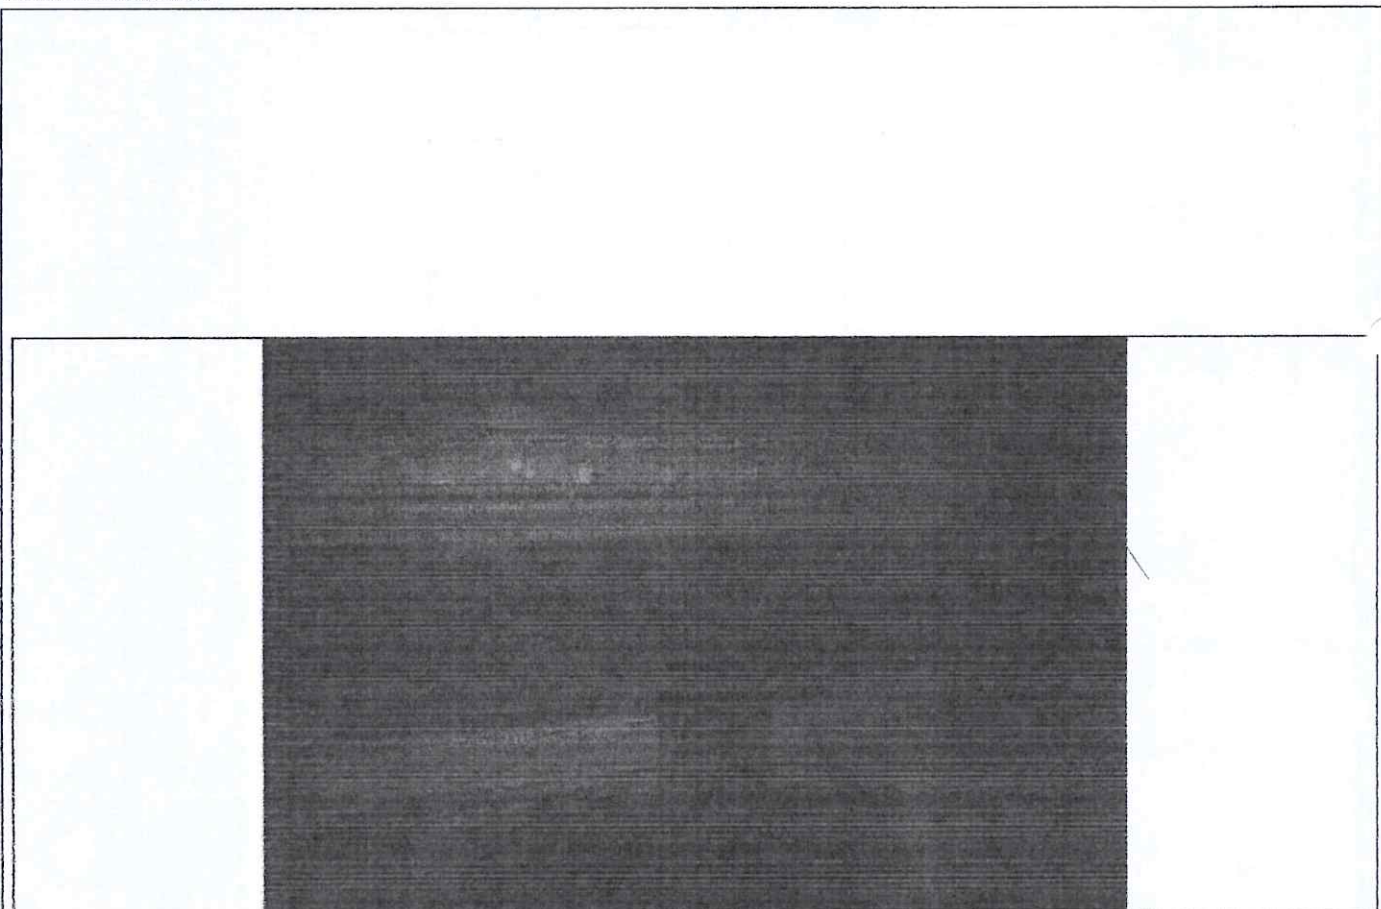SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:

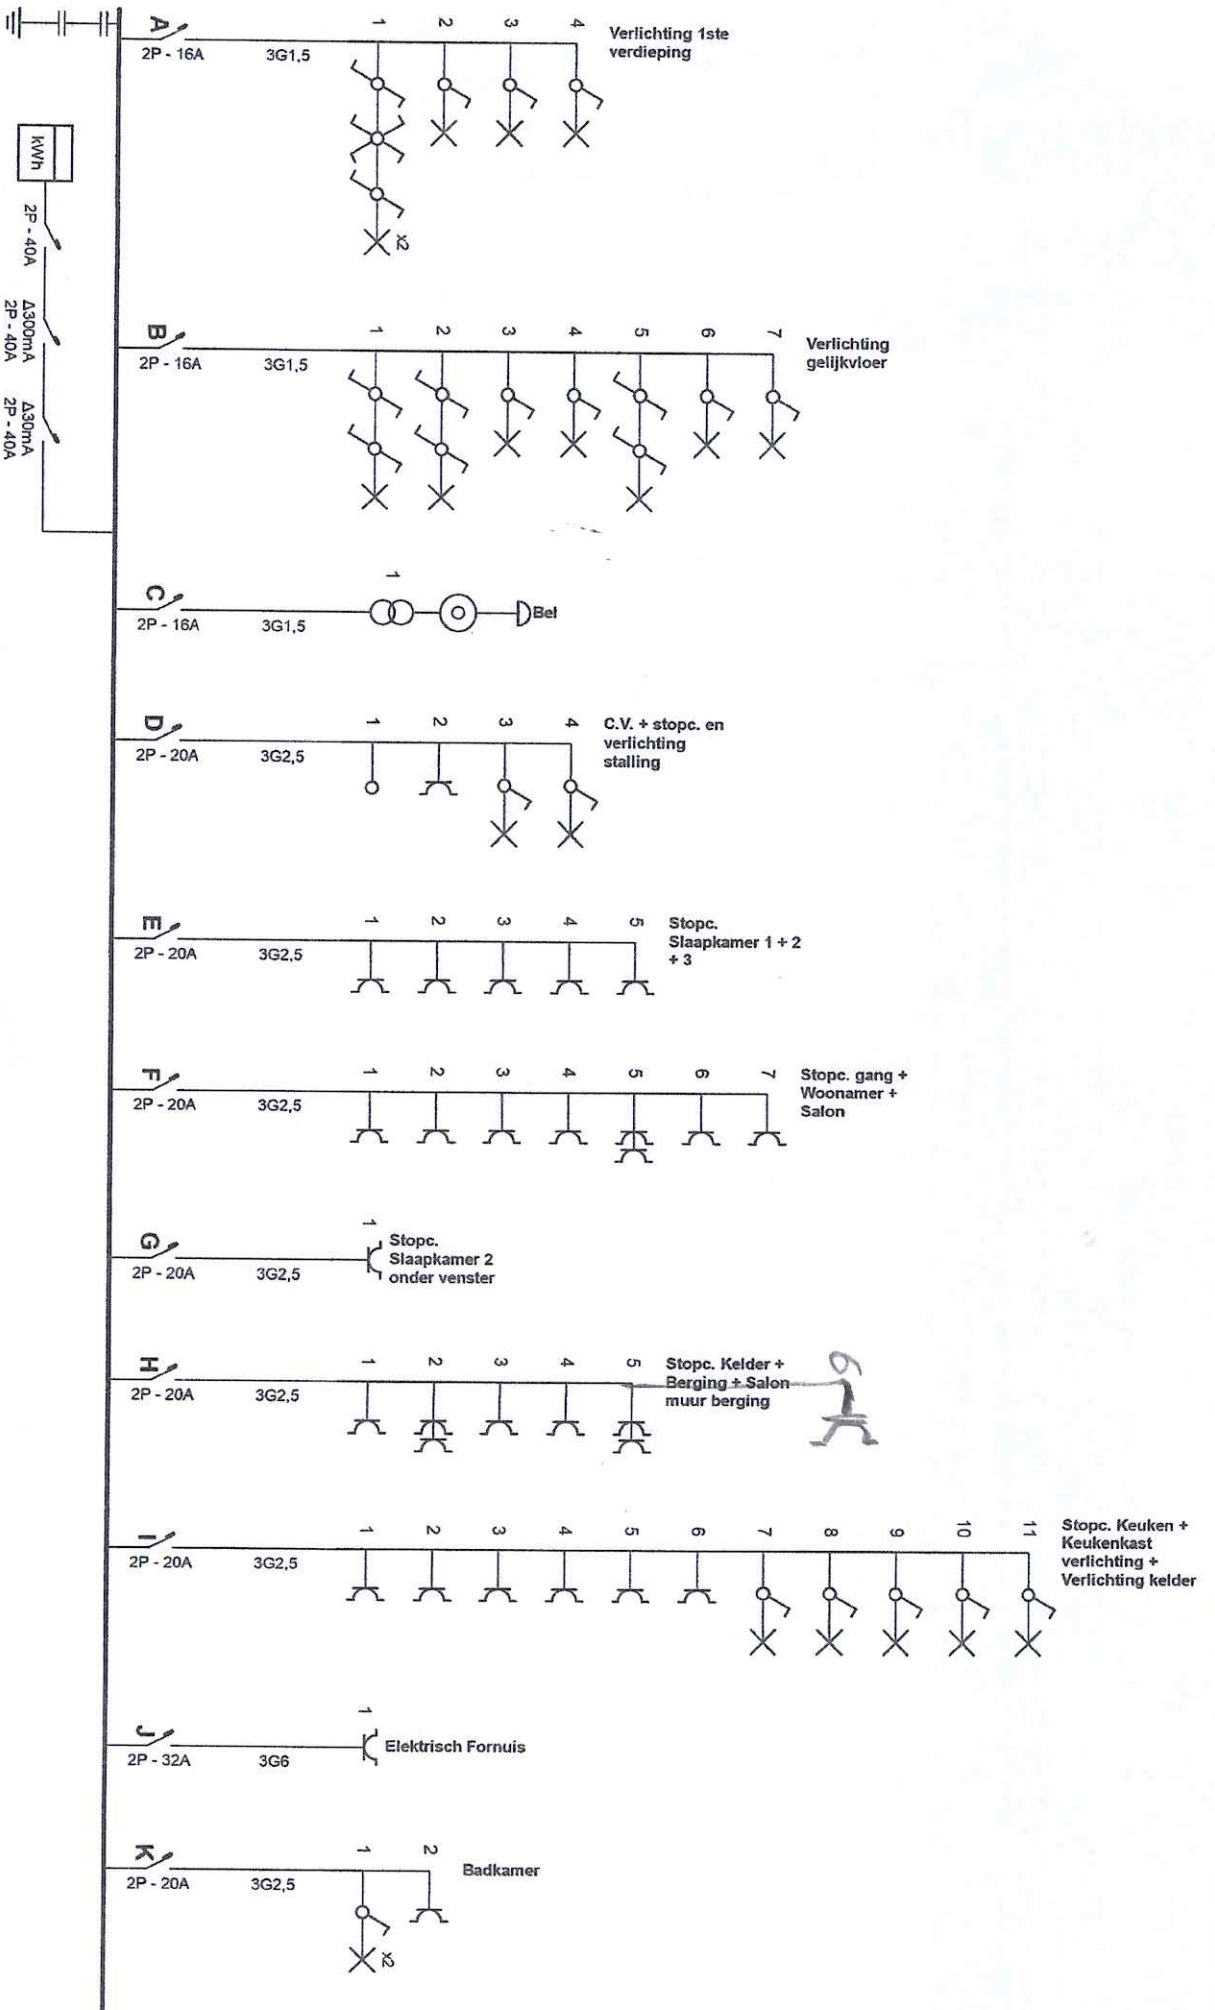

Plaats van de elektrische installatie

Vanspauwen Johnny
Schoonbeekstraat 23 Bus 1
3740 Bilzen
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


Electriciteitswerken Marc Hex
Jonkhedenbos 84
3740 Bilzen
Tel.: - GSM: 0496/243045
Fax: -
e-mail: marc.hex@telenet.be
BE 0568 734.952



P. 1/6
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Schemas gevraagd door:




Handwritten signature

Plaats van de elektrische installatie Vanspauwen Johnny Schoonbeekstraat 23 Bus 1 3740 Bilzen Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur Electriciteitswerken Marc Hex Jonkharenbos 84 3740 Bilzen Tel.: - GSM: 0496/243045 Fax: - e-mail: marc.hex@telenet.be BE 0568.734.952	p. 2/6 Eendraadschema 2 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door:		





2 x 230V ~ 50Hz

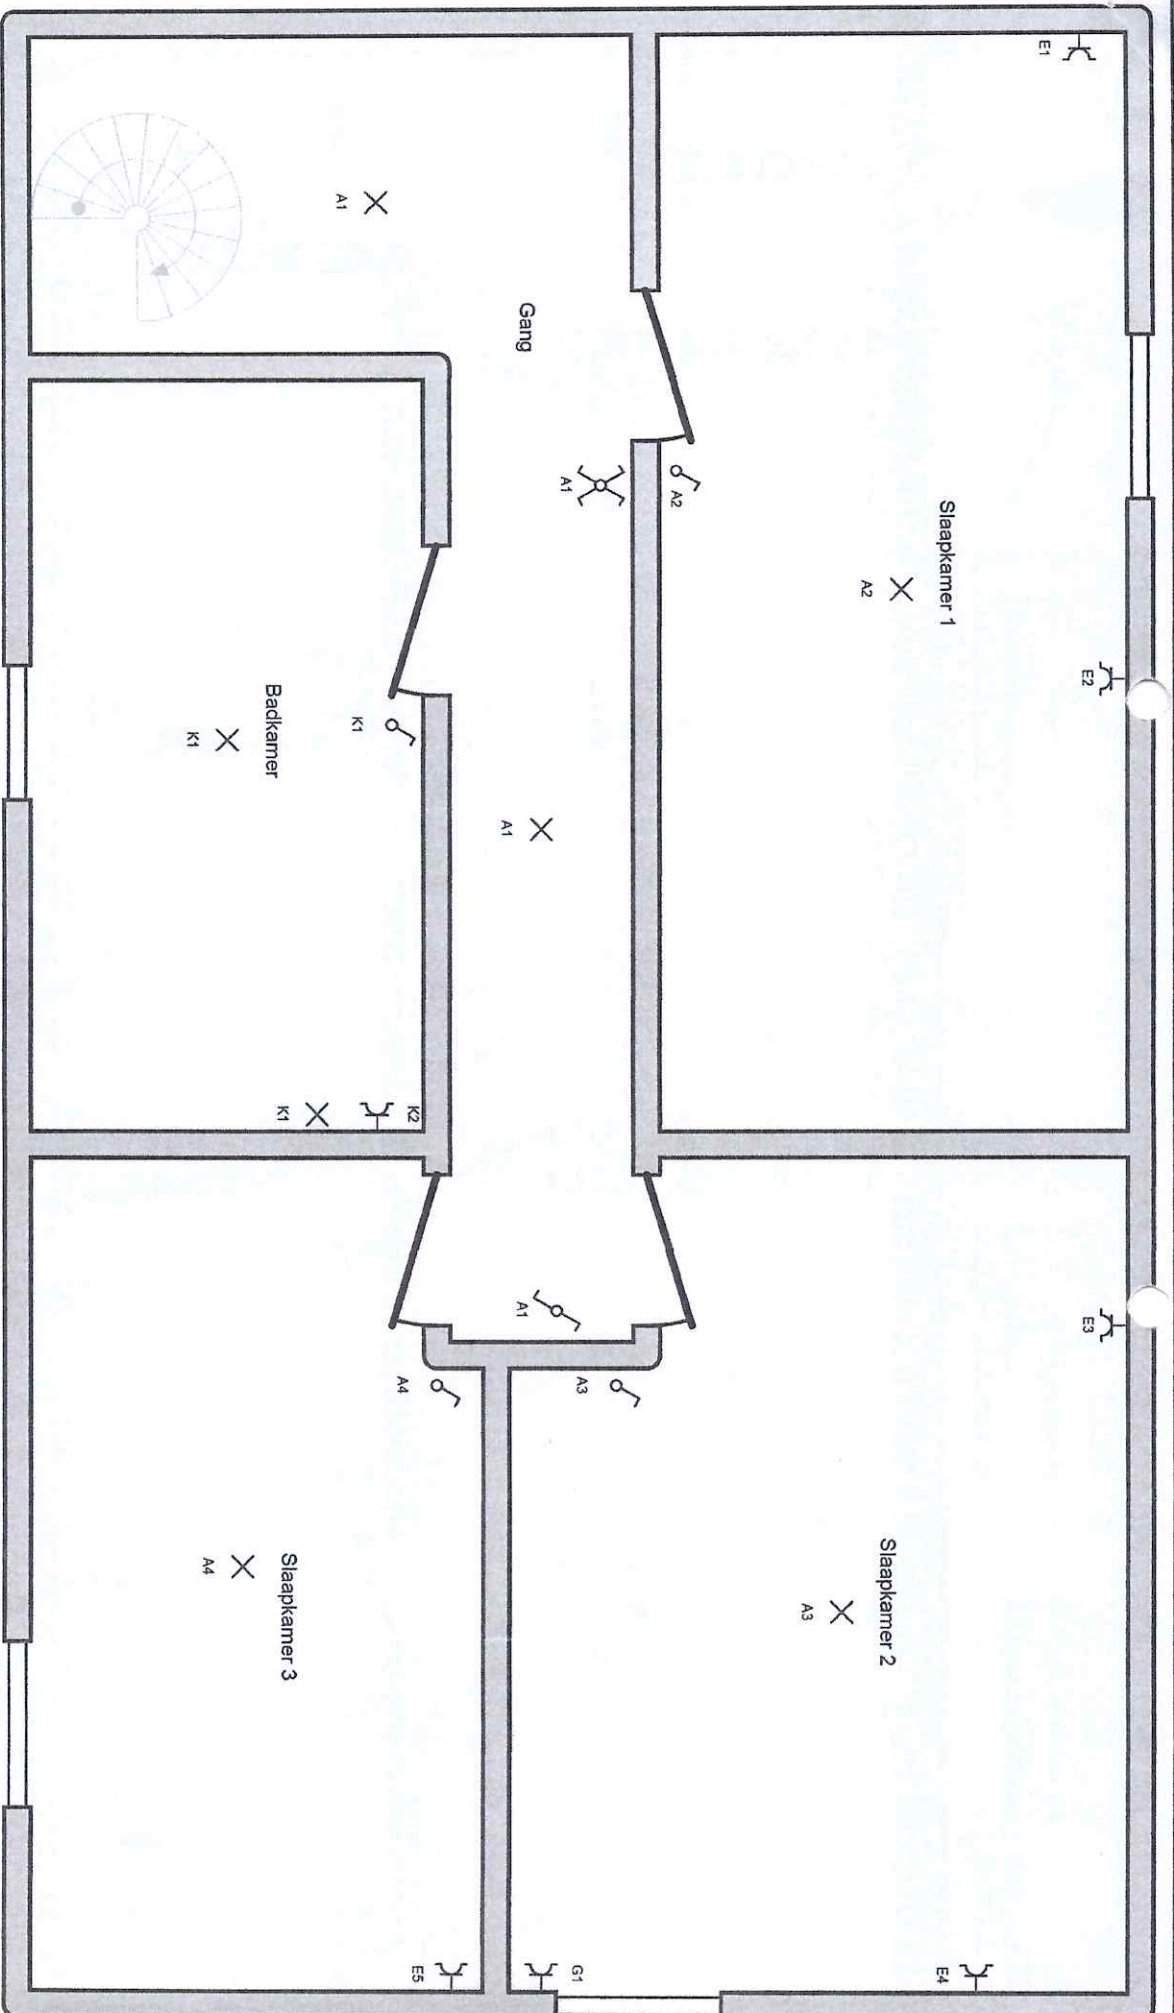

1e Verdieping

Plaats van de elektrische installatie
 Vanspauwen Johnny
 Schoonbeekstraat 23 Bus 1
 3740 Bilzen
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -



Installateur
 Electriciteitswerken Marc Hex
 Jonckheerbos 84
 3740 Bilzen
 Tel.: - GSM: 0496/243045
 Fax: -
 e-mail: marc.hex@telenet.be
 BE 0568.734.952



Schema's getekend door:

[Handwritten signature]

P. 4/6
 Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

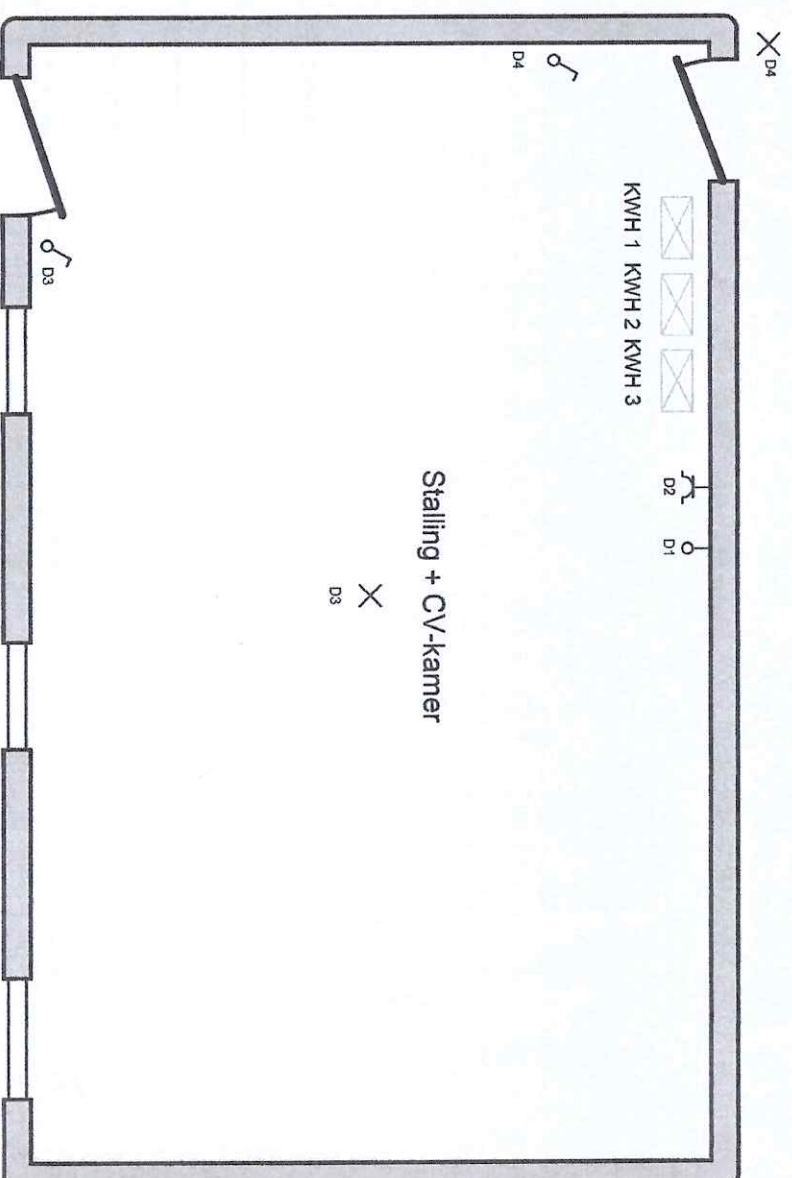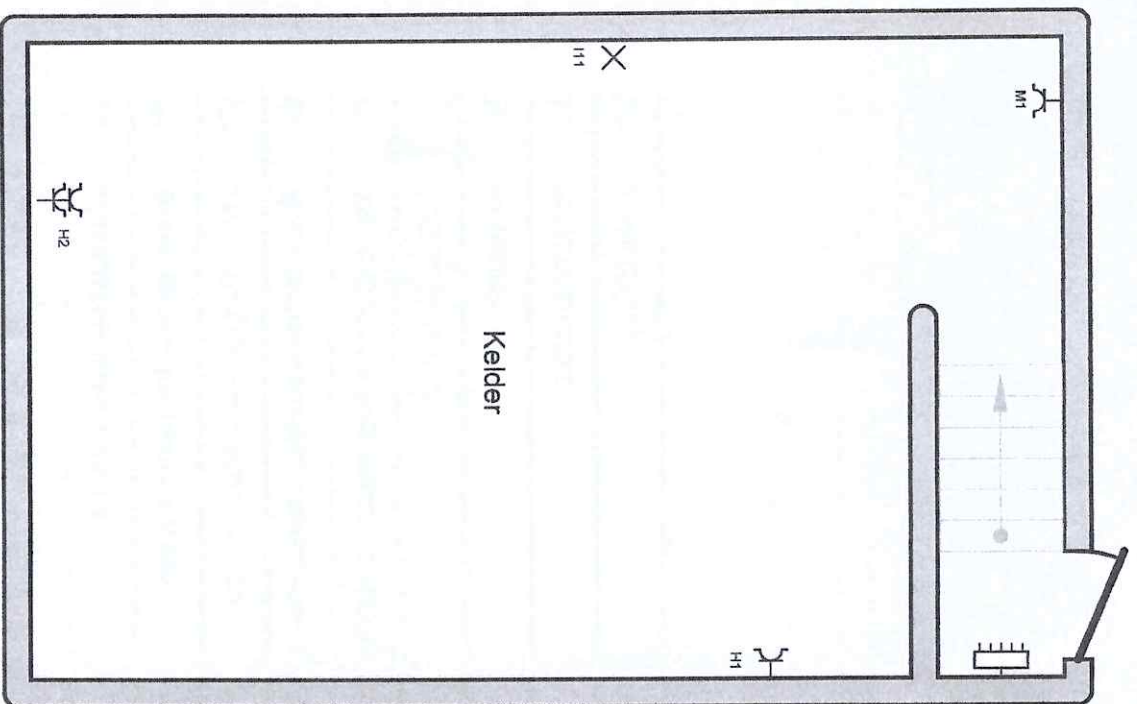

Plaats van de elektrische installatie

Vanspauwen Johnny
Schoonbeekstraat 23 Bus 1
3740 Bilzen
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Electriciteitswerken Marc Hex
Jonkharenbos 84
3740 Bilzen
Tel.: - GSM: 0496/243045
Fax: -
e-mail: marc.hex@telenet.be
BE 0568.734.952



p. 5/6
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's gemaakt door:

A:	Verlichting 1ste verdieping
B:	Verlichting gelijkvloer
C:	Bel
D:	C.V. + stopc. en verlichting stalling
E:	Stopc. Slaapkamer 1 + 2 + 3
F:	Stopc. gang + Woonkamer + Salon
G:	Stopc. Slaapkamer 2 onder venster
H:	Stopc. Kelder + Berging + Salon muur berging
I:	Stopc. Keuken + Keukenkast verlichting + Verlichting kelder
J:	Elektrisch Fornuis
K:	Badkamer
L:	Vaatwasmachine
M:	Boller Kelder

Plaats van de elektrische installatie
Vanspauwen Johnny
Schoonbeekstraat 23 Bus 1
3740 Bilzen
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Electriciteitswerken Marc Hex
Jonkherenbos 84
3740 Bilzen
Tel.: - GSM: 0496/243045
Fax: -
e-mail: marc.hex@telenet.be
BE 0568.734.952



Schema's getekend door:

p. 6/6
Lijst Kringen
2 x 230V ~ 50Hz
