

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

**Datum keuring:** 08/04/2024      **Inspecteur:** Stefano Micoli      **Mentor:**      **Installateur:** Dojo Facility Services  
**ID-label:** Borggravevijversstraat 66 Hasselt      **Klantreferentie:**  
B.T.W. nr.:BE 0768 768 946      **Serienummer:** 22320400

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT

**Datum verslag:** 08/04/2024

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam      Borggravevijversstraat  
Huisnummer      66  
Busnummer  
Postcode      3500  
Gemeente      Hasselt  
Land      België

#### Eigenaar

Naam      Io van Dojo Facility Services  
Straatnaam      Borggravevijversstraat  
Huisnummer      66  
Busnummer  
Postcode      3500  
Gemeente      Hasselt  
Land      België

#### Installateur

Naam      Dojo Facility Services  
BTW nr.      BE 0768 768 946  
Telefoonnummer      +32 493 52 24 49  
E-mail      Jordentulleneers@gmail.com

**Type :** woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

**EAN :** 541449206005258214

**Teller Nr. :** 1SAG1100634452



#### Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS  
Aantal borden: 1  
Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1~230V      Meter / bord verbinding: 16 mm<sup>2</sup>      Max beveiliging: 40 A  
Aantal kringen: 24

Ri algemeen: 5,51 MΩ

RE: 6,80 Ω

OK

OK



**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

**BESCHRIJVING INSTALLATIE**

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	40	Rem	2	6
1	C	25	Pv	2	4
2	C	20		2	4
15	C	20		2	2,5
3	C	16		2	2,5
1	C	6		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.  
 nota/note 36 Aanvang installatie dateert van voor 01/06/2020

**BESLUIT**

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 8/4/2049
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 7

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Stefano Micoli

Stefano Micoli  
 ACEG VZW - #337

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


**Stappenplan voor een installatie die conform is:**


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 8/4/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




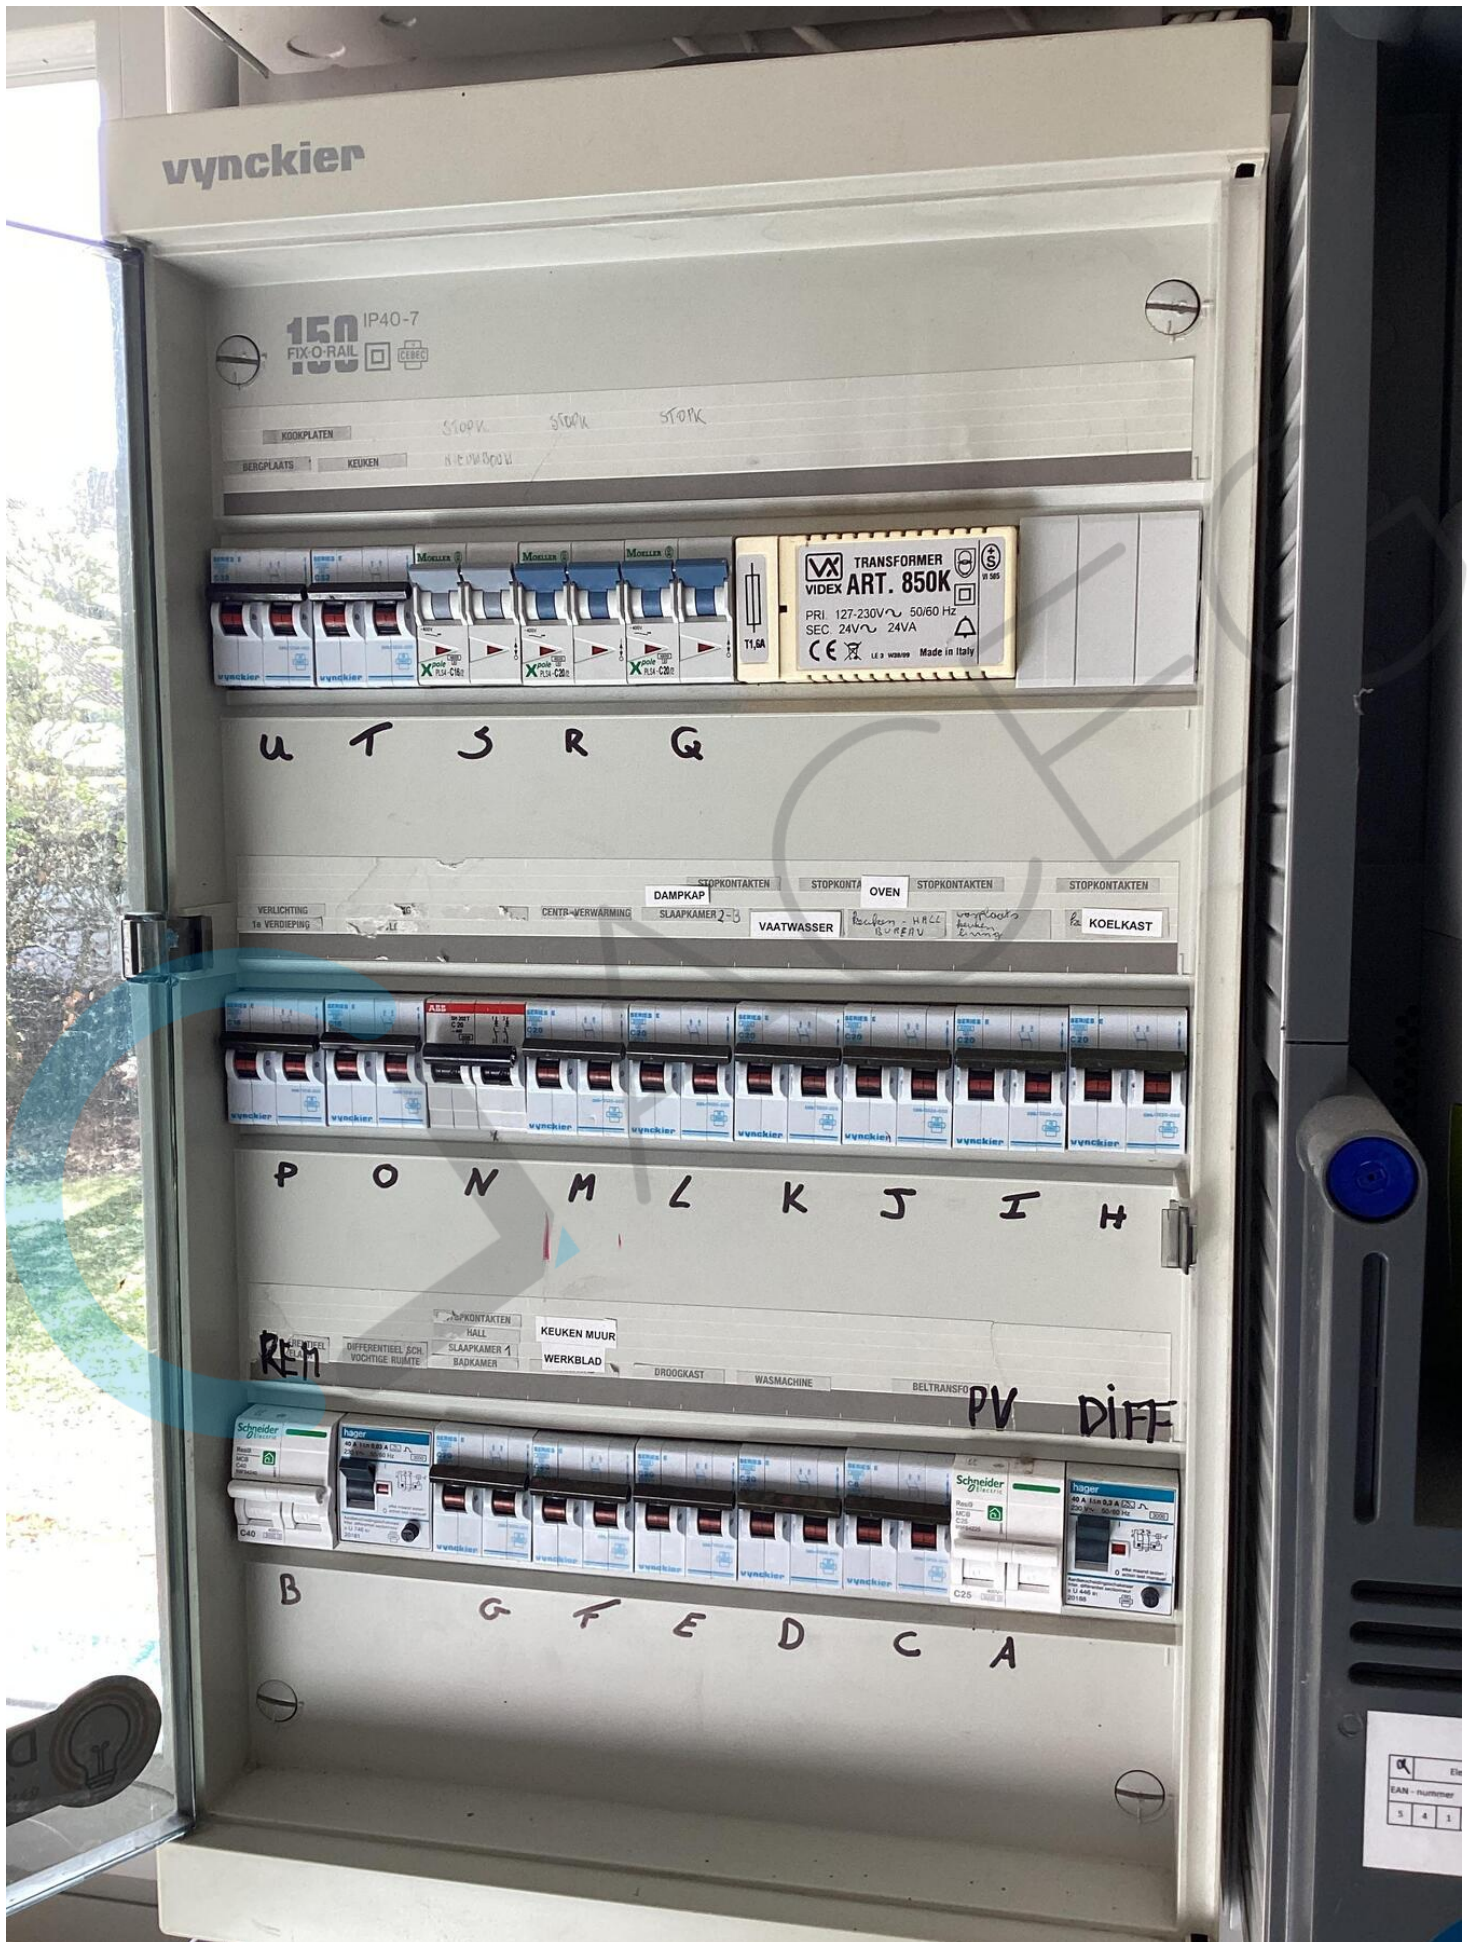



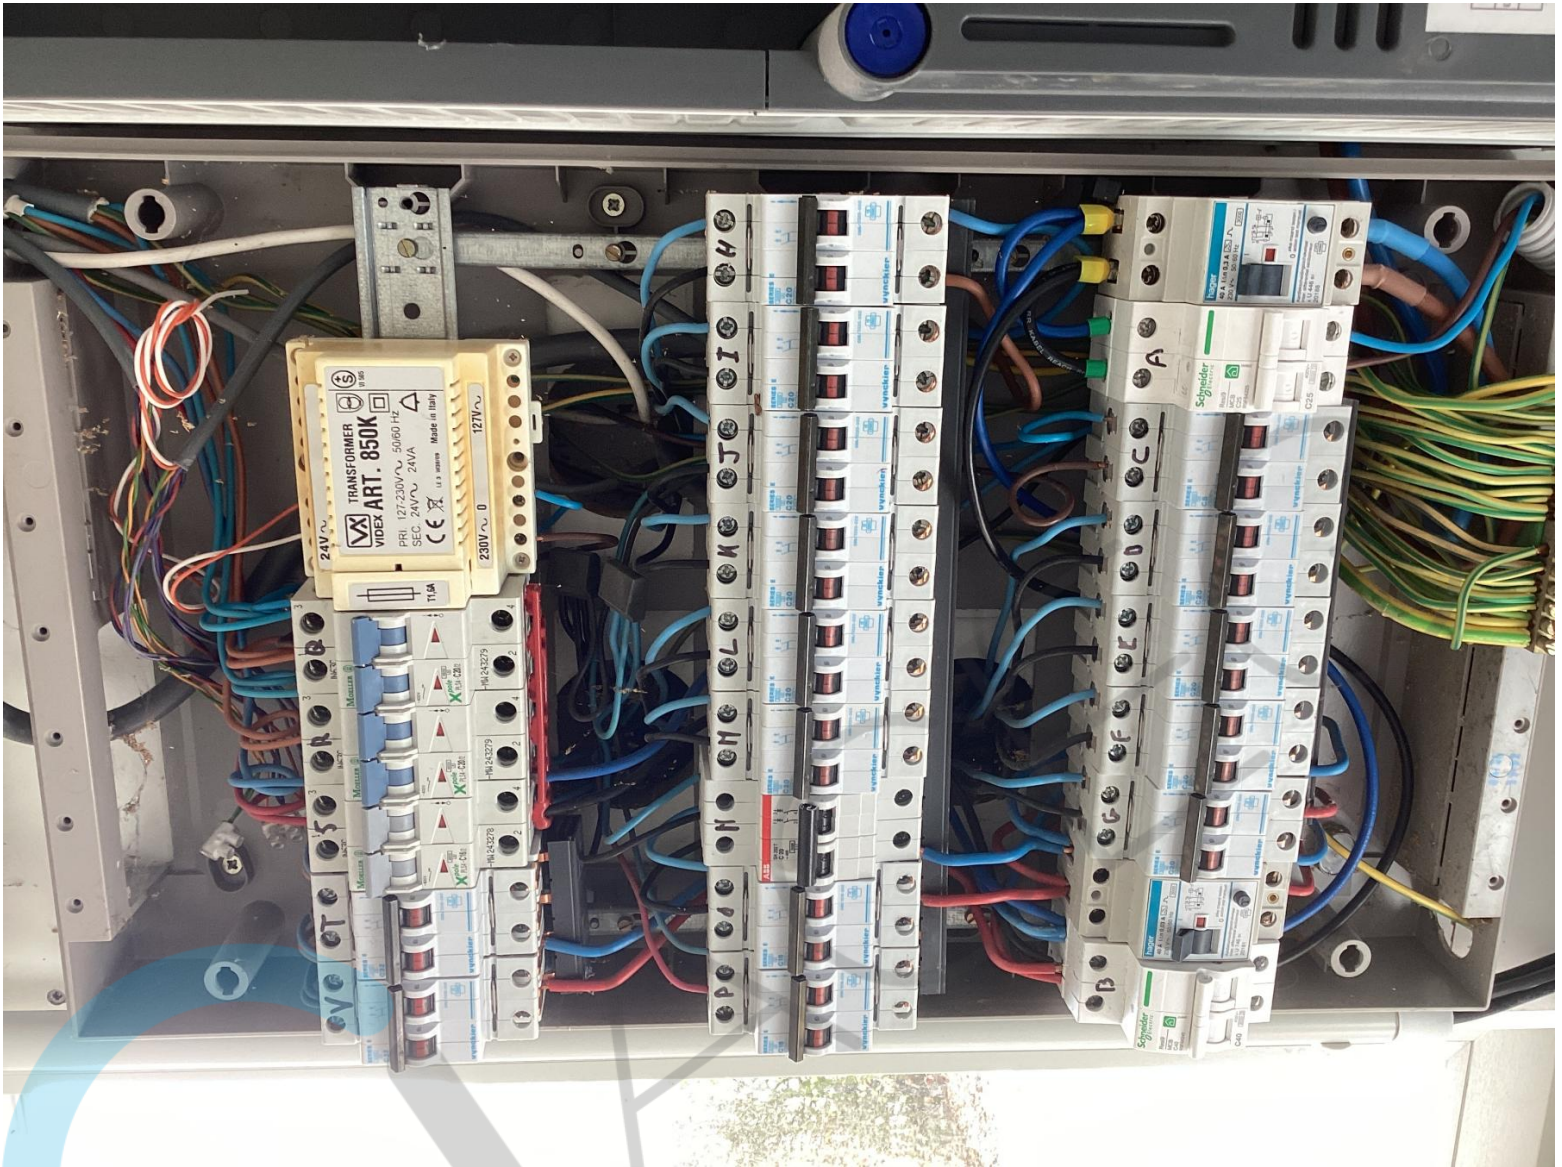

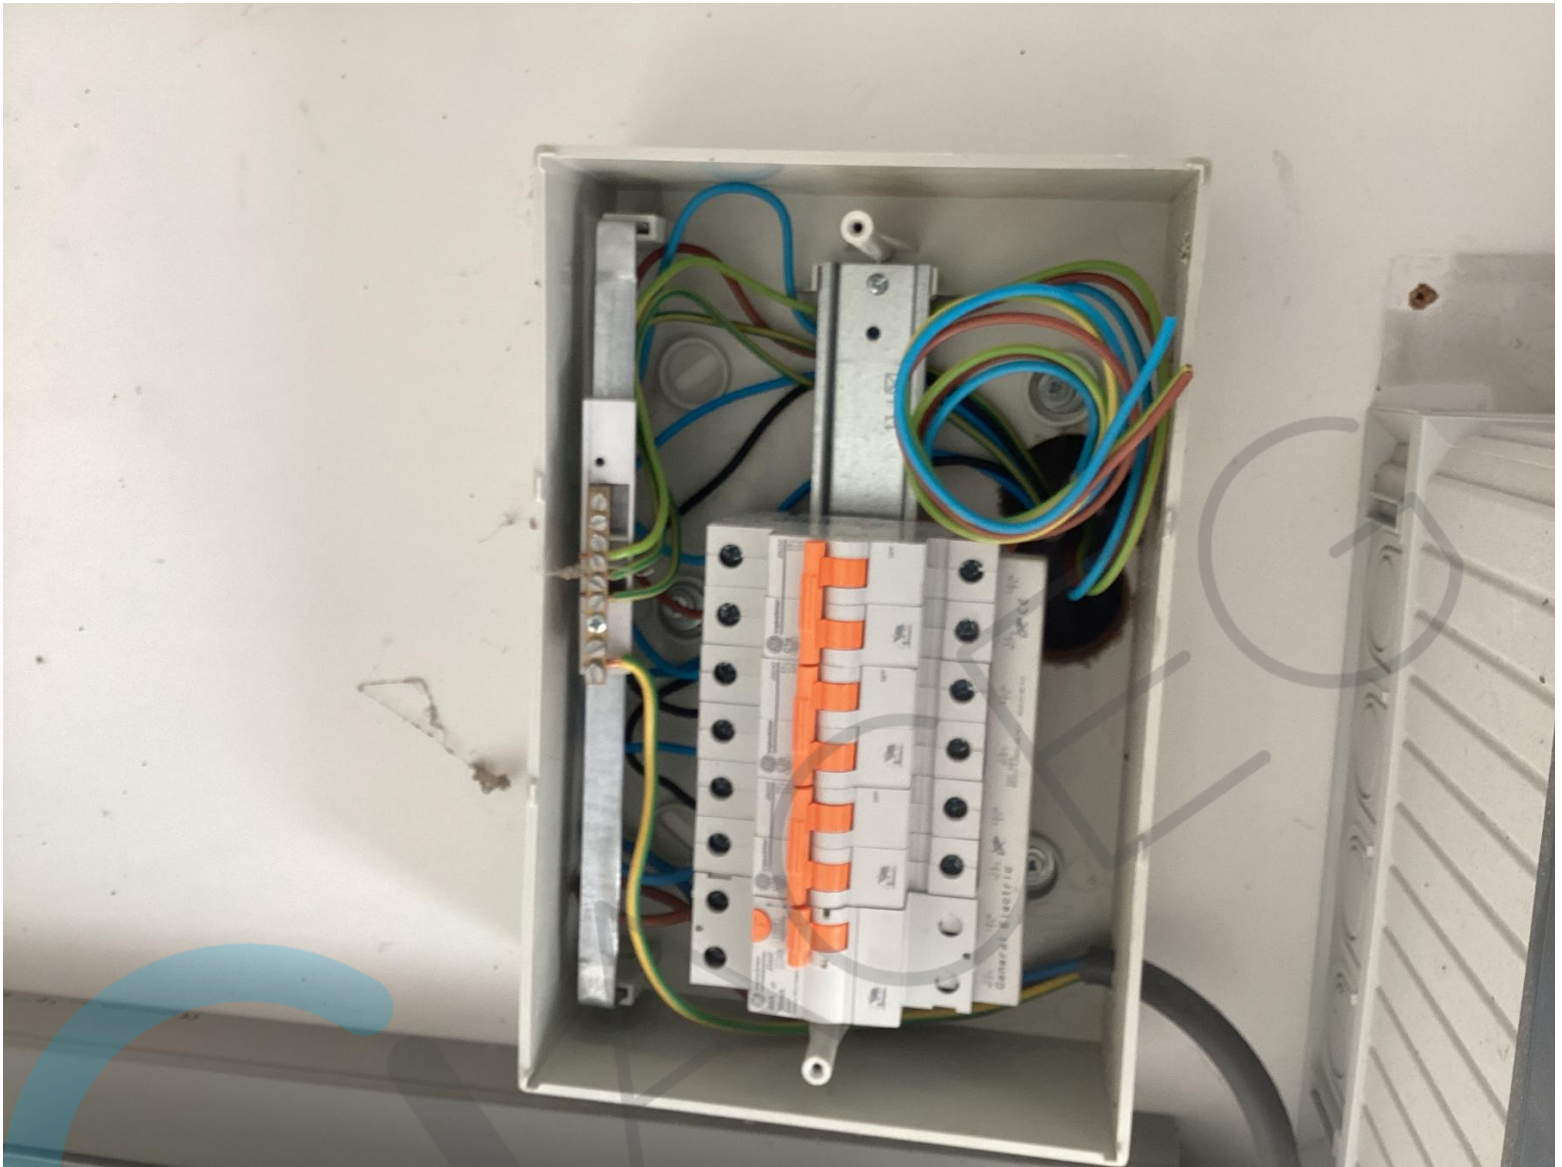


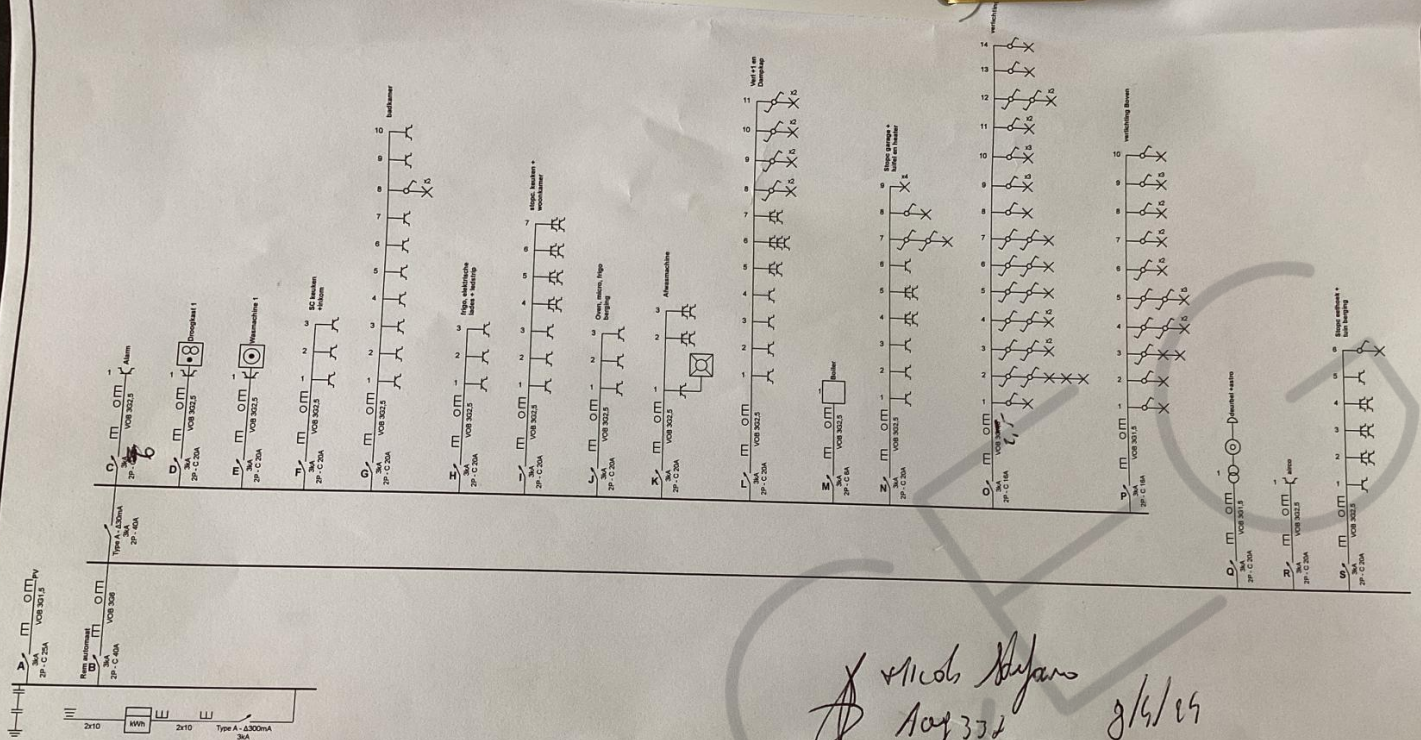


*Nicols Stefan*  
*10/3/23*  
*g/1/23*


<p><b>Plaats van de elektrische installatie</b></p> <p>borggravenvijverstraat 66          3500 Hasselt</p> <p>EAN 541449206005258214</p>	<p><b>Installateur</b></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>p. 1/6  <b>Eendraadschema</b></p> <p>Datum: 3-10-2023</p> <p>3 x 400V + N ~ 50Hz</p>
--	--	---

Schema's getekend door: DOJO Facility Services bv - BTW BE 0768.768.946

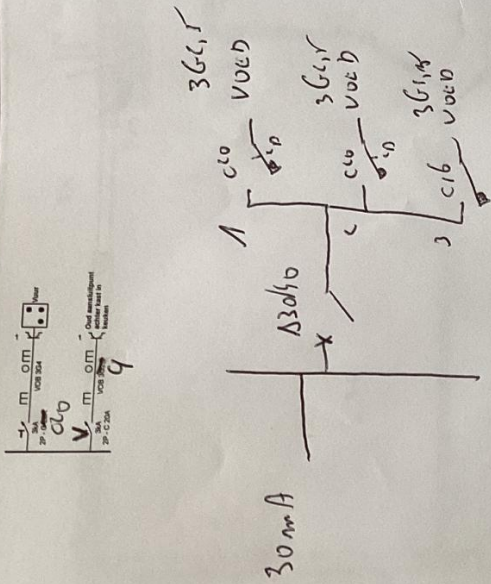



 Nicolo JEFANO  
 Aoy 337  
 8/4/23

<b>Plaats van de elektrische installatie</b> borggravenvijverstraat 66 3500 Hasselt EAN 541449206005258214	<b>Installateur</b> 	p. 2/6 <b>Eendraadschema</b> Datum: 3-10-2023 3 x 400V + N - 50Hz
Schema's getekend door: DOJO Facility Services bv - BTW BE 0768.768.946		

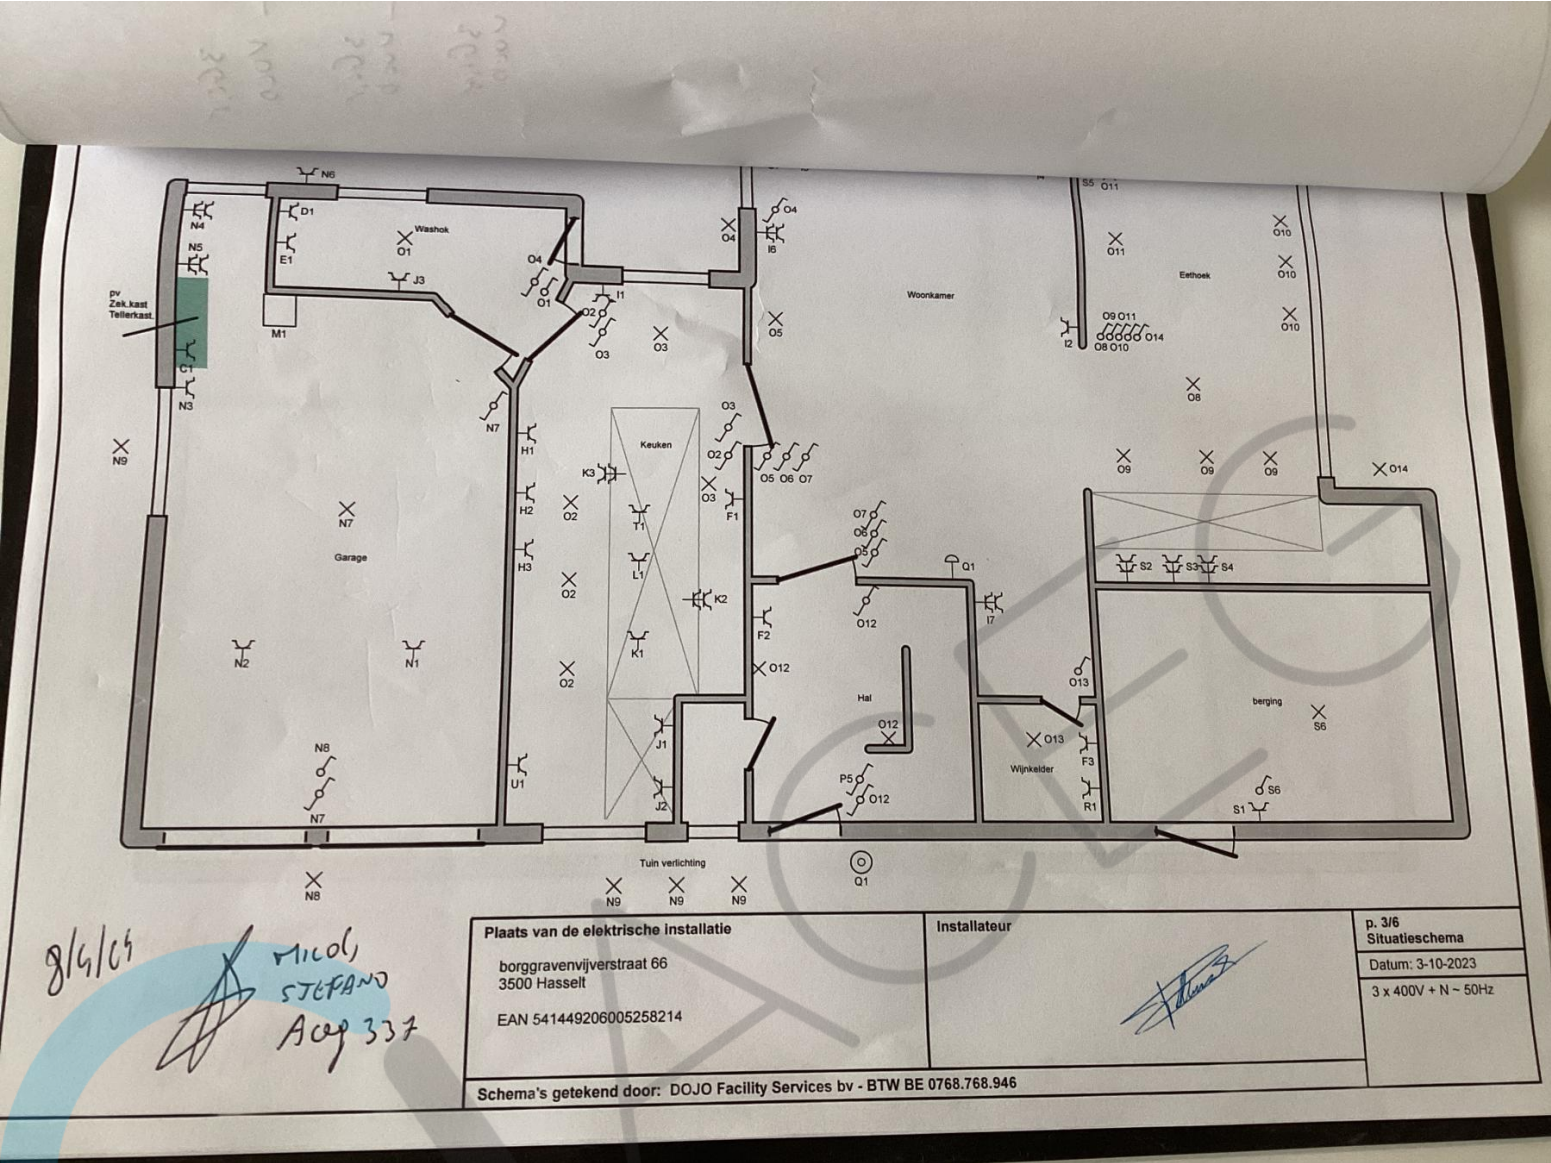

8/6/09  
 MICO,  
 STEFANO  
 ACP 337

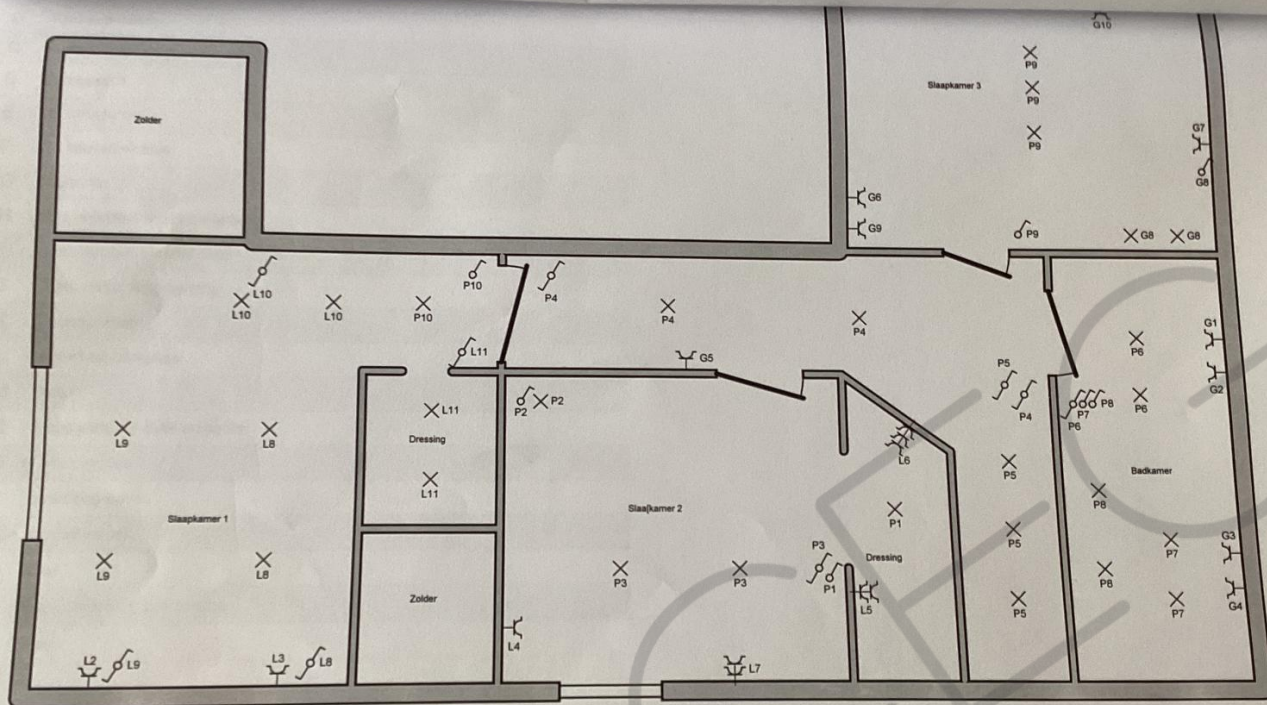

Mirco Stefano  
ACC6337  
8/6/23

**Plaats van de elektrische installatie**

borggravenvijverstraat 66  
3500 Hasselt  
EAN 541449206005258214

**Installateur**

**p. 4/6  
Situatieschema**

Datum: 3-10-2023

3 x 400V + N - 50Hz

Schema's getekend door: DOJO Facility Services bv - BTW BE 0768.768.946



