

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: AVANSIMAHEY@HOTMAIL.COM



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS20
Verslagnr.: 4740709
Voorl. verslagnr.:
Datum: 25/10/2016

Klant / Opdrachtgever:
ARMAND VAN SIMAHEY
WIJDEGRACHT 20
8530 HARELBEKE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: ARMAND VAN SIMAHEY PROCESSIESTRAAT 85/3.1 WAREGEM 8790
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 271
Datum onderzoek: 25/10/2016 Onderzoeker: VERVISCH MIKE
Eigendom van: ARMAND VAN SIMAHEY
Installateur: ONBEKEND
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 33791266 Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 25 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: < 10 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 10 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: nvt
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 11

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


GEEN

BESLUIT

- De installatie is goedgekeurd.
 De installatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en).
 De installatie is afgekeurd. Een aanvullende controle na aanpassing is vereist.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

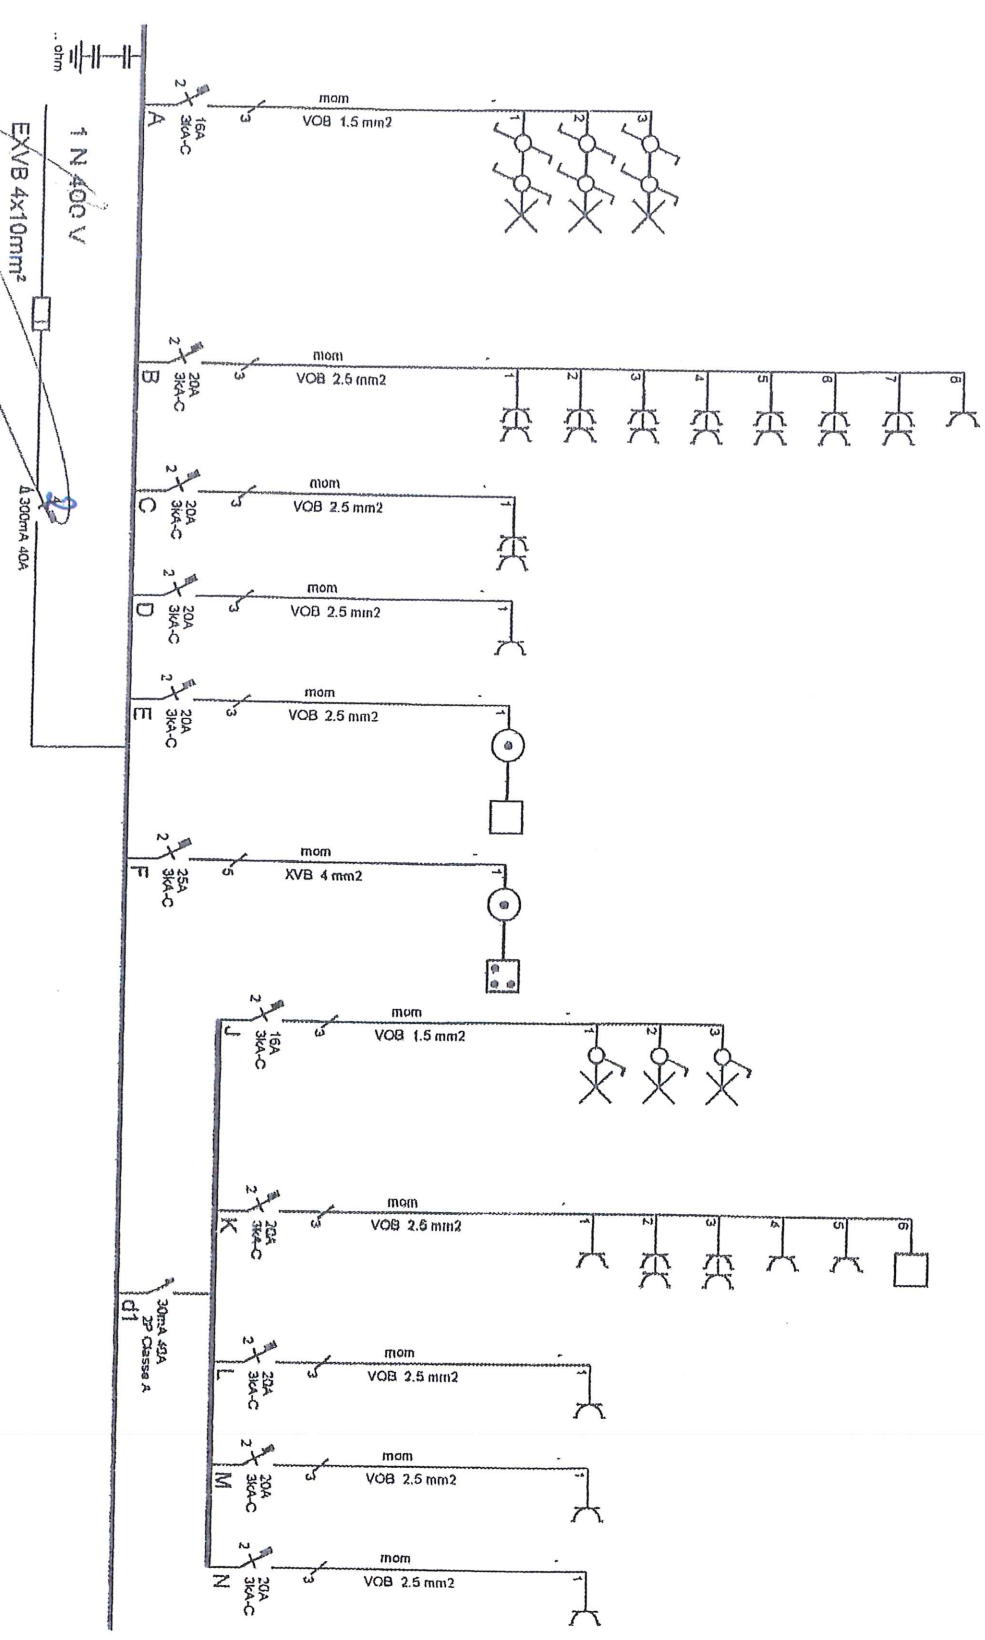

Afgev. erkend organisme

02 / 03 / 2007

RES. ASCOT APP 3.8
 VANDENDAELE EVELINE
 PROCESSIONESTRAAT 85 BUS31
 8790 WAREGEM

Verantw. uitvoering

27 / 02 / 2007

LATTRE HENDRIK
 HOOGSTRAAT 71-73
 8780 OOSTROZEBEKE
 TEL 056 671280
 BTW 676.113.358

Handwritten signatures and notes:
 25 nov 06
 OP
 25 nov 06

APP 3.8

