



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 15/03/2024 Inspecteur: Jonas Van Assche Mentor: Installateur: De Koster gebroeders BV
ID-label: B.T.W. nr.:BE 0463 887 454 Klantreferentie:
Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 23160673

Datum verslag: 15/03/2024

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1488944

Adres van het onderzoek

Straatnaam Putkapelstraat
Huisnummer 91
Busnummer
Postcode 9051
Gemeente Gent
Land België

Eigenaar

Naam Janssens
Straatnaam Putkapelstraat
Huisnummer 91
Busnummer
Postcode 9051
Gemeente Gent
Land België

Installateur

Naam De Koster gebroeders BV
BTW nr. BE 0463 887 454
Telefoonnummer +32 468 02 02 00
E-mail info@dekostergebroeders.be

Type : appartement

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: : 44271373

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 2 Aantal kringen: 14

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 4,15 MΩ RE: 9,25 Ω

OK OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
8	C	20		2	2,5
3	C	16		2	1,5
1	C	16		4	4
Bord appartement	-	-		-	-
1	C	32		3	10
1	C	16		2	2,5
Bord vertrek	-	-		-	-

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 31 Deze installatie dateert van voor '81, er werd rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in Boek 1 Afdeling 8.2.1.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 15/3/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jonas Van Assche

Jonas Van Assche

Jonas Van Assche
ACEG vzw - 0537

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481



Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 15/3/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.


QVACEG

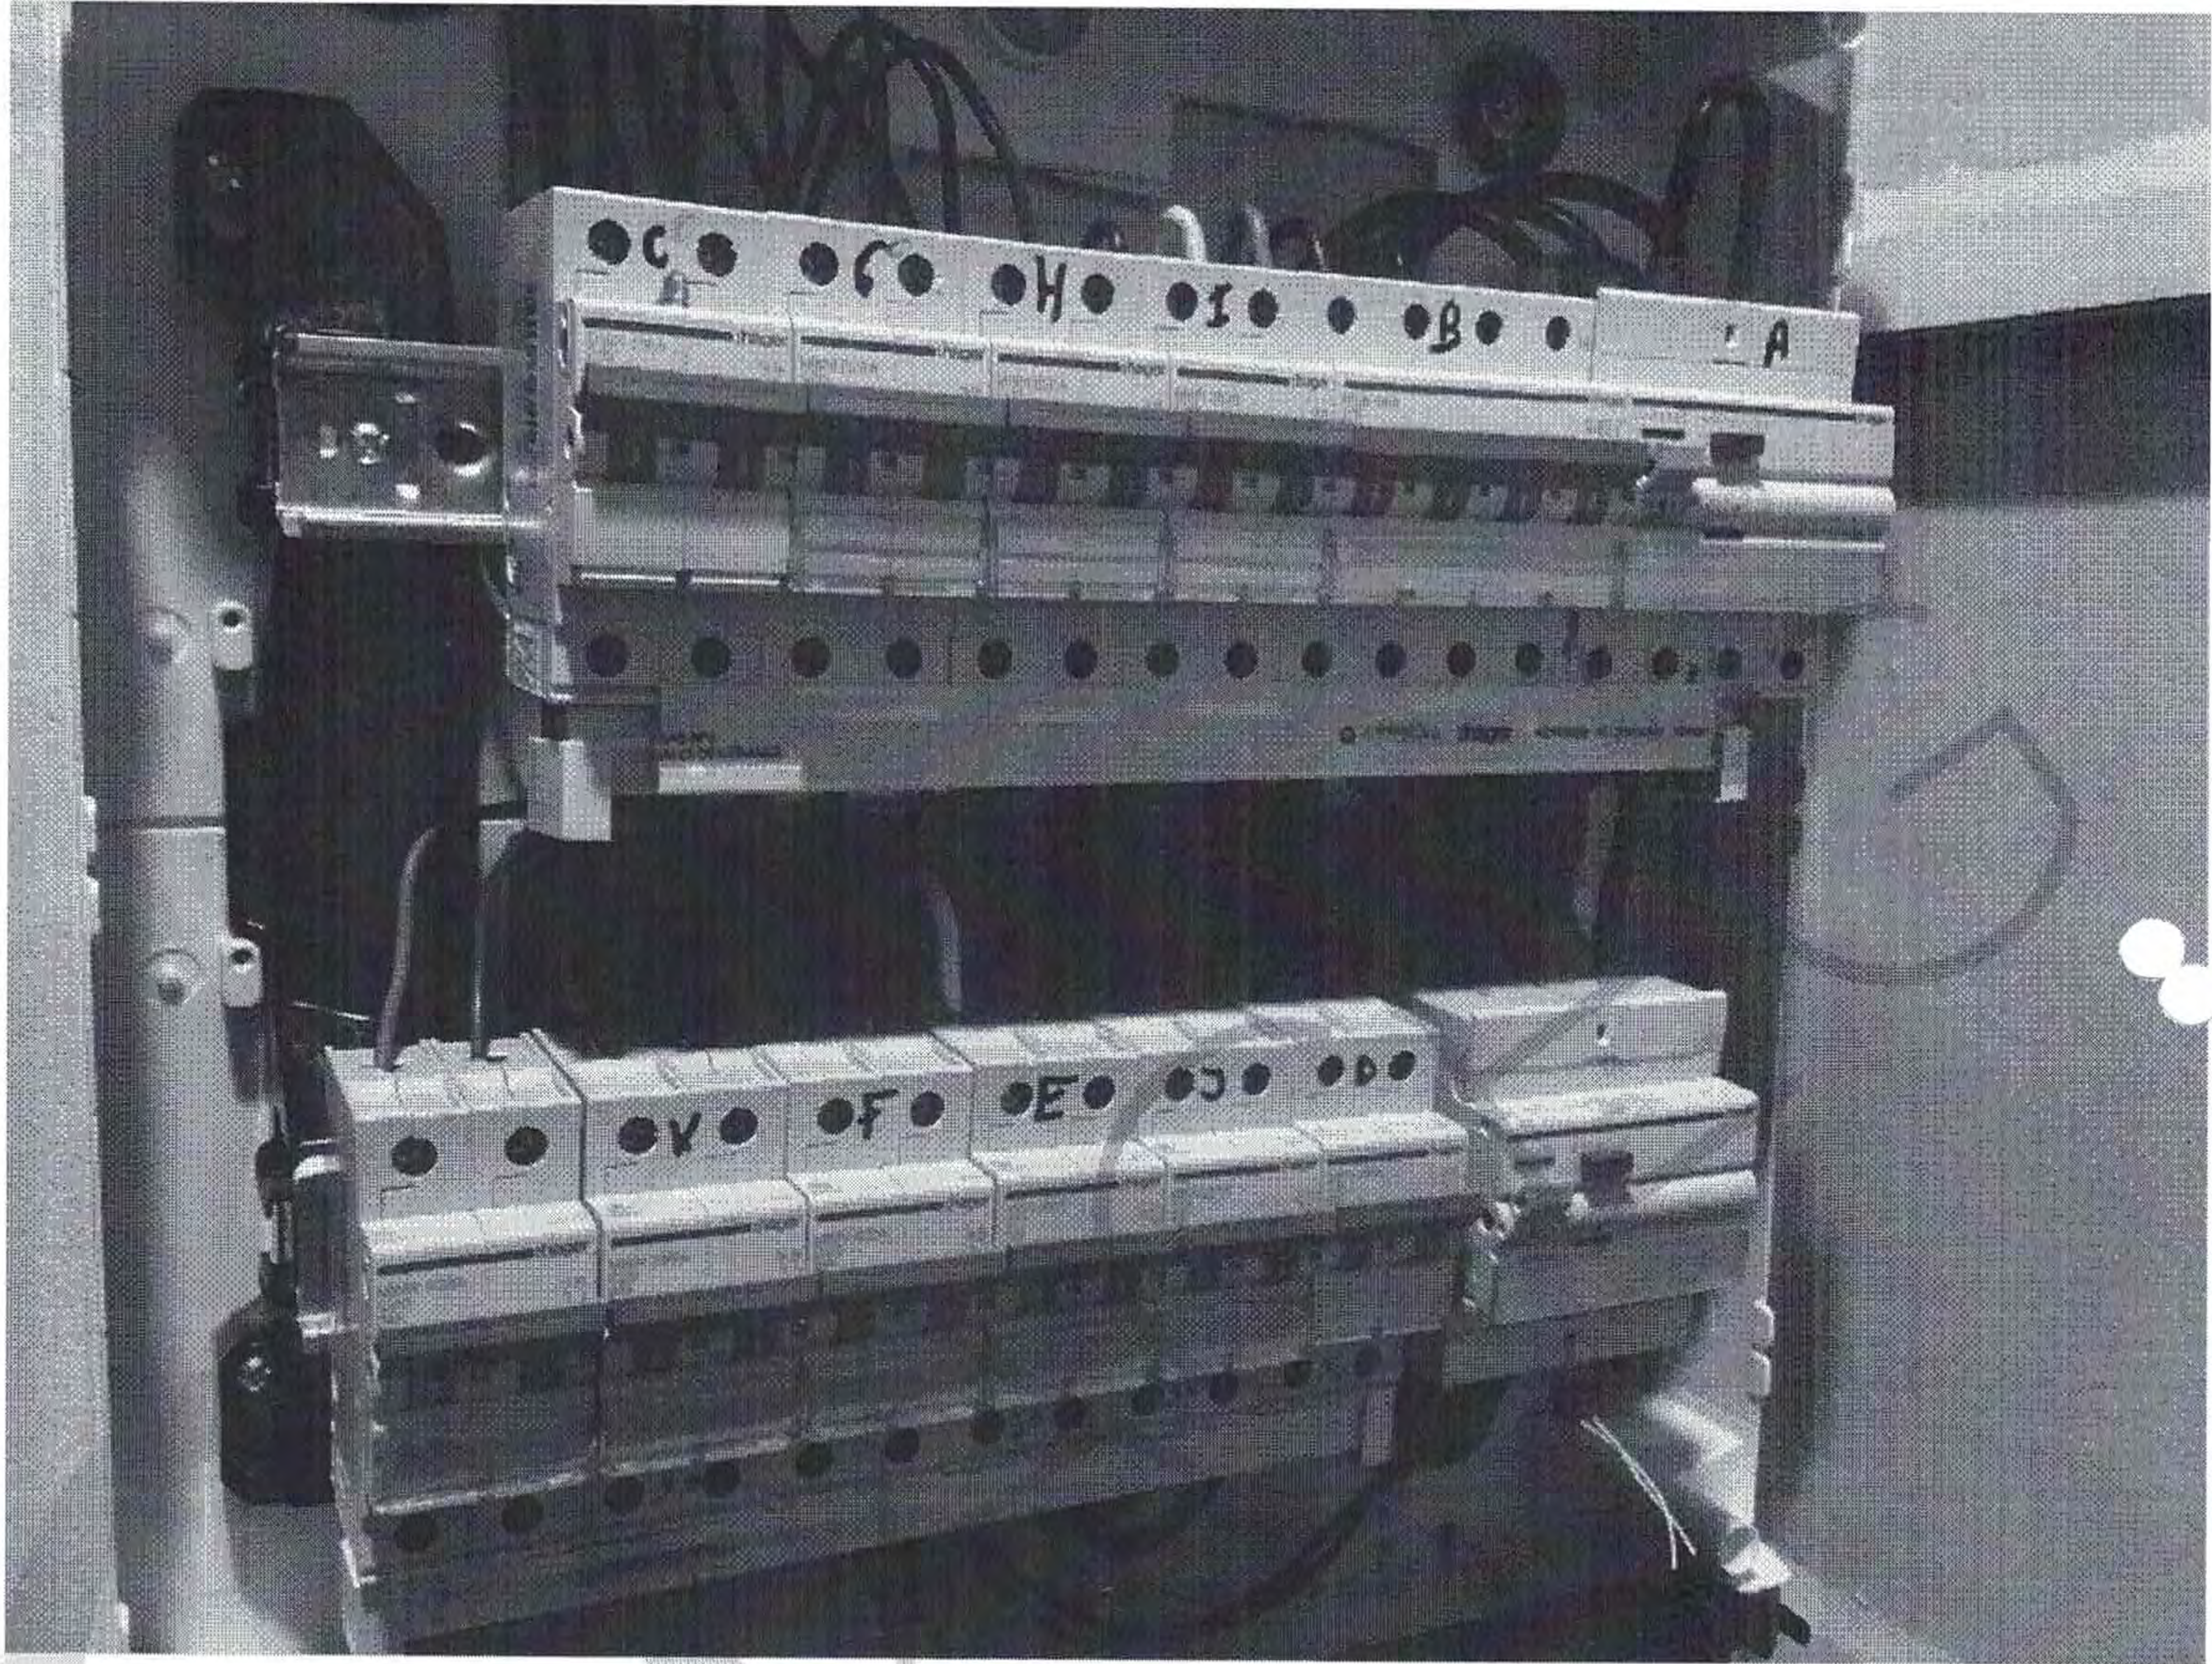

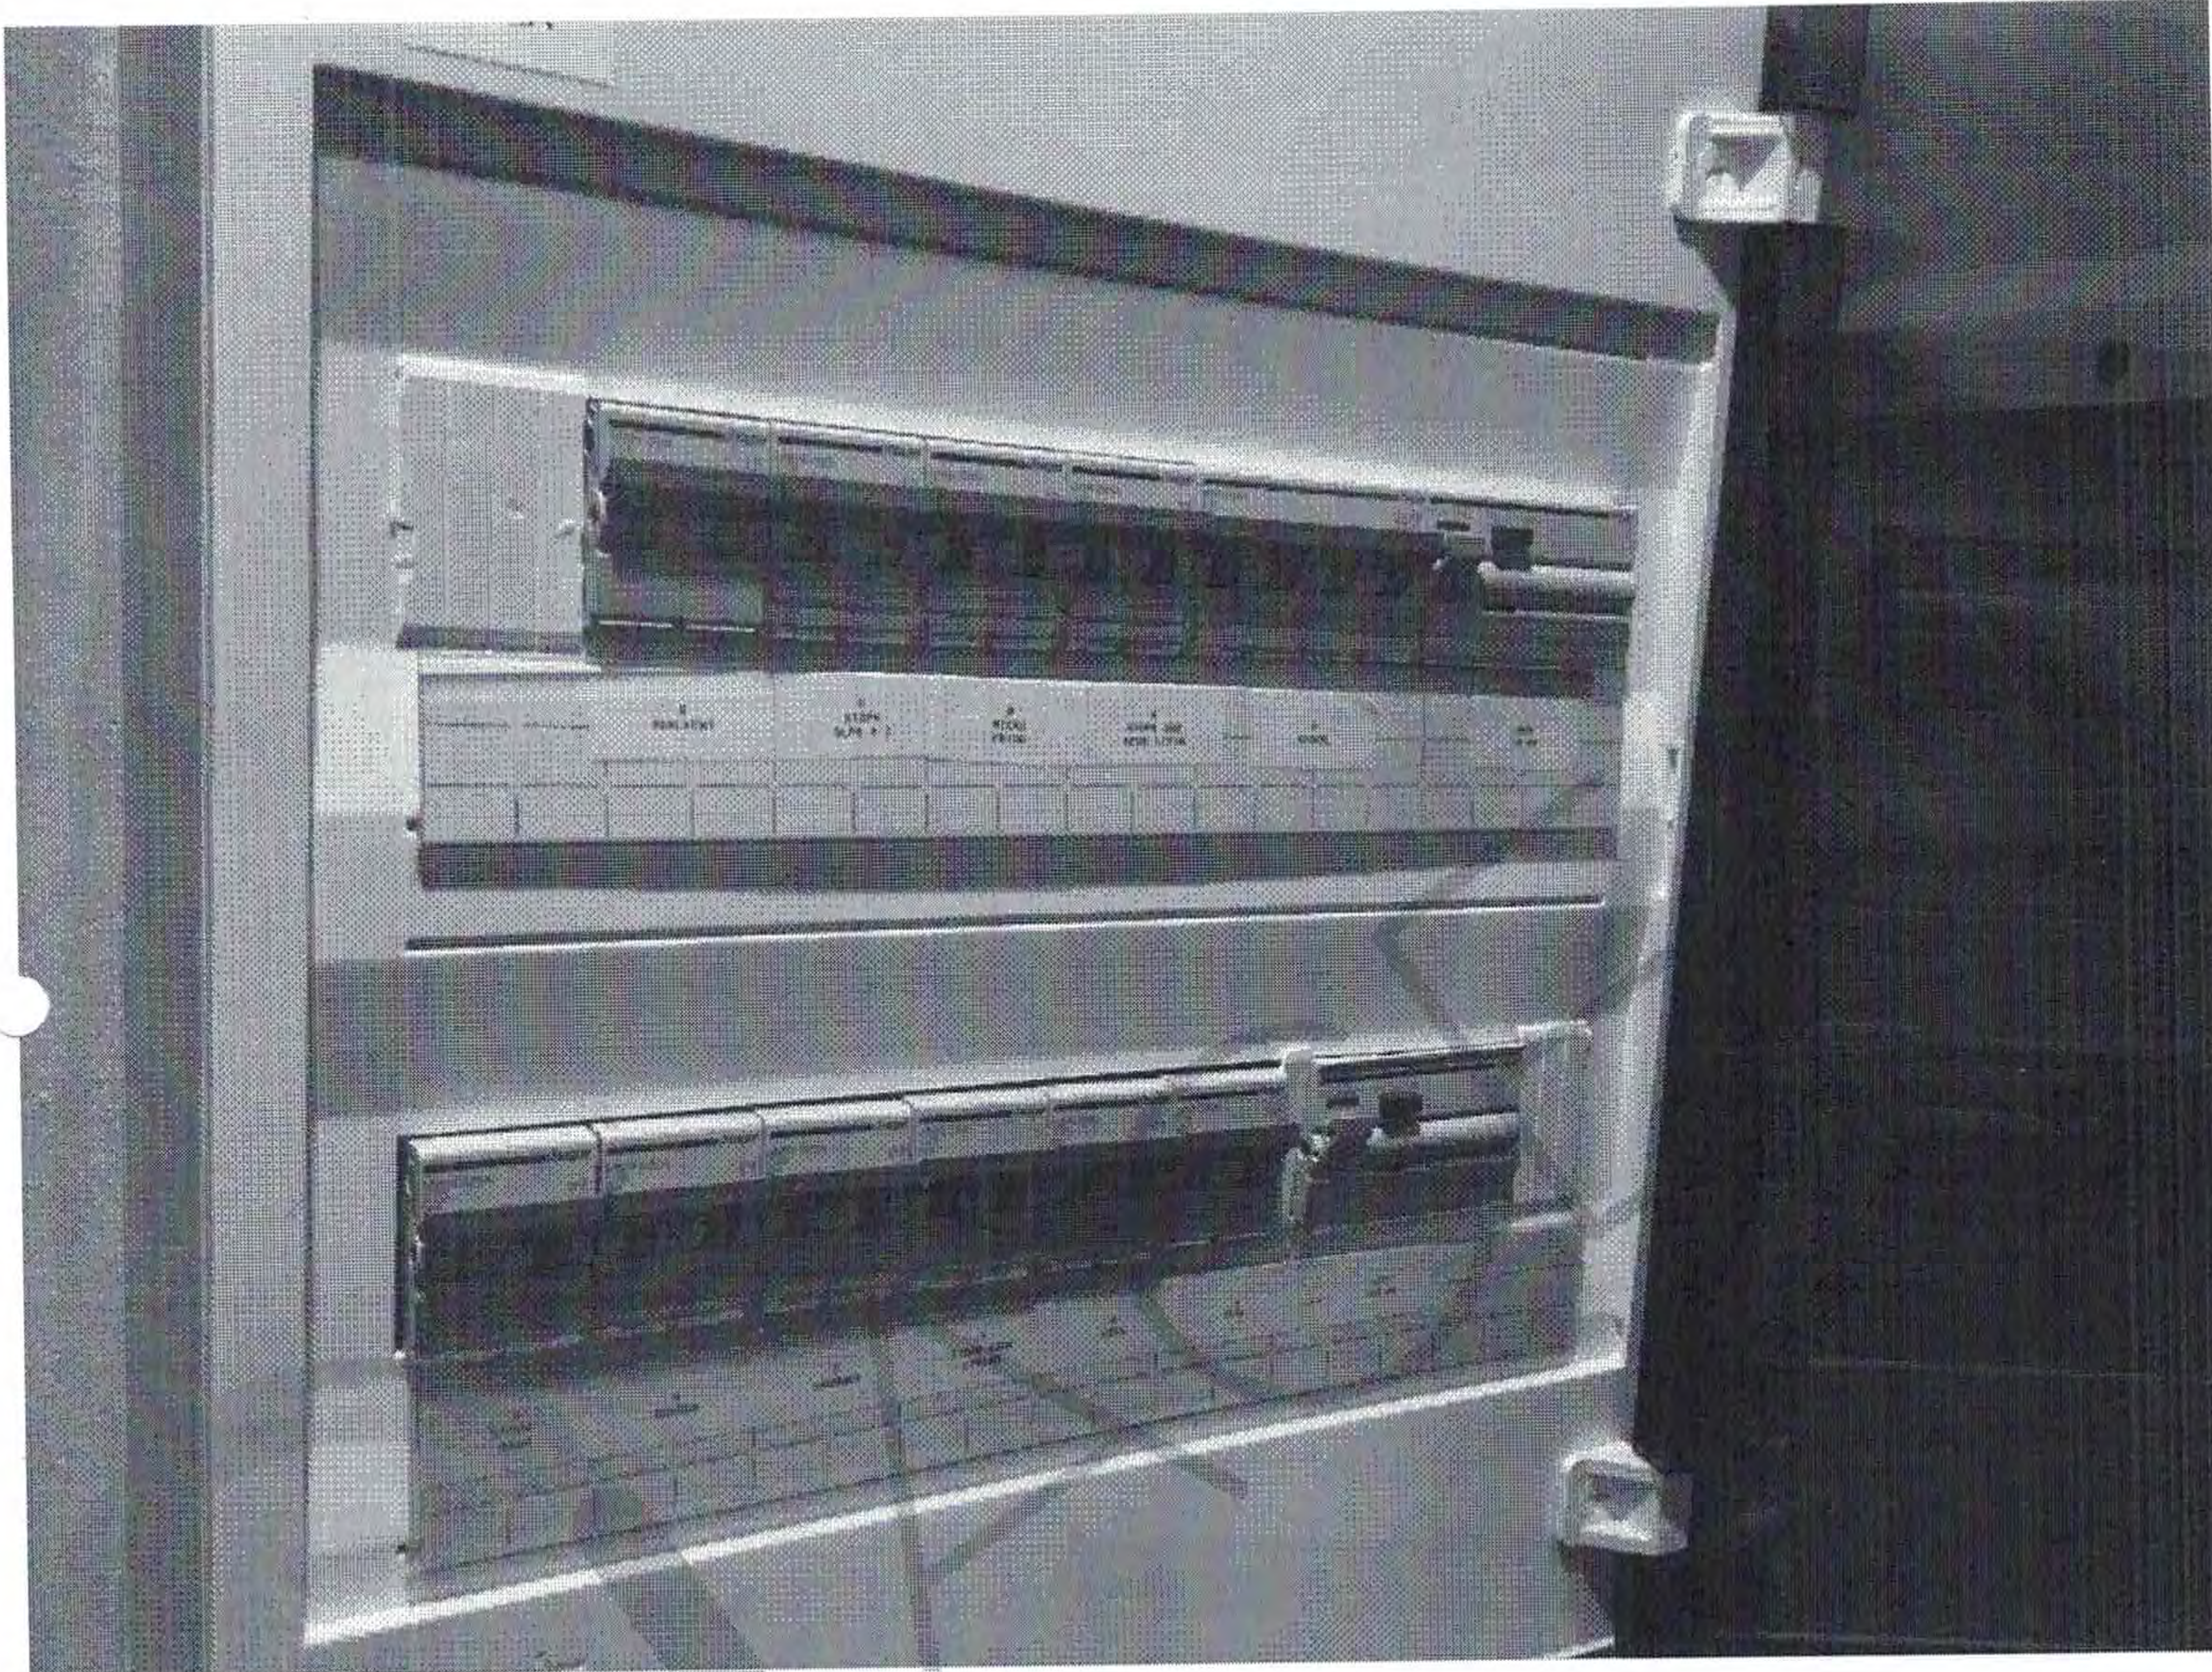

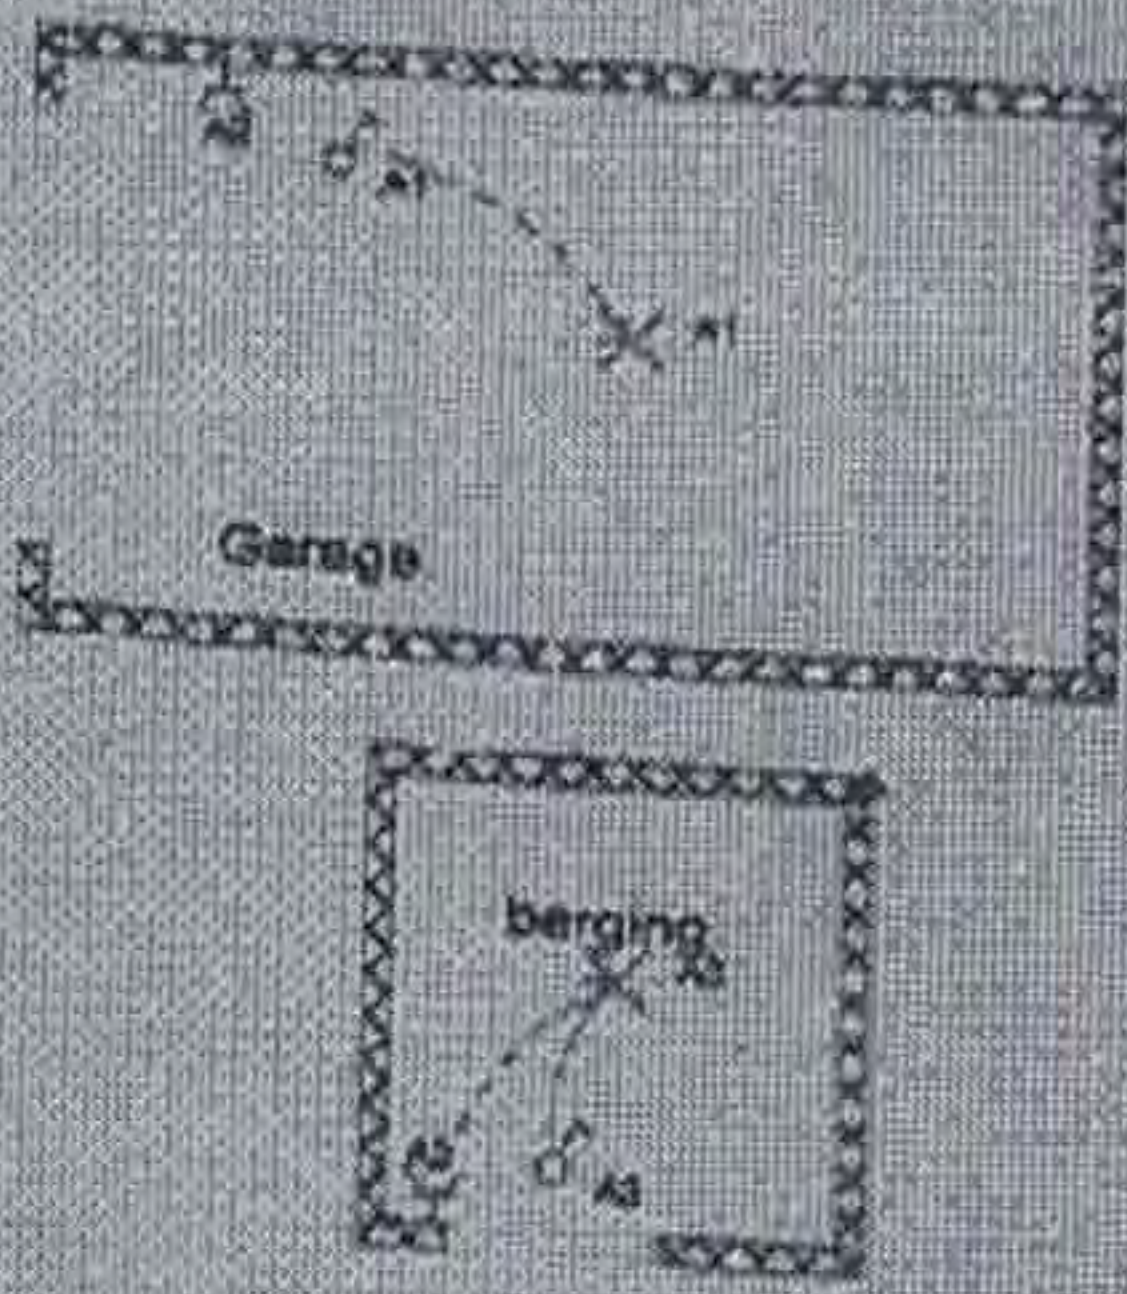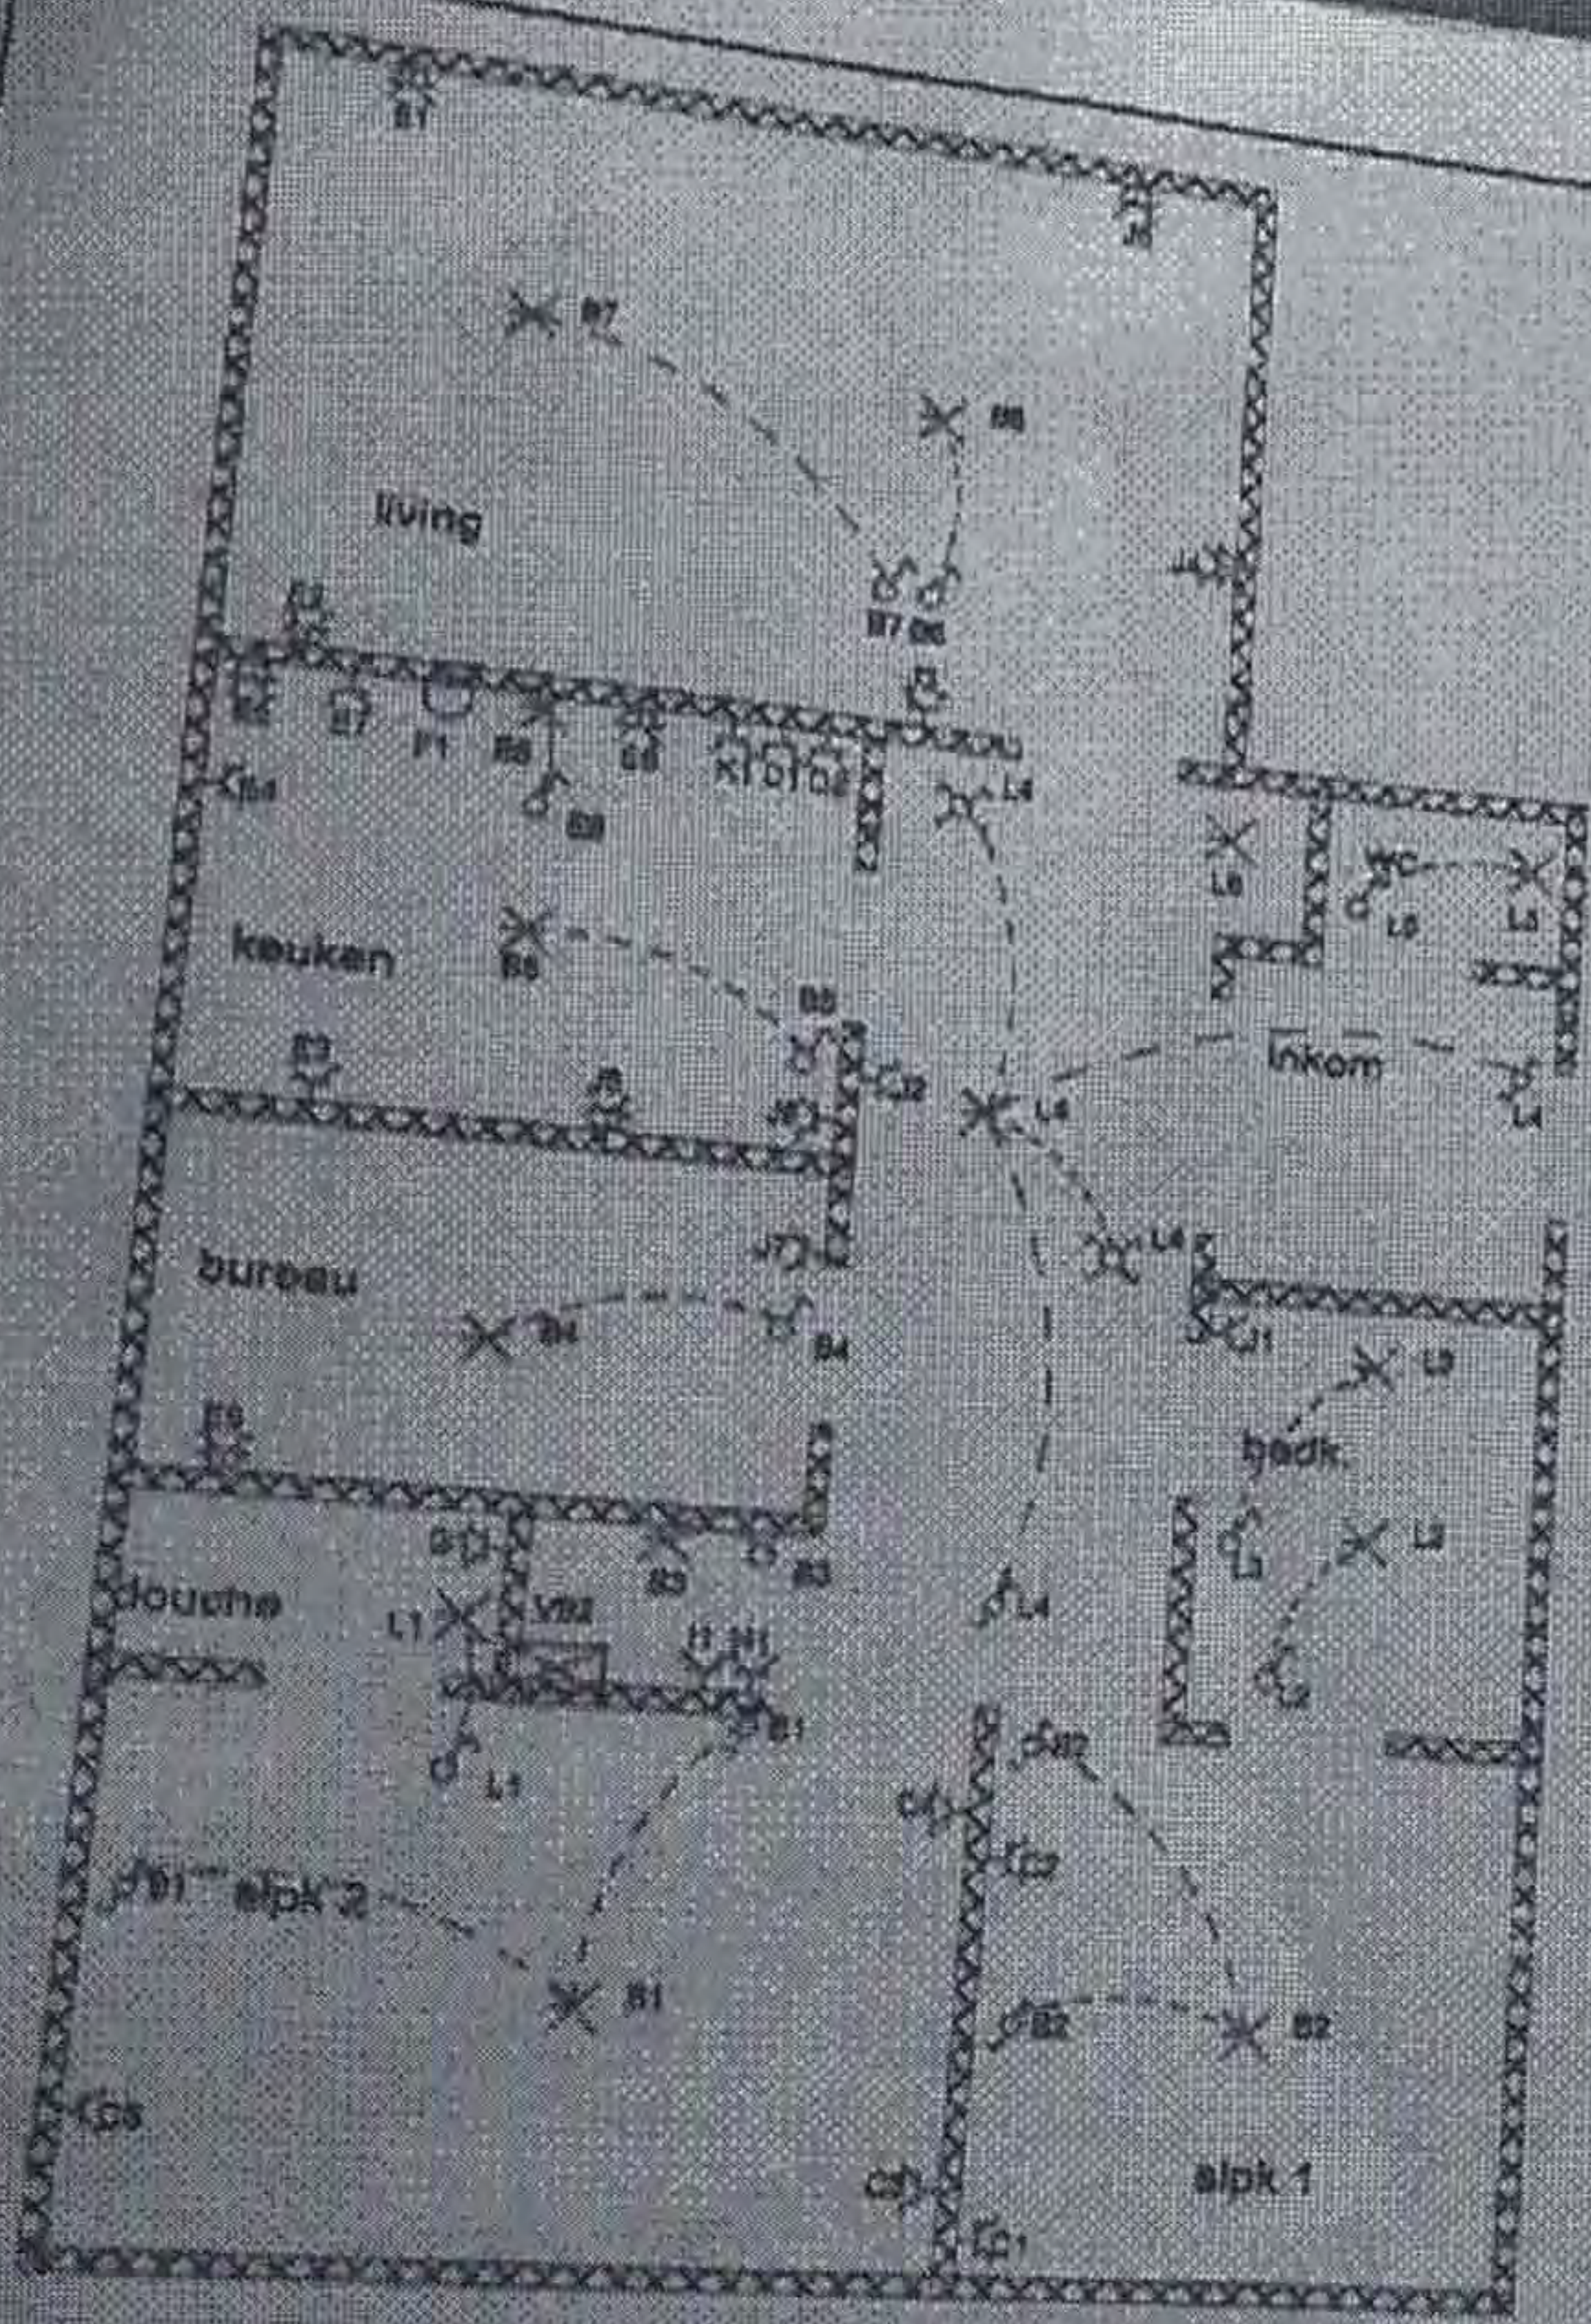

INSTALLATEUR		KEURING	VERF		apportnummer
Naam	De Koning Verhuur	OPDRACHT	Naam	Janssens	3 x 230v
RTS	12/4522/7444	Naam	Straat	Puikendael 91	
Datum	20/12/2024	Datum	Gemeente	Streekl. Dender Veldhoven	
Handtekening		Handtekening	Handtekening		

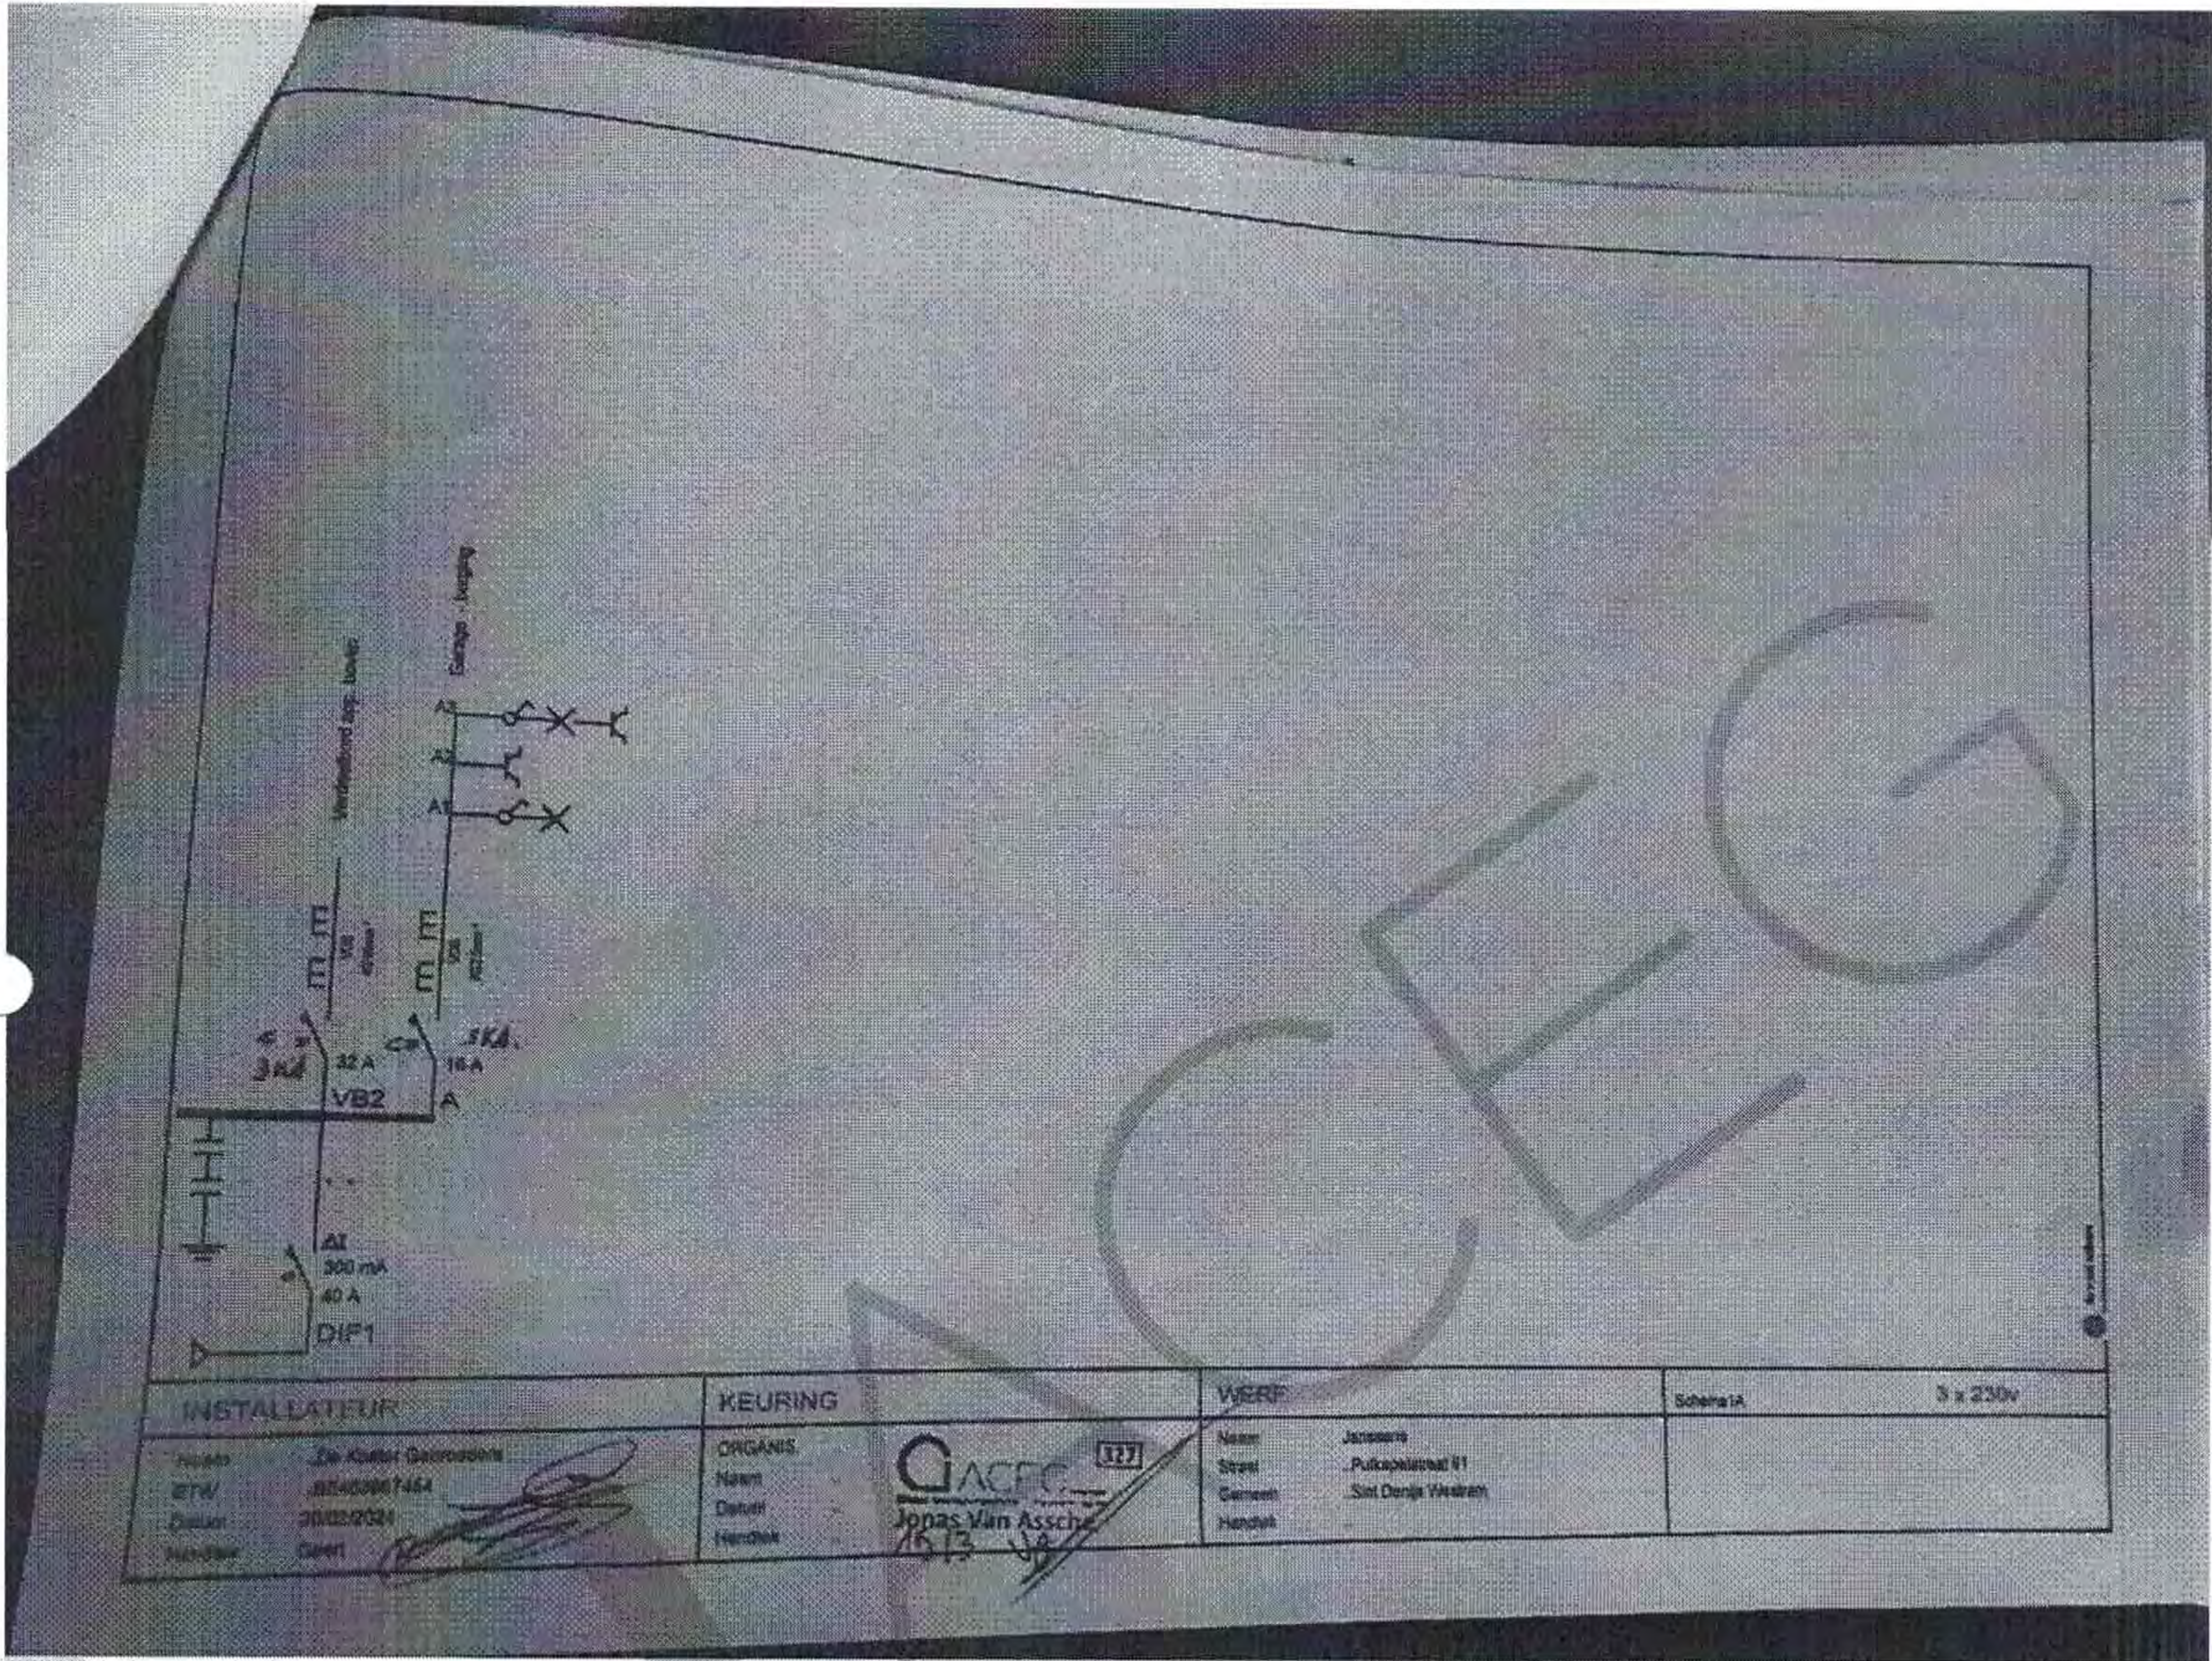

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Schéma 1A	3 x 230v
Namen	De Kuster Gebr. Brouwer	ORGANIS.	GACEC	Namen	Janssens		
BTW	BTW-nummer 1464	Namen	Jonas Van Assche	Straat	Pulkestraat 81		
Datum	20/02/2024	Datum	15/3	Gemeente	Sint-Denijs-Westrem		
Handtekening	Geert	Handtekening		Handtekening			

