

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☒ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

1
PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
Verantwoordelijke voor de werken :
Installatie :
Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>Amolux</u>	Naam, voornaam : <u>Amolux</u>	
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>Canberg 44</u>	<u>iden</u>
BTW nr.: BE <u>880.684.081</u>	Post nr. + Stad : <u>9400 Melle (Vlaanderen)</u>	
	Tel. :	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwaring	☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			☐ Art ...	☐ Art	☐ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>09370225</u>	meterstand dag : <u>9571</u>	nacht : <u>8759</u>
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr. : meterstand :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type <u>KVB</u>	☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>13</u>
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>22.81</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>25</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>- geen inbreuken vastgesteld</u>	
☐ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>[Handwritten signature]</u>	
☐ Nihil		
Opmerkingen	<u>Niet alle verlichting aangebracht</u>	Visum DNB of aangestelde :
☐ Nihil		

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie	<u>voldoet</u>	☐ voldoet niet	aan het AREI.
☐ De bestaande installatie	<u>voldoet</u>	☐ voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór
08/02/2036 (*)

☒ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

Agent bezoeker :

 Naam : Debbore S. Agent nr. : 3553 Datum : 08/02/2011


 Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) : 2 ☒ Eéndraadsschema('s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

2xVB 4x10mm²

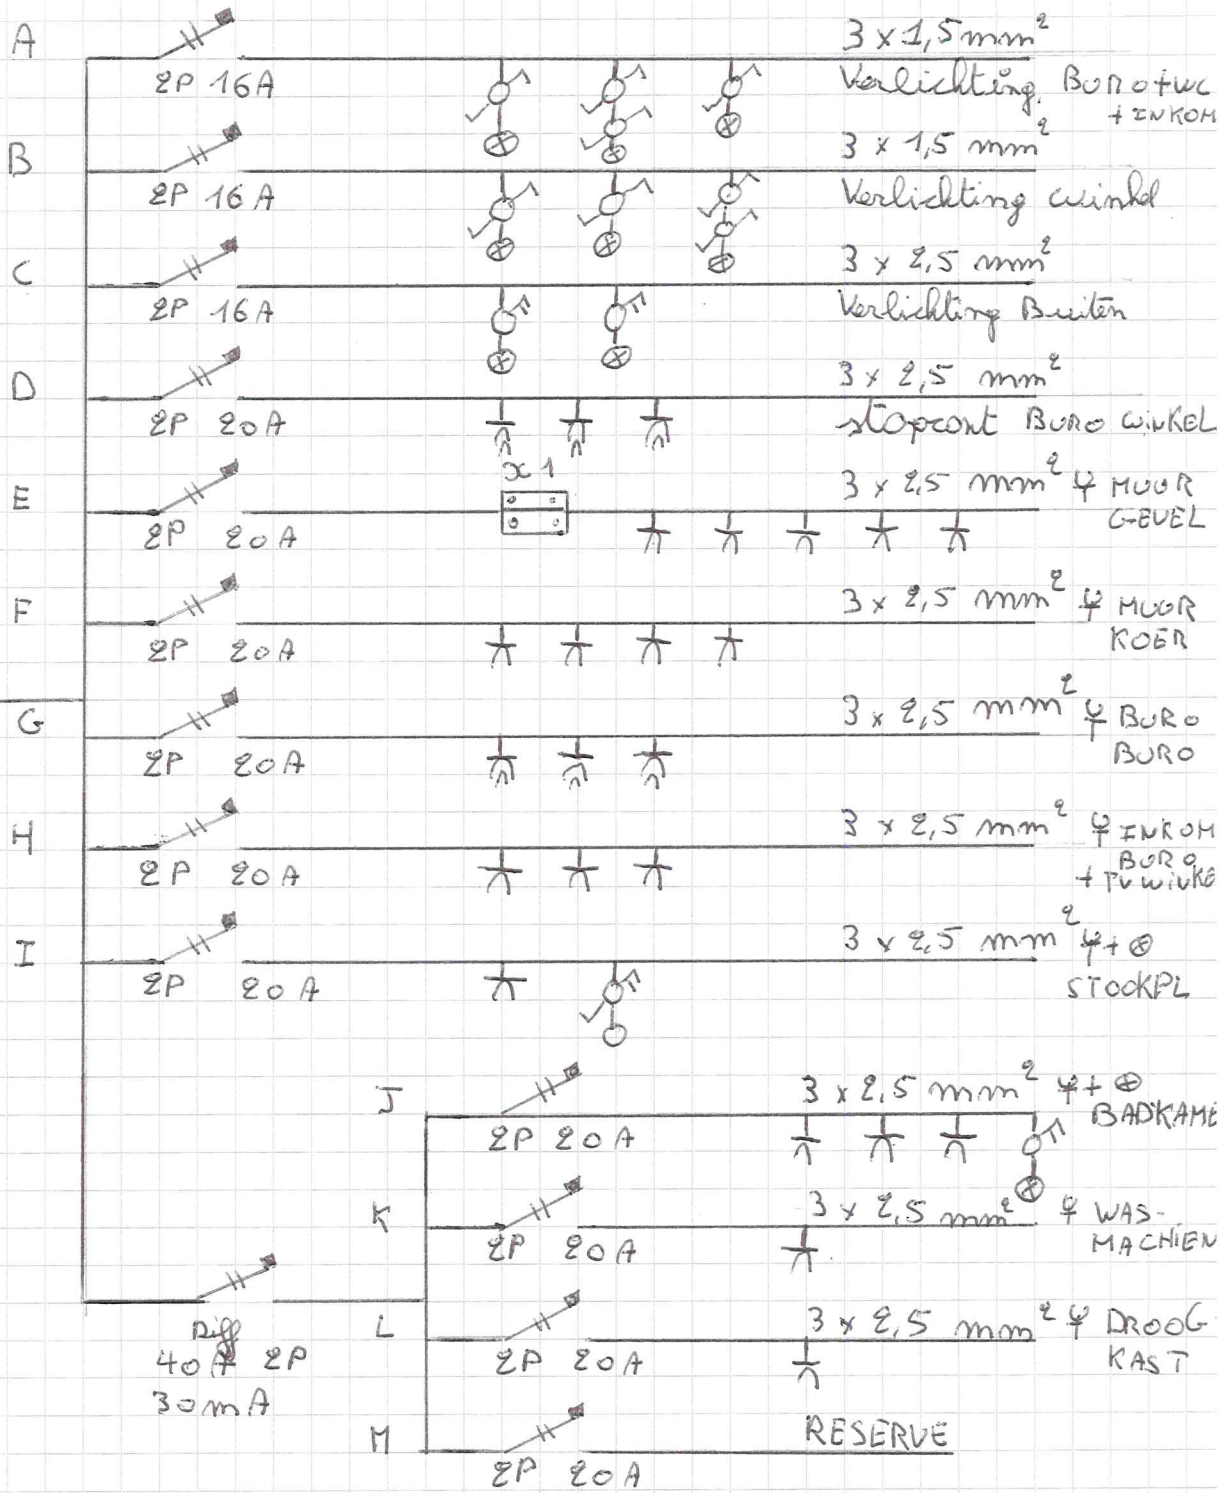

Steve DEXHOREZ
Inspecteur Elektriciteit
3553

[Signature]
8/2/11 P1/4

x 1



RESERVE NAAR
SCHAKEL AARS
ACHTER BUREAU

Ⓐ 16A ⊕ BUNO

Ⓑ 16A ⊕ WINKEL

Ⓒ 16A ⊕ BUITEN

Ⓓ 20A ♀ BUNO WINKEL

Ⓔ 20A ♀ MUUR GEVEL

Ⓕ 20A ♀ MUUR KOER

Ⓖ 20A ♀ BUREAU BUREAU

Ⓗ 20A ♀ INKOM BUREAU + ♀ TV WINKEL

Ⓘ 20A ♀ + ⊕ STORAGE

Ⓣ 20A ♀ + ⊕ BADKAMER

Ⓚ 20A ♀ WASMACHINE

Ⓛ 20A ♀ DROOG-KAST

Ⓜ 20A RESERVE

WINKEL

