

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 18/01/2023 **Uitgiftedatum verslag:** 18/01/2023
Verslagnummer: 0160-230118-05

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 09 252 45 45 E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0160

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: CHARLIE'S 3D TECHNOLOGIES
Adres: DIJKSTRAAT 15, 9700 OUDENAARDE
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: CHARLIE'S 3D TECHNOLOGIES
Adres: STATIONSSTRAAT 46, 9700 OUDENAARDE
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ELEKTRICITEITSWERKEN WITTEBROODT
Adres: BEEKSTRAAT 17, 9790 WORTEGEM-PETEGEM
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: CHARLIE'S 3D TECHNOLOGIES
Adres: STATIONSSTRAAT 46, 9700 OUDENAARDE
EAN- code:
Nummer teller: 1SAG3100139477
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: werkeenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4),
Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020, Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
2 Het stopcontact in de kelder was op moment van de controle nog niet geplaatst wegens inbouw in kast.
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 15 + 20 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie stroombaanschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 10 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Document met uitwendige invloeden: zie bijlage

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie bijlage


Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: zie plannen

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: mondeling meegedeeld

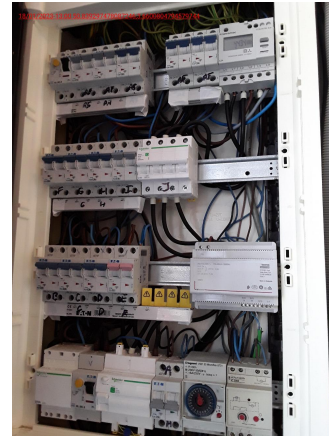

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 06.20 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: >05.00 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen



Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 18/01/2028

Tijdstip van afwerking:

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum
