

Datum(s) van controle: 23/01/2021 Verslagnummer: 123/210-123/01 Uitgiftedatum verslag: 23/01/2021

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen vzw Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel. nr. + e-mailadres regionaal kantoor: zie keerzijde Ondernemingsnummer: 0406.486.616
O/ref.: 123/210-123/01 U/ref.: _____ Agent-bezoeker nr.: 123

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: Medische Medische Elke
Adres: Arduyden 24, Dessel
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: Wde
Adres: Wde
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Wde
Adres: Wde BTW-nummer: 0669 507 22P

Identificatie van de elektrische installatie:

Adres: Arduyden 24 EAN-code: _____
Nummer teller: 34805010 Private hoogspanningscabine: ja nee
Type installatie: ☒ wooneenheid ☐ werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel ☐ technische lokalen van een residentieel geheel ☐ werfinstallatie ☐ gedecentraliseerde productie-installatie ☐ andere installatie: _____

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:

☒ gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4) ☐ gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) ☐ controlebezoek (6.5) ☐ controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1) ☐ controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2) ☐ vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3 of 8.4.4)Datum van de uitvoering van de installatie: ☐ vóór 01/10/1981 ☒ vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 ☐ vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle: _____

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 – KB 08/09/2019: ☐ nihil ☒ toepassing van de afwijkingen van deel 8 van Boek 1 – KB 08/09/2019☐ Andere wettelijke kaders: voorschriften DNB – andere: _____

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 230 V
Type van de aardelektrode: aardingslus – aardingsbaren – aardingspen – horizontaal, verticaal of schuin in de grond gedreven geleider - niet geplaatst – onbekend – ander systeem: _____ Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB Doorsnede: 10 mm²
Aantal stroombanen: 36 (reserve inbegrepen) Type van het aardverbindingssysteem: TT, TN-S, TN-C, IT, andere:
Aantal borden: 1 Nominale waarde bescherming aansluiting: 40 A Type algemene schakelaar: 24/63/03
Beschrijving: Type A, 3P, 4P, 2P
Schema's en plannen van de installatie: zie andere plannen

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 6,6 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 50 Mohm
Test differentieelstroominrichtingen: via testknop: OK/NOK/niet getest via foutlus: OK/NOK/niet getest
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK/NOK
Vastgestelde inbreuken en/of opmerkingen: aanOgmer: Nota overgangslapplan met af 123/210-123/01
aan datum 23/01/2021

Besluit van de controle:

☒ 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 – KB 08/09/2019.De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 23/01/2026☒ De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.☒ De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden (of waren) verzegeld.☐ 2. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019.


In geval van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname, mag geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

☐ 3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1- KB 08/09/2019.☐ Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan uiterlijk vóór _____. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.☐ 4. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 – KB 08/09/2019. De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren. De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.


Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):


Verwijzing naar de reglementaire voorschriften: zie keerzijde

A	40A 30Ma	verliesstroom voor B,C,D,E,F,G,H,I
B	20A	stopcontacten slp boven
C	20A	licht slaapkamer boven
D	20A	licht trap tussen 1 en 2
E	20A	stopcontacten in slaapkamer 2 en wc
F	16A	stopcontacten in slaapkamer 1 en 2
G	16A	stopcontacten dressing en in dressing
H	16A	licht berging boven
I	16A	rolluiken boven
J	40A 30Ma	verliesstroom K,L,M,N,O,P,Q,R
K	16A	stopcontacten living kant gebuur
L	16A	licht wc aan bad en licht living en gang achterdeur en keuken
M	16A	stopcontact badkamer
N	16A	licht badkamer en ventilatie
O	20A	licht tussen trap van 0 en 1
P	20A	stopcontacten berging boven en slaapkamer
Q	16A	licht kamer 1 en 2
R	16A	stopcontacten hoek bureel
S	40A 30Ma	verliesstroom T-U-V-W-X-Y-Z-A1
T	20A	rolluik vooraan
U	20A	dampkap en stopcontacten naast lage kast
V	20A	stopcontact boiler onder watersteen en licht boven tablet
W	20A	stopcontact living rechts
X	20A	vaatwas
Y	20A	oven beneden bovenst stopcontact
Z	16A	stopcontact boven in kast en naast hogekast keukenen in eerstekast
A1	16A	ovenbeneden onderst stopcontact
B1	63A300	verliestroom 300 mA algemeen
C1	40A30mA	verliestroom 30 mA D1-E1-F1-G1-H1-I1-J1
D1	20A	stopcontact garage
E1	20A	stopcontact garage
F1	20A	stopcontacten TV
G1	16A	chauffage
H1	16A	stopcontacten boven werkblad keuken
I1	16A	licht garage
J1	32A	kookplaat
K1	40A30mA	verliesstroom L1-M1-N1-O1-P1-Q1-R1-
L1	20A	wasmachine
M1	20A	droogkast
N1	16A	stopcontacten naast kast
O1	16A	gang achter, living zijkant achter, rolluik achter
P1	16A	licht kelder, inkom beneden, licht berging elektiekkast
Q1		schakelaar berging
R1		schakelaar kelder
S1		schakelaar gang vooraan
T1		reserve




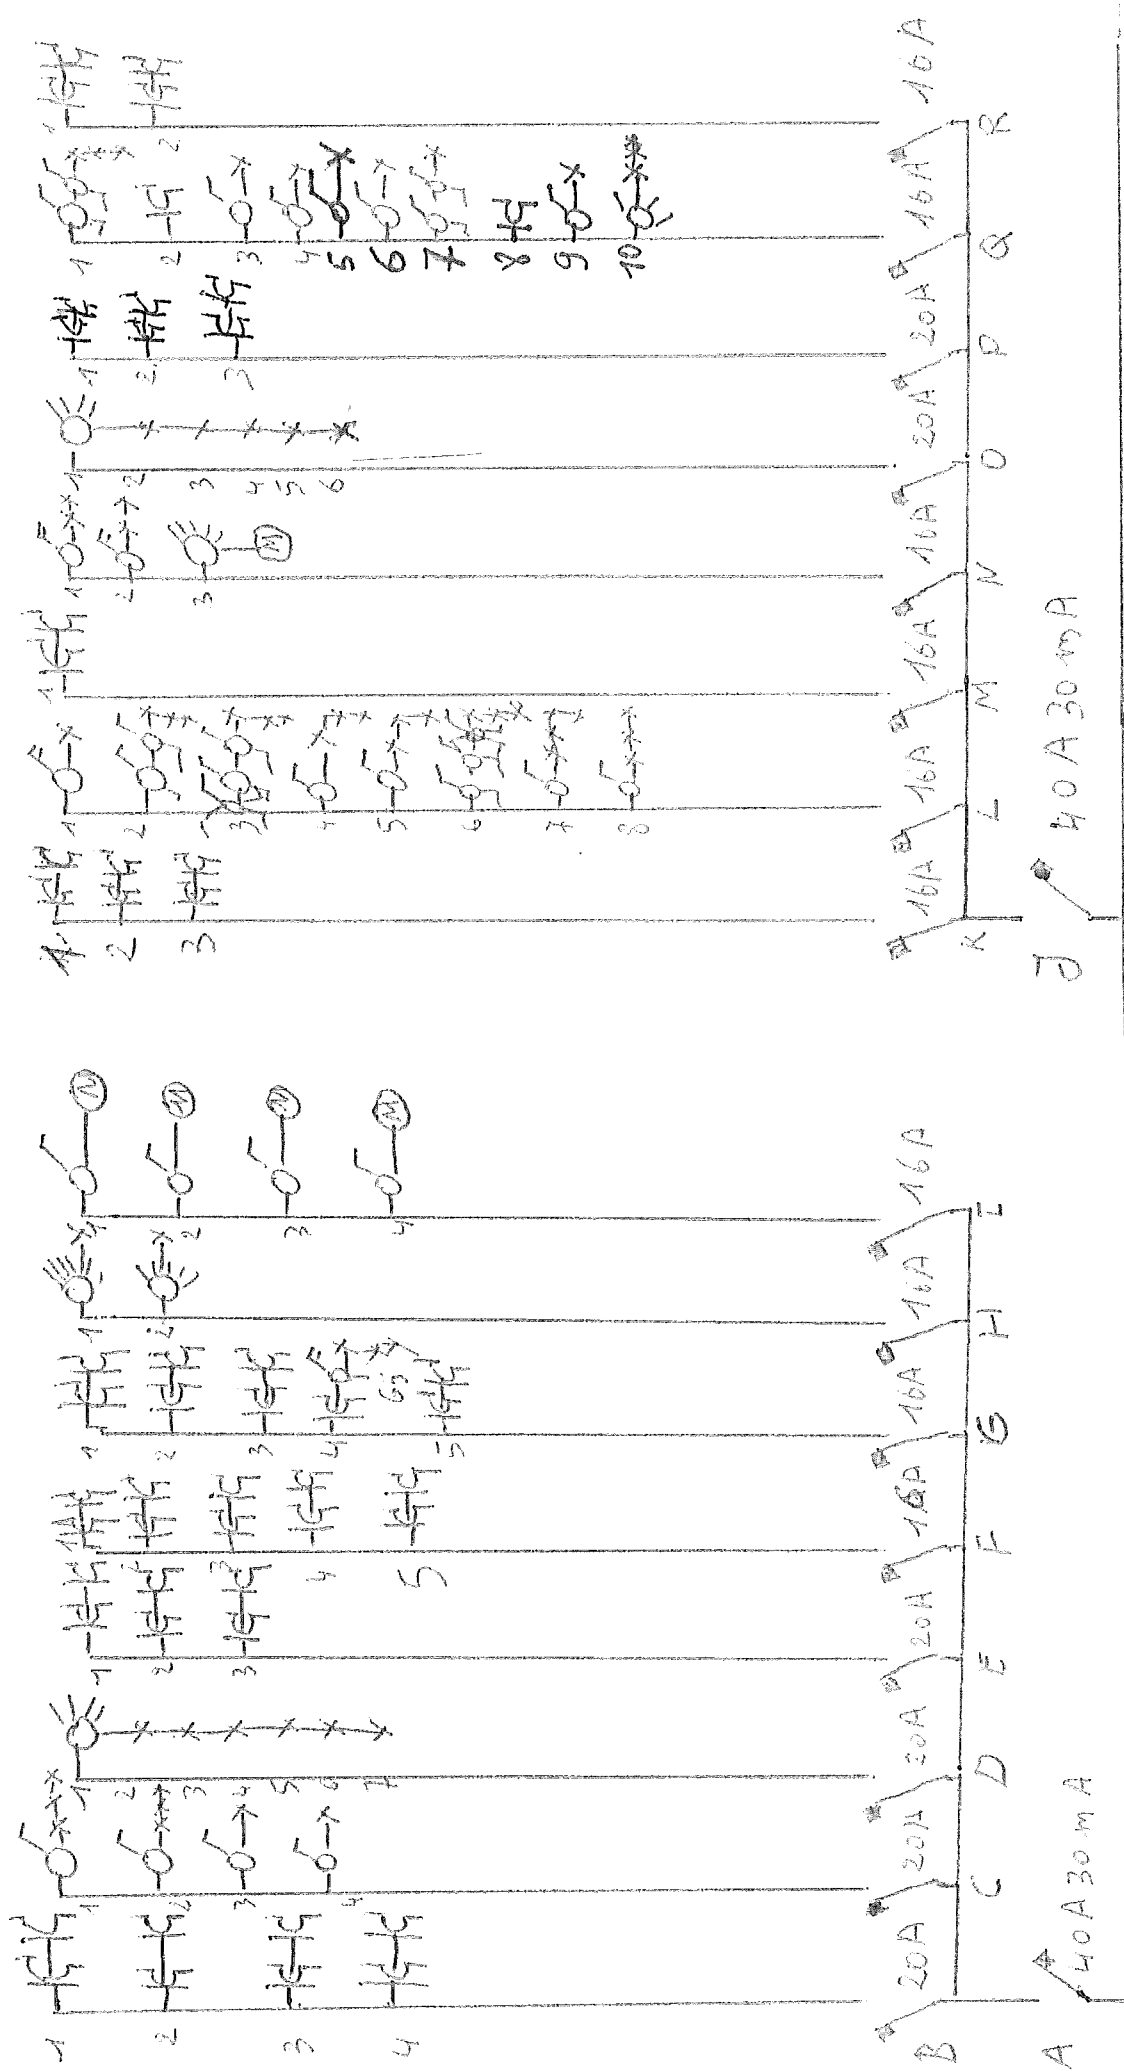


B_q 63A 300mA

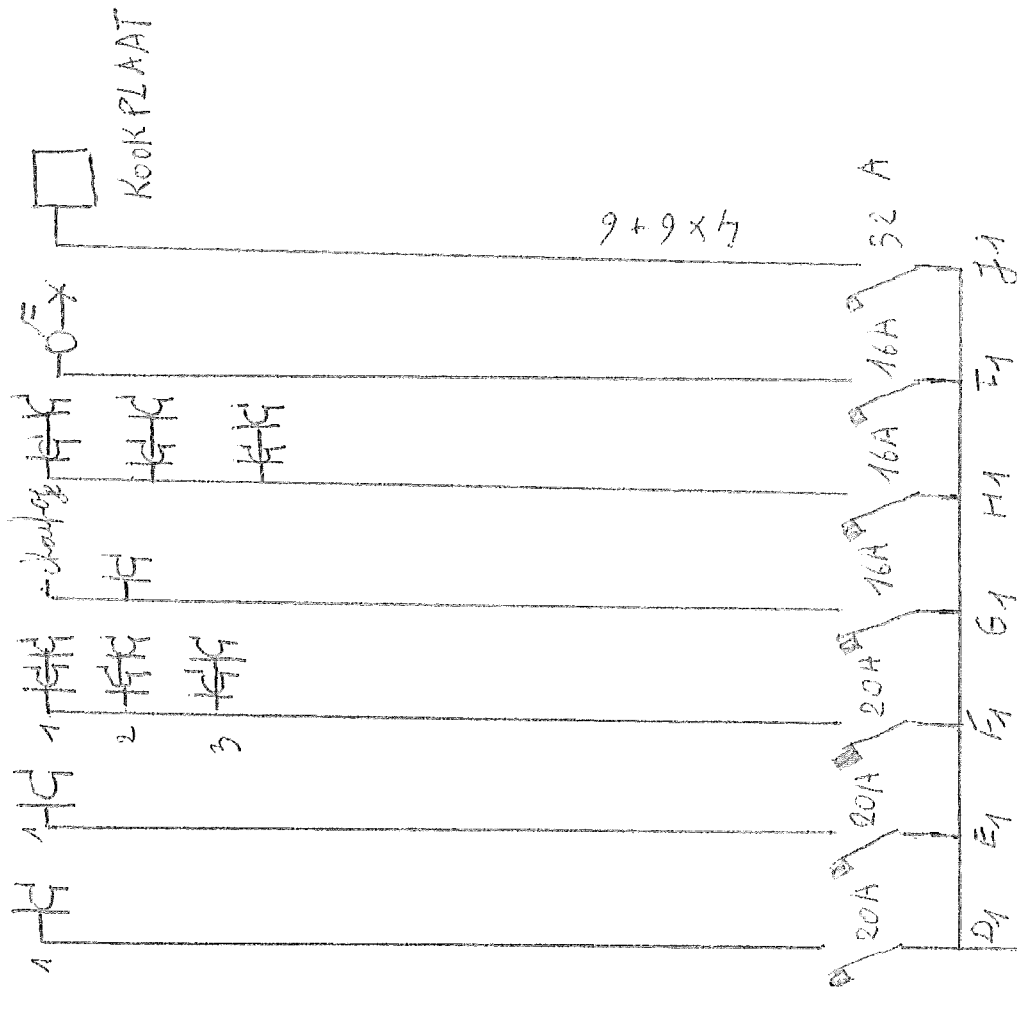

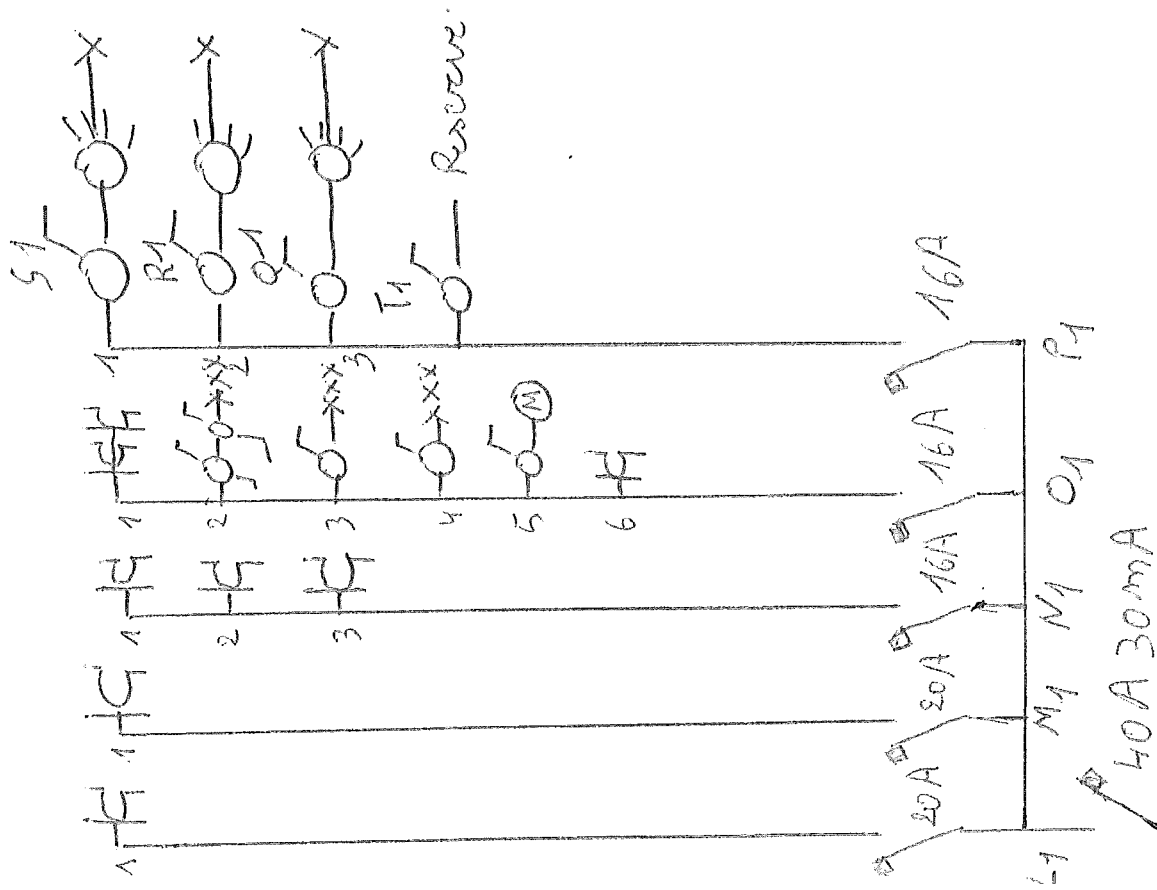



Stopcontacten Beneden



Werkbank

Living

Salon



Werkbank

Werkbank

Werkbank

M

Licht Berechnen

(M) T

O⁻
T

X_{L7} X_{L7}

X_{L7} X_{L7}

X_{L8}

X_{L8} V₁ X_{L8} X_{L8}
V₁

X_{L7}
X_{L8}
X_{L3}

X_{P11}
P₁₁

X_{P12}
P₁₂

X_{L5}

X_{L3}

X_{L4}

X_{L5}

Living X_{L3}

X_{L4} X_{L4} X_{L5} X_{L2} X_{L3}

X_{P13}
P₁₃

X_{L5}

X_{L3}

X_{L4}

N₂ N₂
X X

X_{O13}

X_{L2}

X_{O14}

X_{N1}

X_{O13}

Salon X_{L2}

X_{O14}

X_{L3} X_{L2} X_{L6}

X_{N1}

X_{N2}
X_{N1}

X_{L1}

X_{O13}

X_{L2}

X_{O14}

X_{O15} X_{O12} X_{O13} X_{O14}

X_{L6} X_{L6}

X_{O12}

(M) 0.15

0.12 X

X_{L6}


X_{L6}

0.12 X

X_{O12}
X_{L6}


5 Top contacten 1e verdiep

Hoogte 2m 30

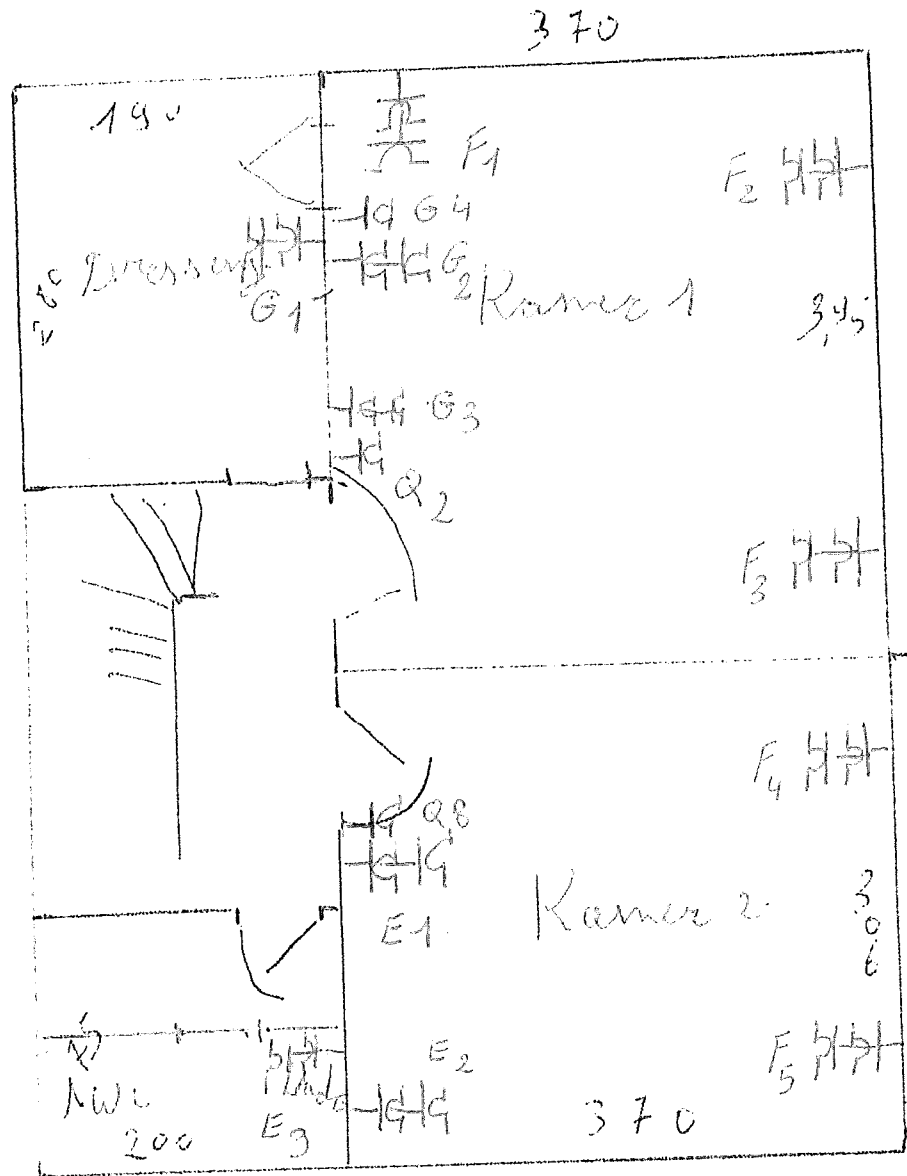

Lucht 1^e verdieping

Hooftele 2m 30

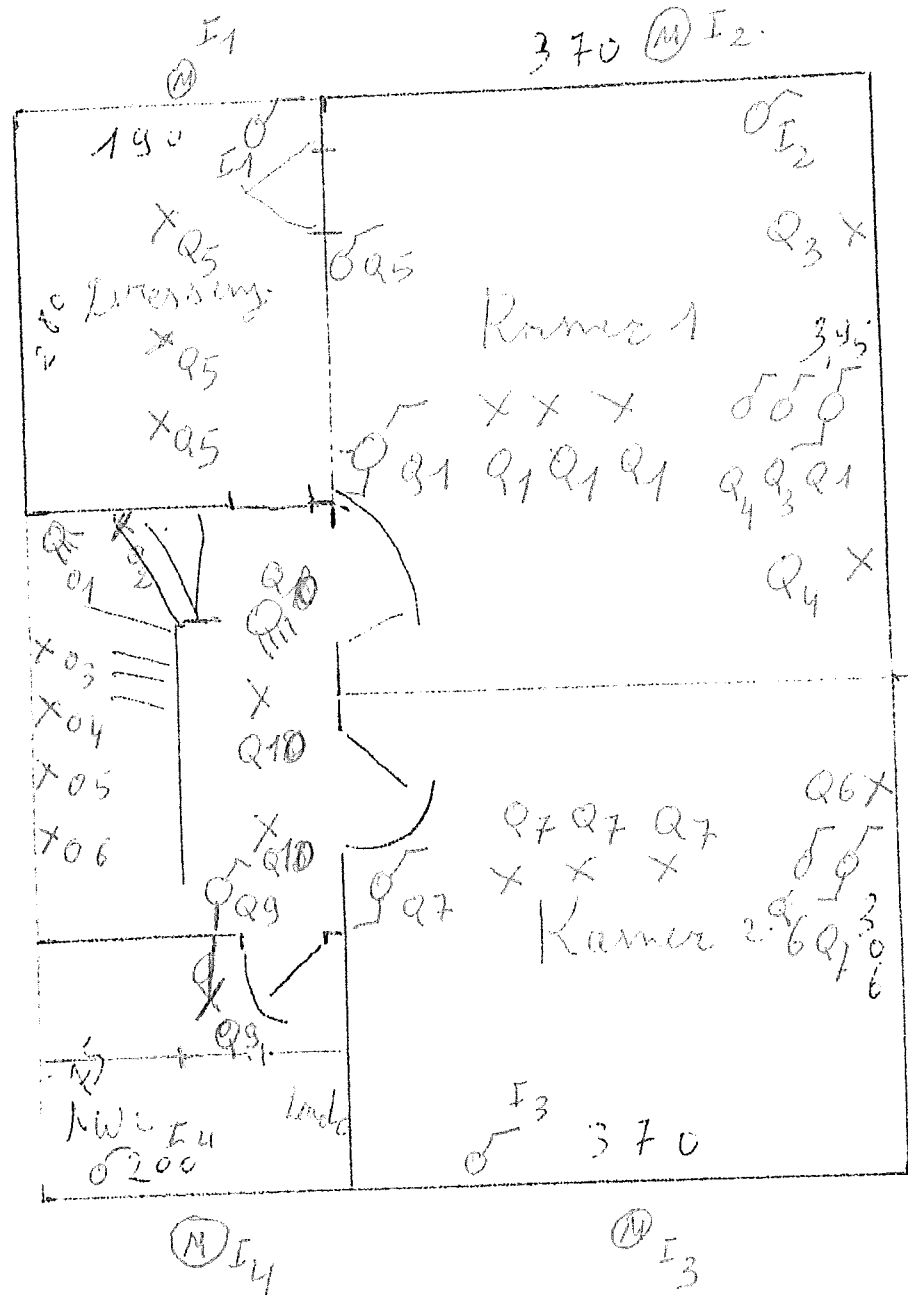

STOPCONTACTEN ZULPER

