

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 31/10/2024

Inspecteur: Kevin Dubois

Mentor:

Installateur: CEE-PEE-CEE BV

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 1002 686 030

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251360

Datum verslag: 31/10/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Felix Timmermansstraat
Huisnummer 4
Busnummer
Postcode 3191
Gemeente Hever
Land België

Eigenaar

Naam Siebe Vander Henst
Straatnaam Felix Timmermansstraat
Huisnummer 4
Busnummer
Postcode 3191
Gemeente Hever
Land België

Installateur

Naam CEE-PEE-CEE BV
BTW nr. BE 1002 686 030
Telefoonnummer 0486 46 03 95
E-mail tom@c-p-c.be

Type : PV-installatie en/of thuisbatterij

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820058129706

Teller Nr.: : 1SAG3100009834



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een PV installatie ≤ 10 kVA en/of thuisbatterij volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.4. en 4.2.4.3. en 7.112. en synergrid C10/11.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: : mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 2

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 6,27 M Ω

RE: 28,9 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	25		2	4
1	C	40		2	10

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK	Eilandwerking	OK

GROENE METER

Fase	Serie Nr	Meterstand	CE markering	MID markering
------	----------	------------	--------------	---------------

OMVORMER

Aantal: 1				
Merk: SolarEdge	Serie: HD Wave 1-Phase	Type: SE4000H	Aansluitingen: 1-phase	
Serienummer: ST2823-07504B97E-BO	Smax (VA): 4000	I AC - nom (A): 17.39		
Curve: C	IN (A): 25	UDC Max > UDC panelen/string: OK	IDC Max > I str1 + I str2 + ...: OK	

FOTOVOLTAISCHE ZONNEPANELEN

Aantal	Merk	Type	Piekvermogen per stuk (Wp)	Totaal Piekvermogen (Wp)
12	Meyer Burger	385wp black	385	4620

THUISBATTERIJ

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 6 Deze controle omvat enkel de PV-installatie.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 31/10/2049
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:23 tot 12:47
De inspecteur Kevin Dubois

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.


De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 31/10/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



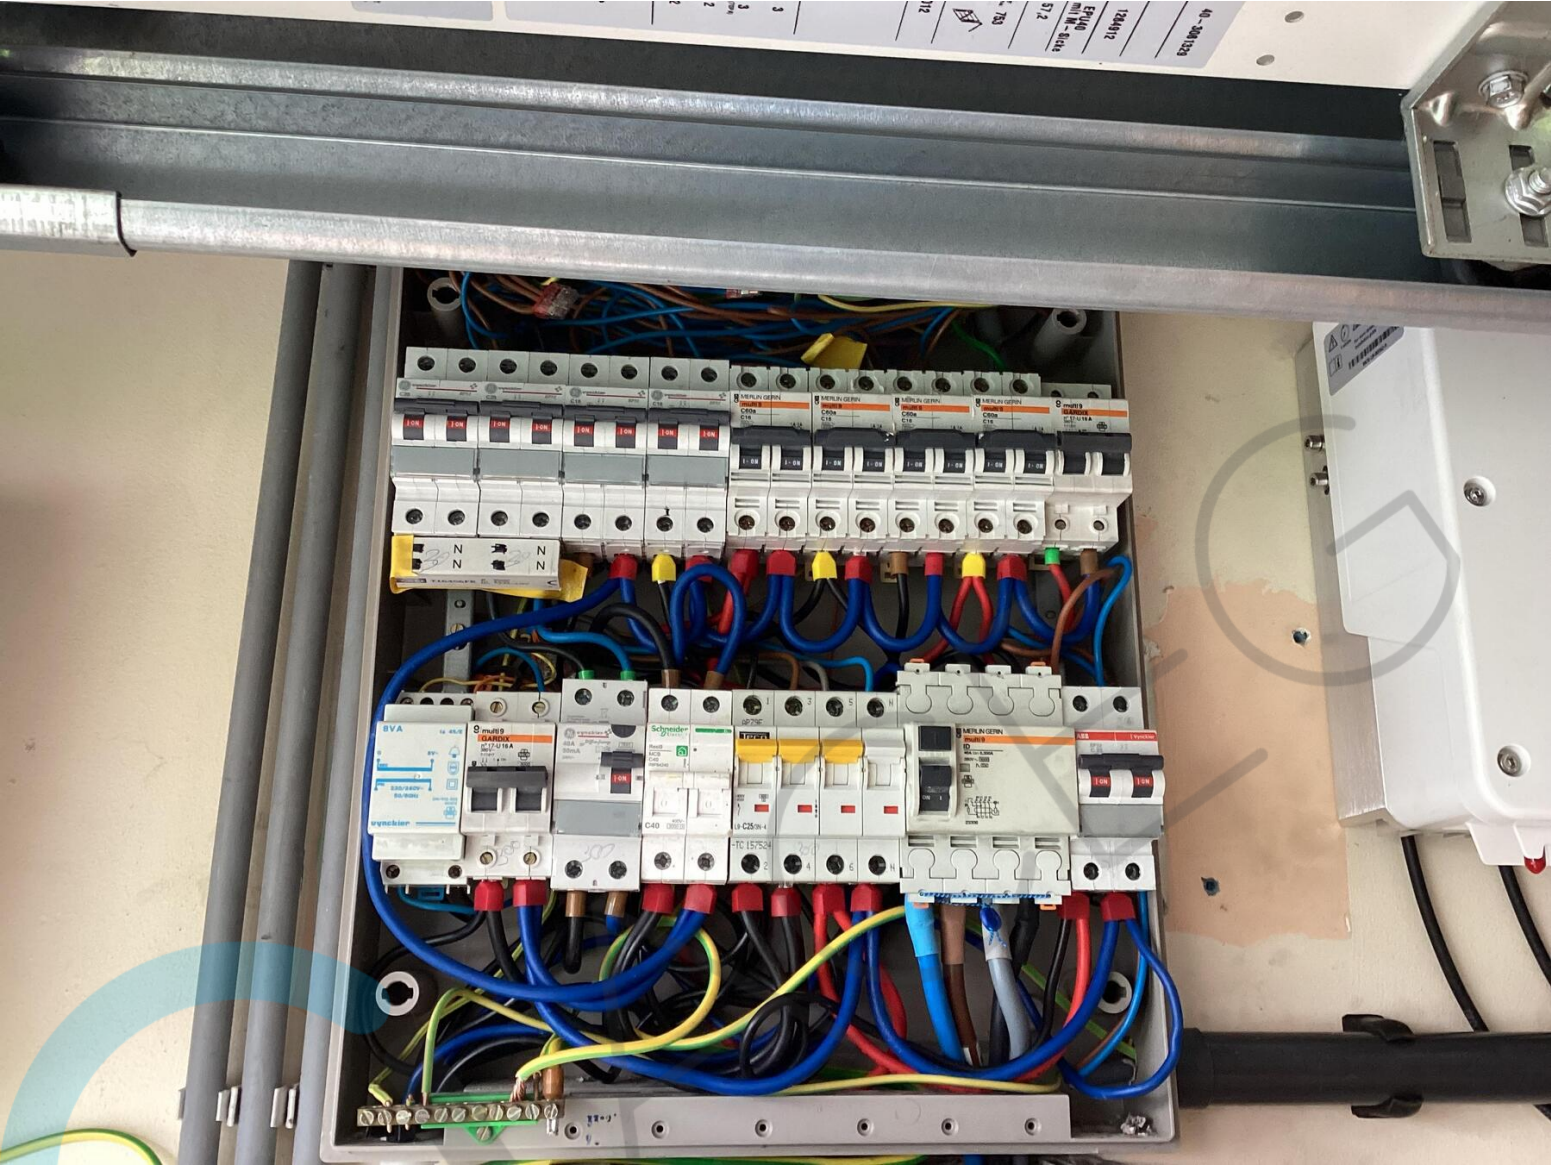















12 x Meyer Burger 385Wp Black op OP S440 = 4620Wp

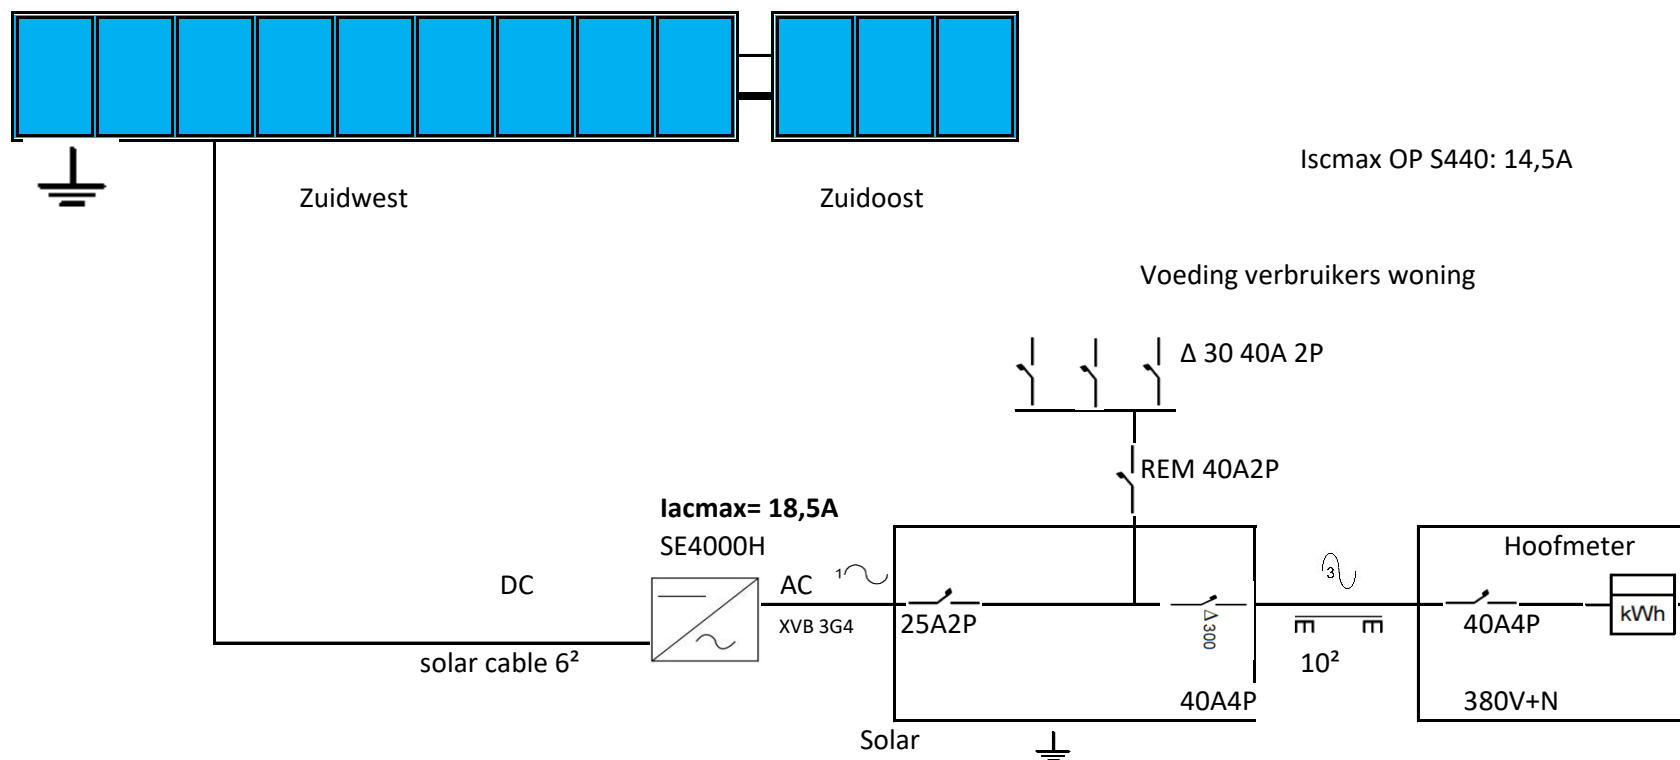


SN omvormer: 7504B97E-B0

Cee-Pee-Cee bv		Fam. Vander Henst	
BTW: 1002.686.030			
Berkenlaan 6		Felix Timmermansstraat 4	
B-3191	Hever	B-3191	Hever

Siebe Vander Henst: 0471468306

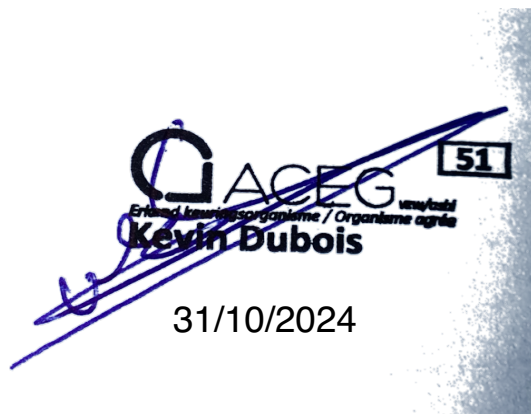

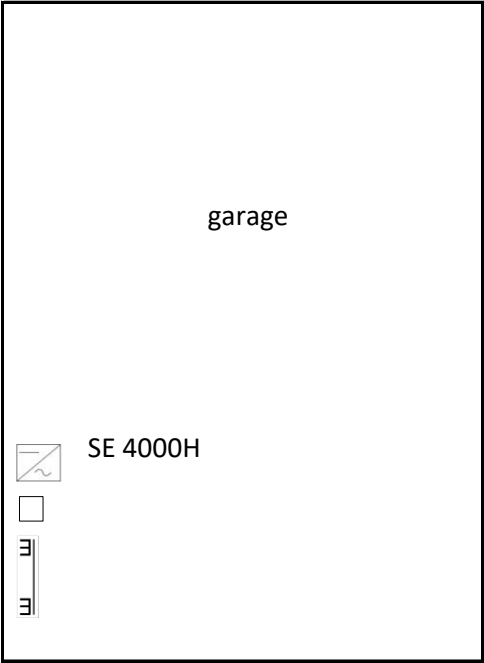


GACEG 
Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé
Kevin Dubois
31/10/2024

Cee-Pee-Cee bv		Fam. Vander Henst	
BTW: 1002.686.030			
Berkenlaan 6		Felix Timmermansstraat 4	
B-3191	Hever	B-3191	Hever
