

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 08/09/2023

Inspecteur: Jo Tijtgat

Mentor:

Installateur: Estelco

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0469 911 847

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: metrel Eurotest MI3155

Serienummer: 21251307

Datum verslag: 08/09/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kerkstraat
Huisnummer 8
Busnummer A
Postcode 8587
Gemeente Spiere-Helkijn
Land België

Eigenaar

Naam Ace Rental
Straatnaam Kerkstraat
Huisnummer 8
Busnummer A
Postcode 8587
Gemeente Spiere-Helkijn
Land België

Installateur

Naam Estelco
BTW nr. BE 0469 911 847
Telefoonnummer +32 477 40 91 46
E-mail Stefan@estelco.be

Type : woning

EAN : 541 448 860 022 057 956

Teller Nr.: : 1SAG1100430838

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Ja

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 19

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 1,10 MΩ

RE: 8,14 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	19	NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	10	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming I_n (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	16		2	1,5
15	C	20		2	2,5
1	C	20		2	-
1	C	25		2	6

Visueel nazicht (algemeen) OK

Directe aanraking OK

Indirecte aanraking OK

Aansluitingen OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Equipotentiale verbindingen OK

Doorsnede geleiders OK

Continuïteit OK

Verlichting / toestellen NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

N Keuken en sanitaire-, evenals definitieve verlichtingstoestellen, waren bij controle nog niet aanwezig.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 8/9/2048



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.



Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.


De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 7

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jo Tijtgaat



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
--------	--------	--------	--------


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 8/9/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



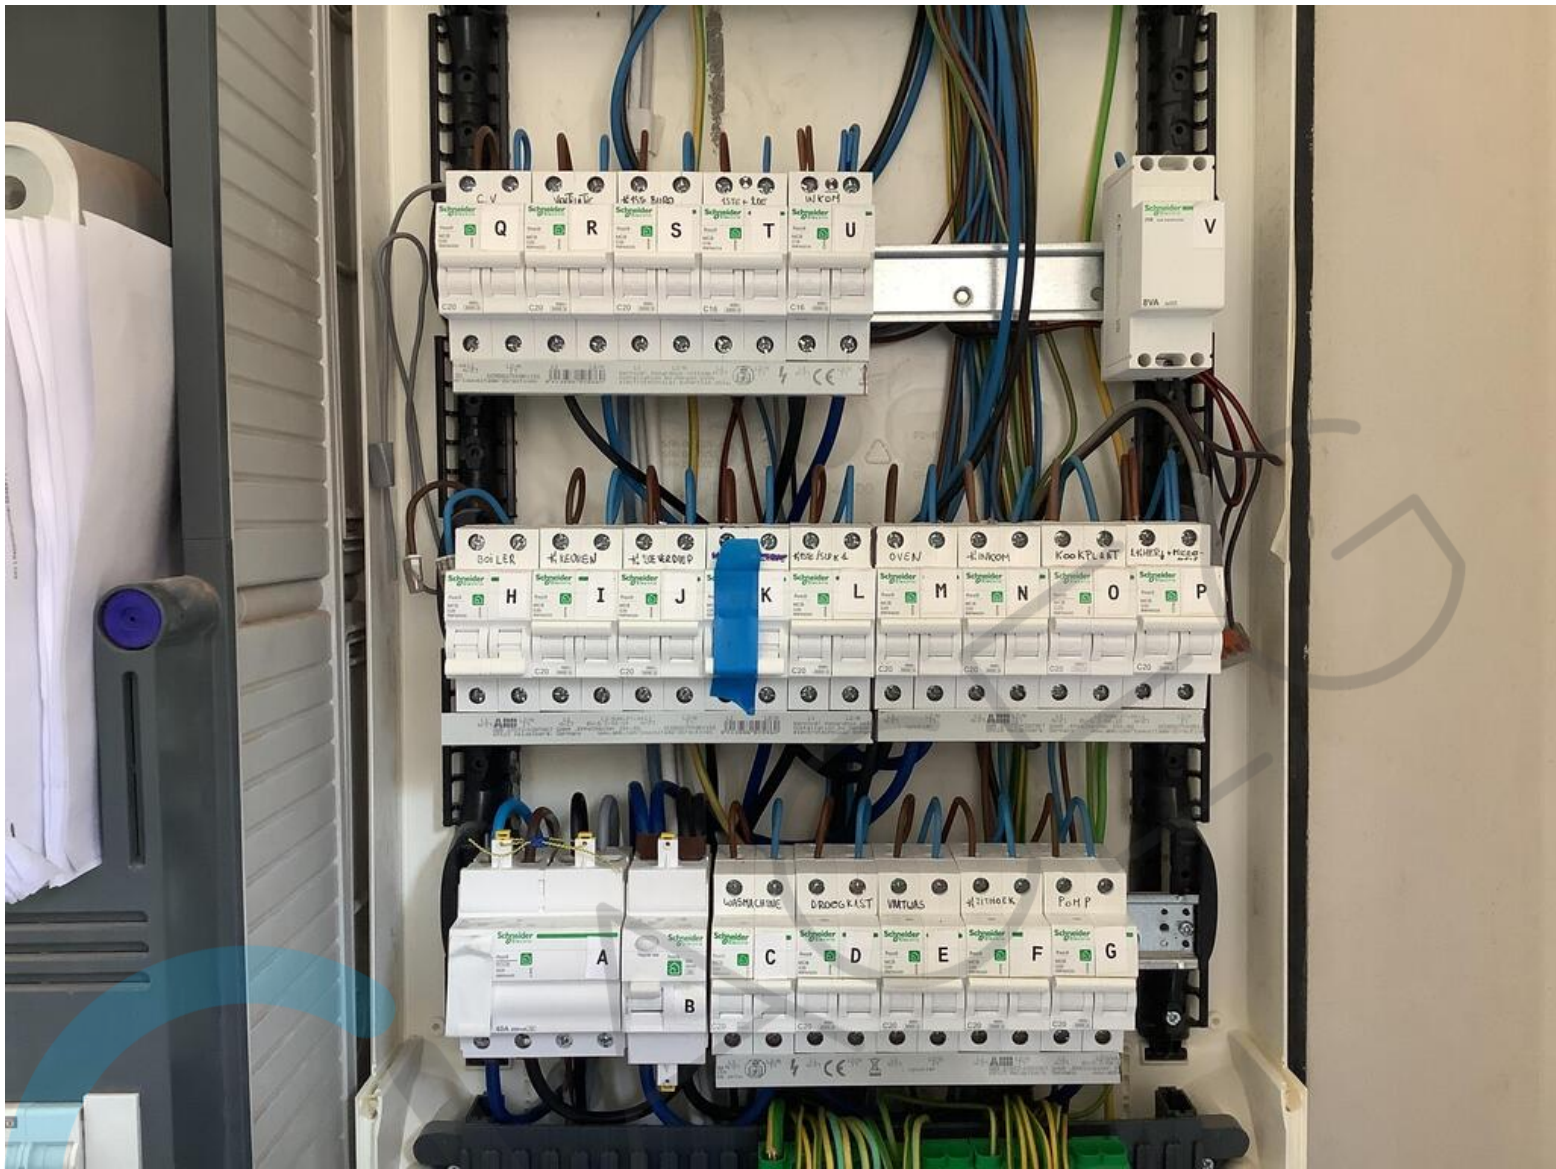

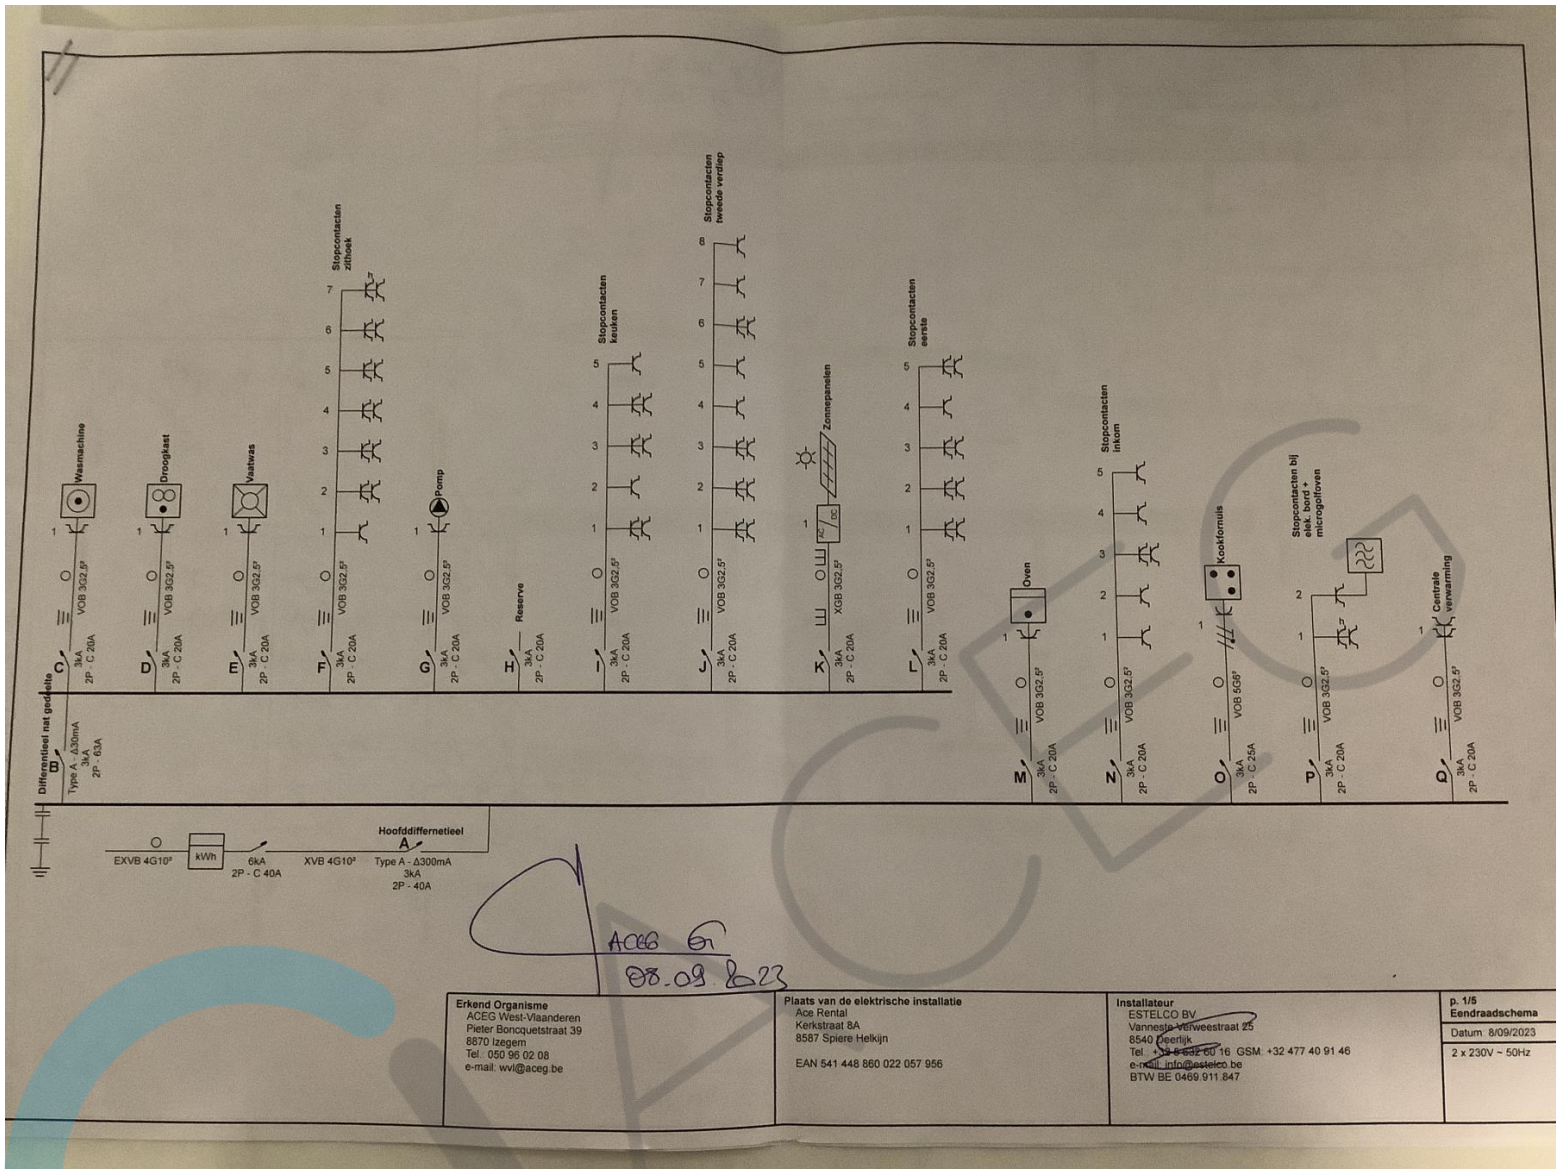

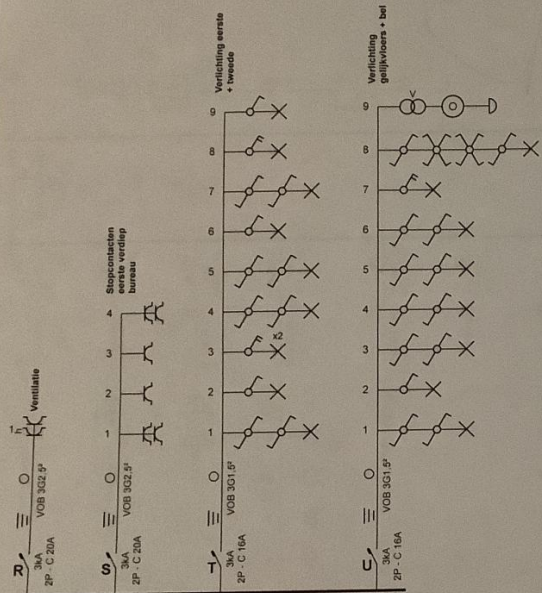


Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Polder Bonquetstraat 39
8570 Izegem
Tel. 050 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be


ACEG
08.09.2023

Plaats van de elektrische installatie
Ace Rental
Kerkstraat 8A
8587 Spiere Hekijn
EAN 541 448 860 022 057 956

Installateur
ESTELCO BV
Vanneste Vennestraat 25
8540 Denderik
Tel. +32 (0) 57 00 36 GSM +32 477 40 91 46
e-mail: info@estelco.be
BTW BE 0469.911.847

p. 2/5
Eendraadschema
Datum: 8/09/2023
2 x 230V - 50Hz

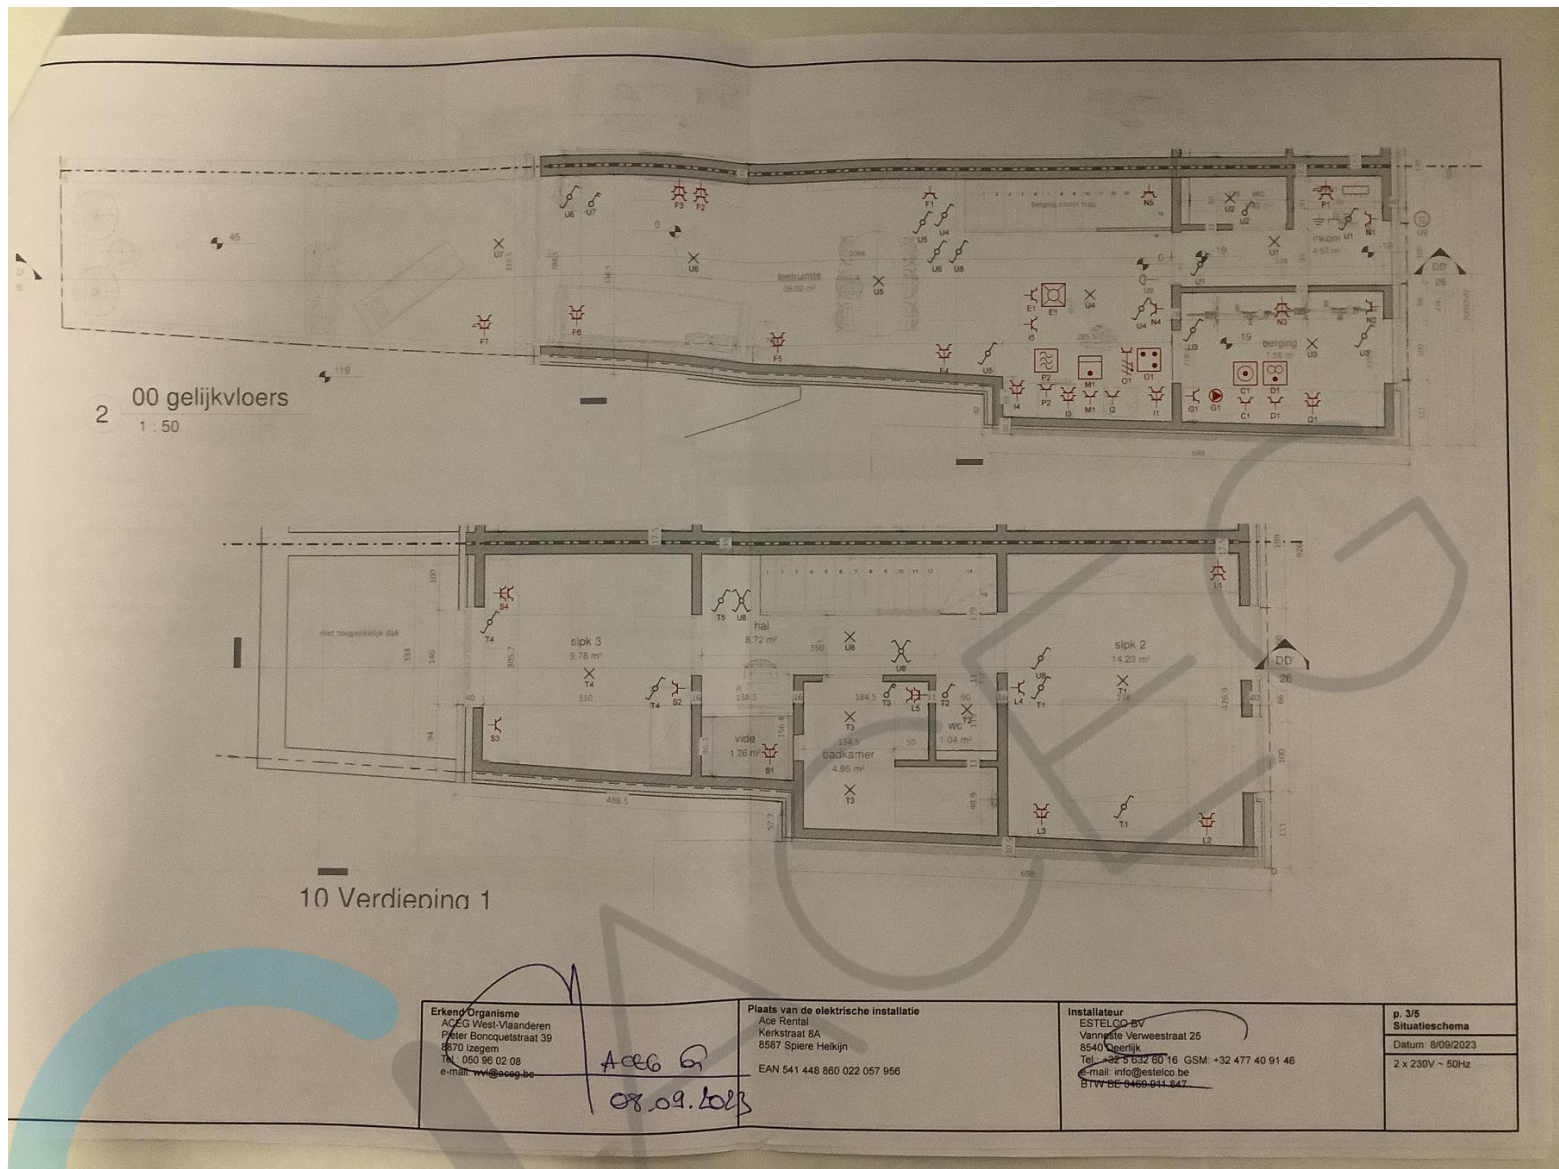

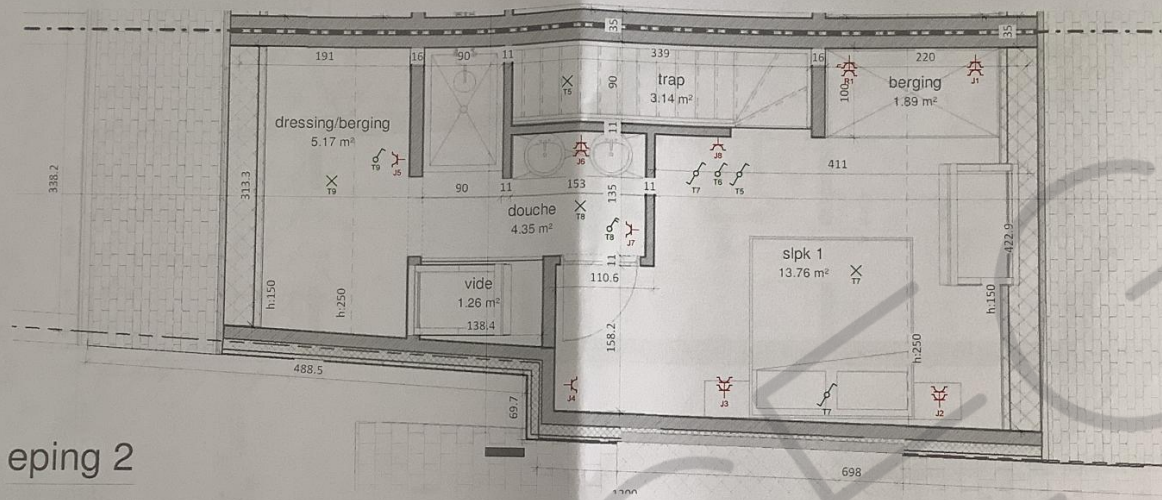

Erkend Organisme ACEG West-Vlaanderen Pieter Bonquetstraat 39 8870 Izegem Tel. 050 96 02 08 e-mail: wvl@aceg.be <i>ACEG</i> <i>08.09.2023</i>	Plaats van de elektrische installatie Ace Rental Kerkstraat 8A 8587 Spiere Heikijn EAN 541 448 860 022 057 956	Installateur ESTELCO BV Vanneste Verweestraat 25 8541 Deerlijk Tel. 050 532 60 16 - GSM: +32 477 40 91 46 e-mail: info@estelco.be BTW BE 0489 911 847	p. 4/5 Situatieschema Datum: 8/09/2023 2 x 230V - 50Hz
---	---	--	---



