

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

Datum keuring: 08/09/2023

Inspecteur: Jo Tijtgat

Mentor:

Installateur: Estelco

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0469 911 847

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: metrel Eurotest MI3155

Serienummer: 21251307

Datum verslag: 08/09/2023

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kerkstraat  
Huisnummer 8  
Busnummer  
Postcode 8587  
Gemeente Spiere-Helkijn  
Land België

#### Eigenaar

Naam Ace Rental  
Straatnaam Kerkstraat  
Huisnummer 8  
Busnummer  
Postcode 8587  
Gemeente Spiere-Helkijn  
Land België

#### Installateur

Naam Estelco  
BTW nr. BE 0469 911 847  
Telefoonnummer +32 477 40 91 46  
E-mail Stefan@estelco.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541 448 860 021 936 375

Teller Nr. : 1SAG1100430838



#### Aard onderzoek:

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.  
Ja

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 20


Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 454 MΩ

RE: 8,18 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| $I\Delta$ (mA) | $I_n$ (A) | $I_n$ - andere (A) | $I_{\Delta t}$   | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|----------------|-----------|--------------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300            | 40        |                    | 22,5kA2s (3000A) | A    | 20                 | OK   | OK    |
| 30             | 63        |                    | 22,5kA2s (3000A) | A    | 7                  | OK   | OK    |

BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming $I_n$ (A) | (andere) | P | Sectie (mm²) |
|----------------|-------|-----------------------|----------|---|--------------|
| 2              | C     | 16                    |          | 2 | 1,5          |
| 16             | C     | 20                    |          | 2 | 2,5          |
| 1              | C     | 20                    |          | 2 | -            |
| 1              | C     | 25                    |          | 2 | 6            |

|                             |    |                                 |     |                     |    |
|-----------------------------|----|---------------------------------|-----|---------------------|----|
| Visueel nazicht (algemeen)  | OK | Directe aanraking               | OK  | Indirecte aanraking | OK |
| Aansluitingen               | OK | schema in bijlage door Aceg vzw | NA  |                     |    |
| Equipotentiale verbindingen | OK | Doorsnede geleiders             | OK  |                     |    |
| Continuïteit                | OK | Verlichting / toestellen        | NVT |                     |    |

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

N Keuken en sanitaire-, evenals definitieve verlichtingstoestellen, waren bij controle nog niet aanwezig.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 8/9/2048
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.


De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 7

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jo Tijtgat



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

| Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|


Stappenplan voor een installatie die conform is:


| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                                                | Stap 3                                                   | Stap 4                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 8/9/2048 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |









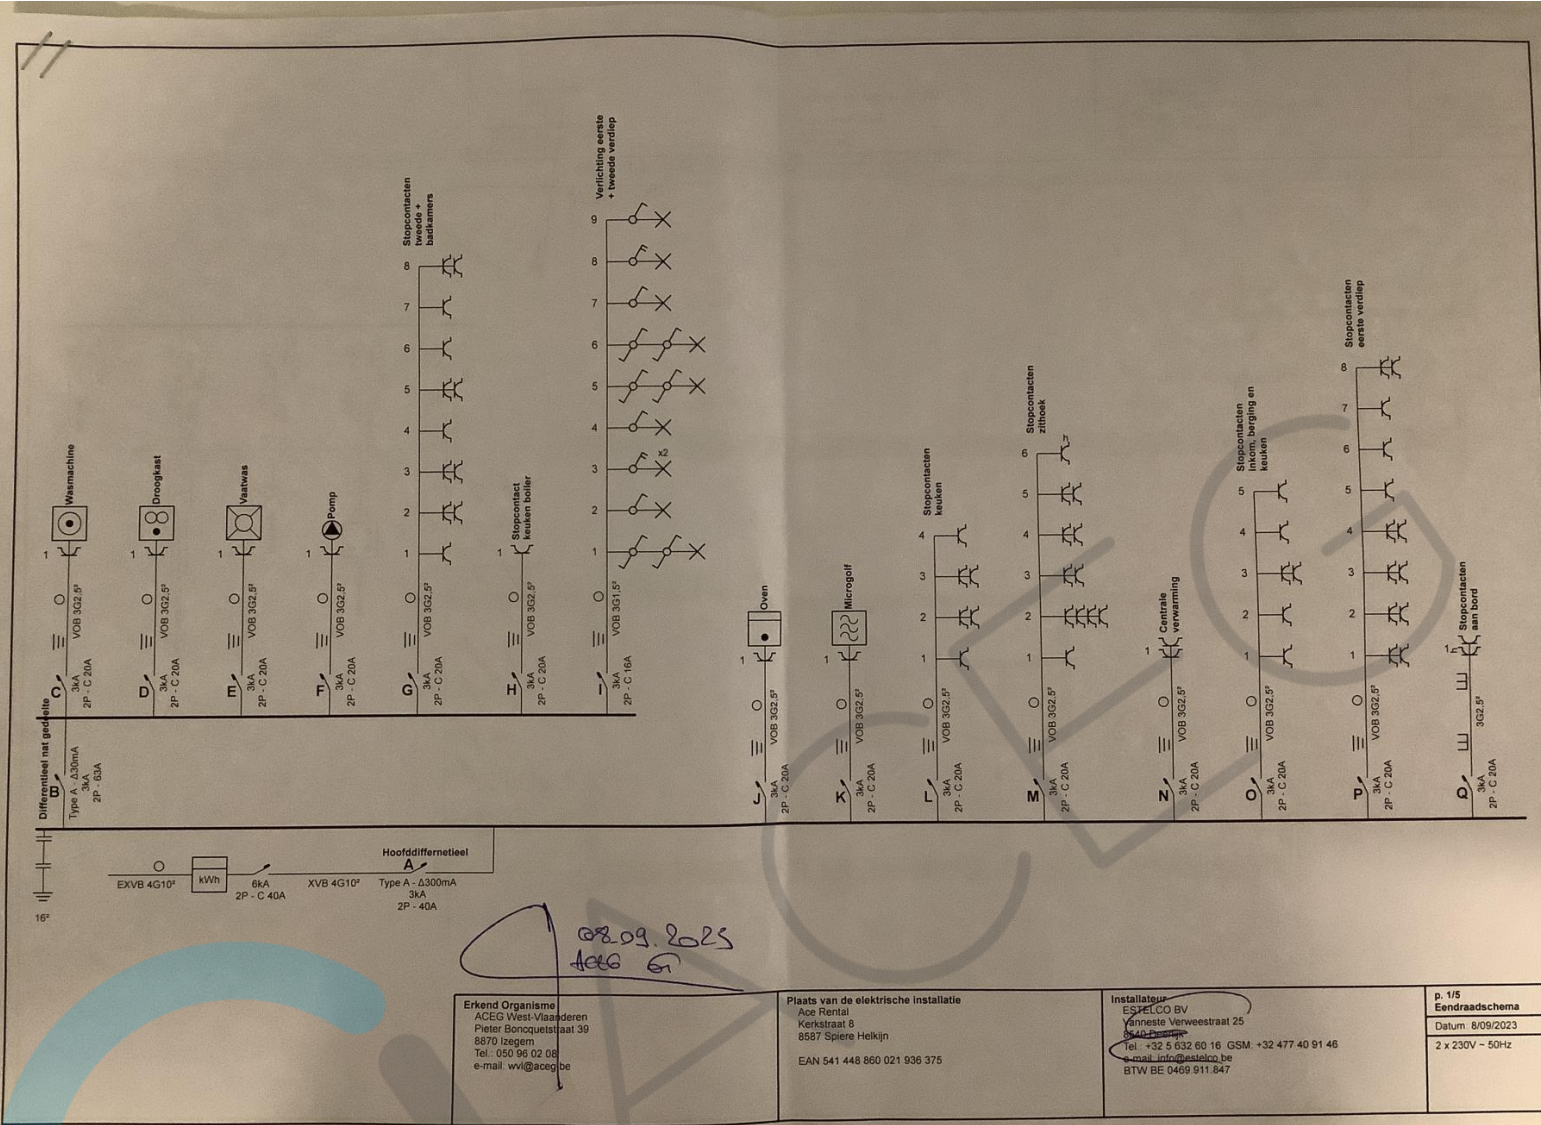

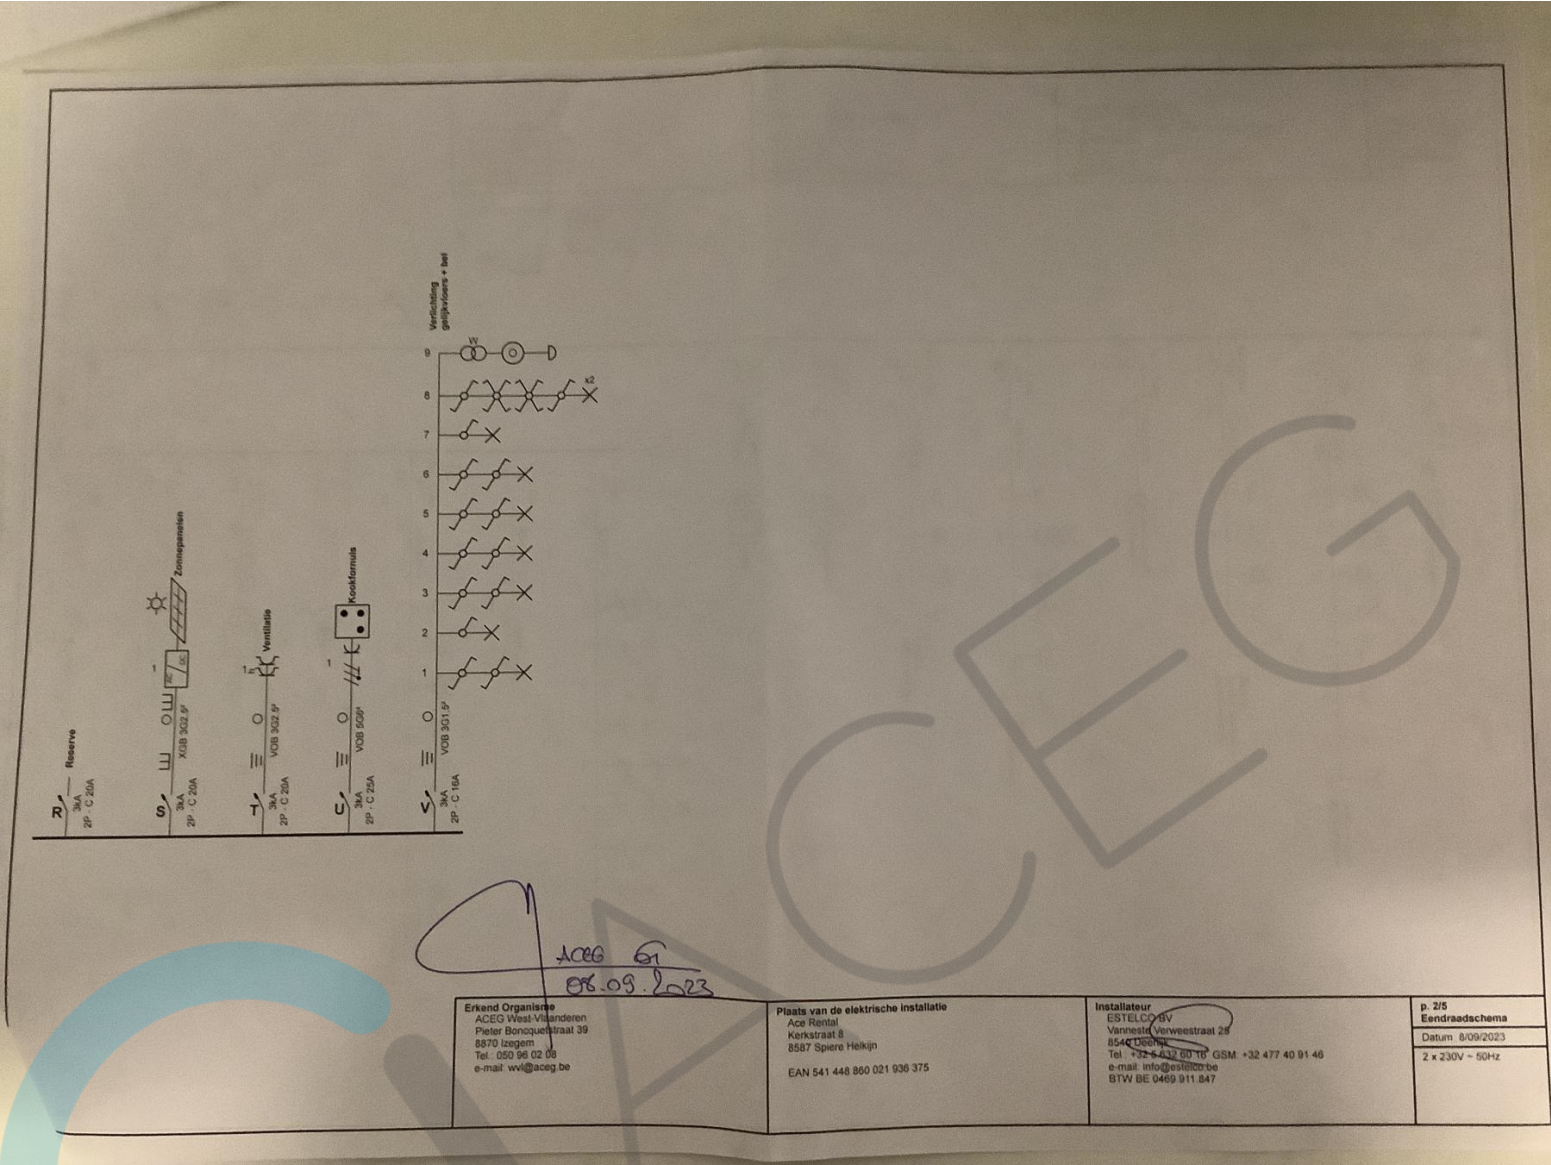



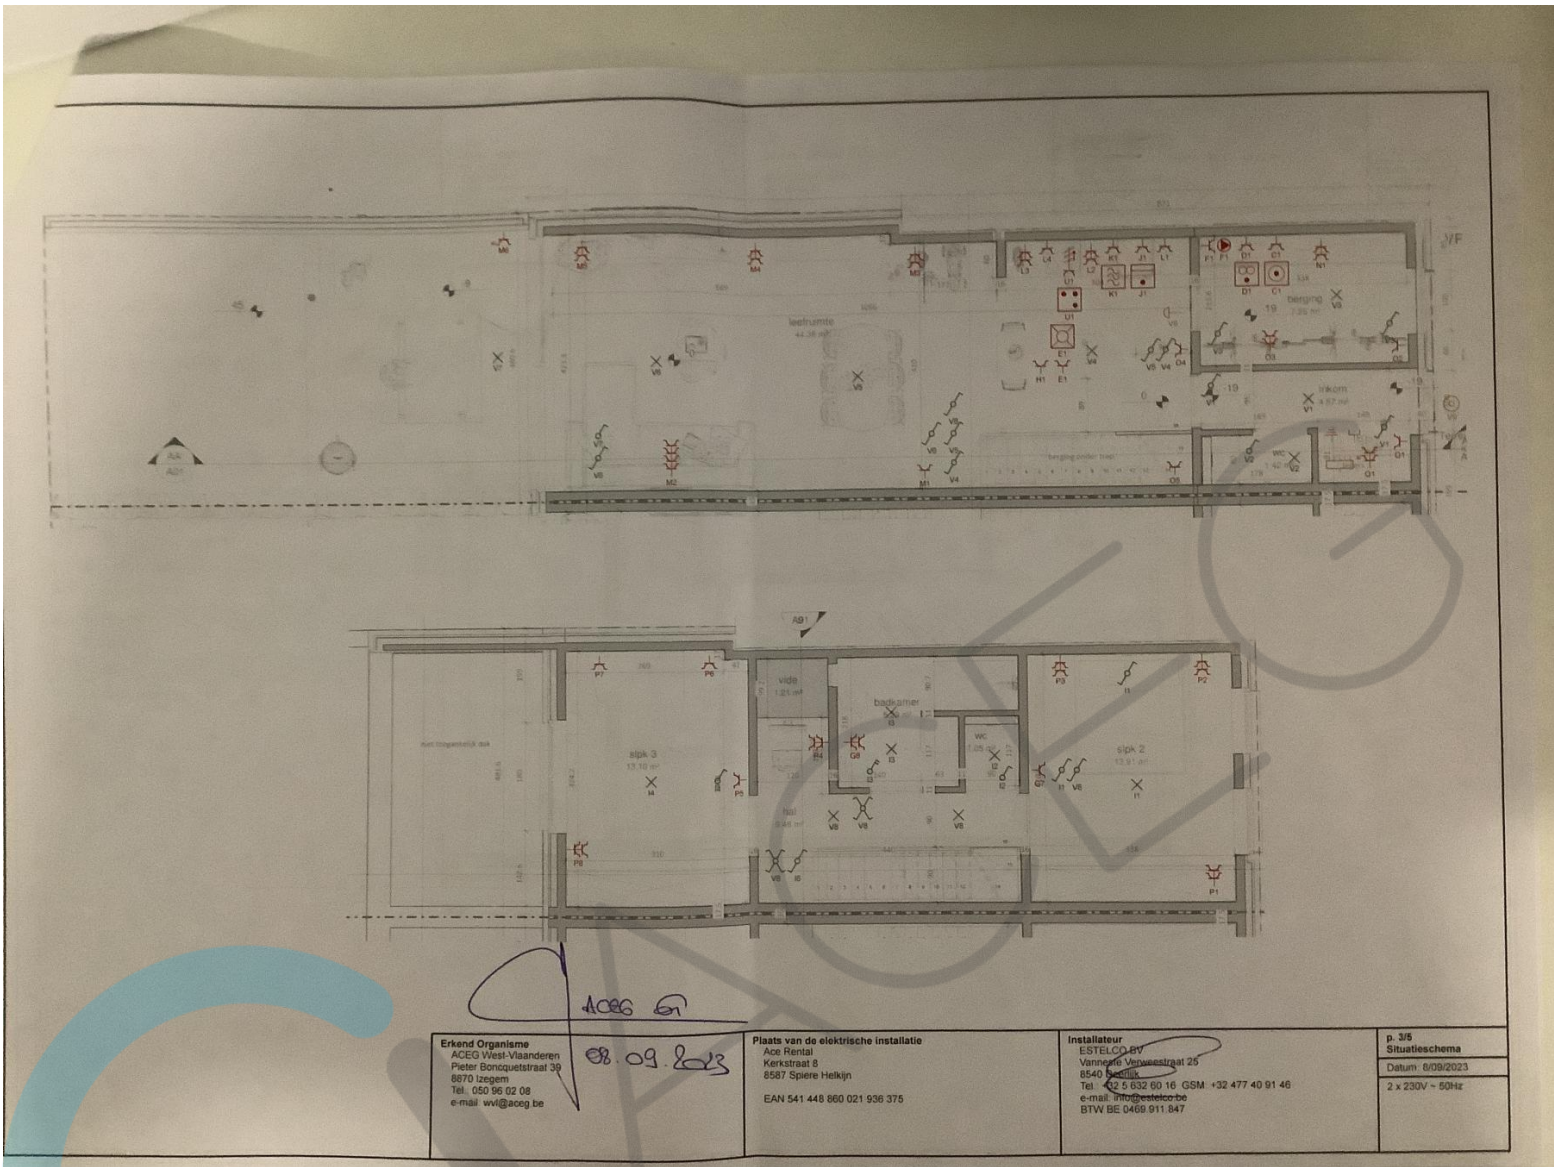

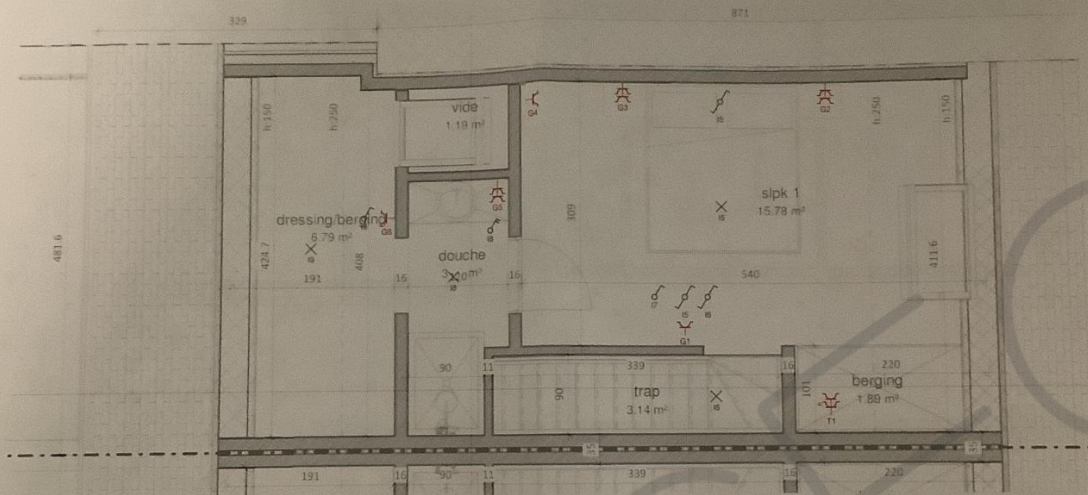

ACEG G  
08.09.2023

Erkend Organisme  
ACEG West-Vlaanderen  
Pieter Bonquetstraat 39  
8870 Izegem  
Tel. 050 96 02 08  
e-mail: wvl@acog.be

Plaats van de elektrische installatie  
Aco Rental  
Kerkstraat 8  
8587 Spiere Heikijn  
EAN 541 448 860 021 936 375

Installateur  
ESTELCO BV  
Vanpiste Verweestraat 25  
8540 Doenik  
Tel. +32 4 932 60 16 GSM +32 477 40 91 40  
e-mail: info@estelco.be  
BTW BE 0459 911 847

p. 4/5  
Situatieschema  
Datum: 8/09/2023  
2 x 230V - 50Hz





