

3335771

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~aanvullend~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 270bis~~ /

Aanvulling verslag nr. :

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voordeping~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwaaring~~ / ~~Spiltsing meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Verkoop~~ / ~~vooreenheid~~

Type der lokalen : Appartement

Plaats van onderzoek : Gamarante veldplaats 8 app. 02 (G.L.V.) Viekk

Eigendom van : De Dadrige Kathan idem

Opdrachtgever : B.S. elektro, Z. Oskweg 28, 8230 Wangen

Installateur : idem

BTW : 0864 337 991 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Bart Helsen Datum van onderzoek : 22/12/2011

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 220V 220V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 4p 40A Omschakelaar : stand : 1

Hoofdbeveiliging : Zek. : aut. morsd 4 x 25A Schak. : 2. 4p 40A / 300 mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : KVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 35 mm²

Boven-/ondergronds net/ondergronds op ~~beveiligd~~ net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst met geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / boren / penne / horizontaal Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 18 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 11 Algemene isolatieweerstand : 48 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4p 40A / 300 mA bijkomende : 4p 40A / 300 mA

werking testknop : in orde niet in orde controle foutlus : in orde niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - 600 Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen : —

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV-ketel - nog niet geplaatst.

N1 Toeschellen en verlichting mag te plaatsen

Bart Helsen - Inspecteur OCB
 G: 0496/29.00.82 - F: 09/388.34.24
 bart.helsen@ocb.be
 ele - gas - water
 www.ocb.be

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : 22/12/2011

zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~indien~~ zonder vermelding wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker

Elektrisch schema

Appartement 0.2

Residentie Amarante

Vichteplaats

Eigenaar :

Mevr. De Badrihaye Kathleen

Uitgevoerd :

**B&S-Elektro
Zultsweg 28 Waregem 8790**

Bouwheer :

Beyaert Construct

**B&S
ELEKTRO**

Zaakvoerders:

**Struyve Peter
0474 255 123**

**Debosschere Nico
0476 358 681**

Zultseweg 28 - 8790 WAREGEM

Getekend :

Peter

Bouwheer :

Beyaert Construct

Datum :

20/09/2011

BE: 0864.357.991.

Afdrukken van de markeringen

Nieuwe studie

App 0.2 Vichte Amarante Mevr. De Badrihaye Kathleen

Markering apparaat	Omschrijving
I1	
A	Verlichting leefruimte, slaapkamer, berging, wc
B	Stopcontacten leefruimte, slaapkamer
C	Stopcontacten koelkast, werkblad, dampkap
D	Stopcontact Kookplaat
E	Stopcontact oven
I2	
F	Verlichting badkamer
G	Stopcontact CV
H	Stopcontact vaatwas
I	Stopcontacten badkamer
J	Stopcontact droogkast
K	Stopcontact wasmachine


BE: 08064.357.991.



Nieuwe studie

App 0.2 Vichte Amarante Mevr. De Badrihaye
Kathleen

Nr van project :		C	F
Nr. Plan :		B	E
Datum:		A	D
	Getekend door :	BS-Elektro Minimum BE	Nr. folio : 3 / 3

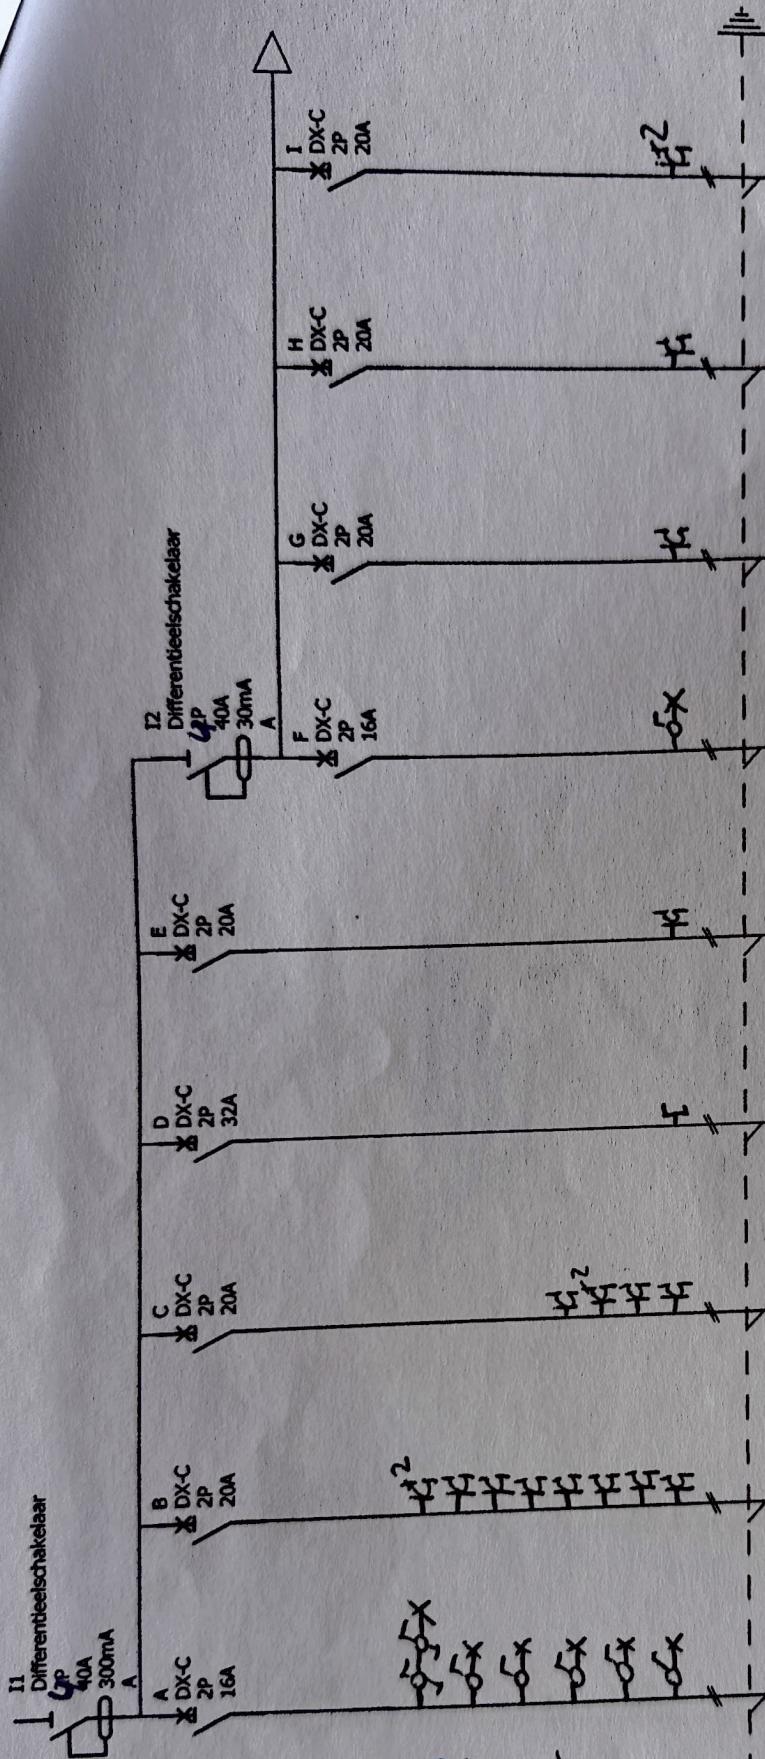

pr 3335771
 28/12/2011
 Bart Helsen - Inspecteur OCB
 G: 0496/29.00.82 - F: 09/388.34.24
 bart.helsen@ocb.be
 ele - gas - water
 www.ocb.be

Markering apparaat	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Markering railklemmen									
Omschrijving	Verlichting leefruimte, slaapkamer, berging, wc	Stopcontacten leefruimte, slaapkamer	Stopcontacten koelkast, werkblad, dampkap	Stopcontact kookplaat	Stopcontact oven	Verlichting badkamer	Stopcontact CV	Stopcontact vaatwas	Stopcontacten badkamer
Vermogen	16A	20A	20A	32A	20A	16A	20A	20A	20A
Lengte van kabels									
Sectie van kabels									
Type van kabels	Flex 3g1,5	Flex 3g2,5	Flex 3g2,5	Flex 3g6	Flex 3g2,5	Flex 3g1,5	Flex 3g2,5	Flex 3g2,5	Flex 3g2,5

bc: 0864.357.991

Nieuwe studie

App 0.2 Vichte Amarante Mevr. De Badrlhaye
 Kathleen

Nr van project :
 Nr. Plan :
 Datum:

C
 B
 A

Getekend door:
 BS-Elektro
 11/11/2011

F
 E
 D
 Nr. folio : 1 / 3

[illegible]

Nr van project :
Nr. Plan :
Datum:

Nieuwe studie

**App 0.2 Vichte Amarante Mevr. De Badrihaye
Kathleen**

017

BS-Elektro
Information DE

Getekend
door:

Radi

RF: 0864.357.996
