

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:
43.874

Datum van bezoek:
06-05-2024

Plaats van het onderzoek:

Bisschoppenhoflaan 134/136 - 2100 Antwerpen
België

Inspecteur:
Abdelaziz Achbari
Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

De datum van opstelling:
06-05-2024 10:36:10
Volgend controlebezoek:
06-05-2049

Testeur d'installation:

TI-025/5816213

Opdrachtgever

Naam
Adres
Telefoon
Email

PEB Certi
Blaisantvest, 105, 9000 Gent, Belgique
+32 2 466 45 66
epc.certi@gmail.com

Wetgeving



663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Algemene gegevens

Adres van de installatie
Gebouw
Eigenaar
Adres van de eigenaar
Installateur

Bisschoppenhoflaan 134/136 - 2100 Antwerpen België
Appartement 3e verdiep links
Eigenaar Bisschoppenhoflaan 134/136 -

Gegevens verdeler

VB
Nummer teller
EAN code
Meter/bord verbinding
Net spanning
Maximum beveiliging

Fluvius
1SAG1100127791
541448820041922338
VOB 2X10
2 x 230 V
63 A 2P

Atlas Controle**Boulevard Lambermont 127****1030 Bruxelles****Onderzoek**

Schema's	Equipotentielle verbindingen	Fundamenten	Elektrische installatie
OK	OK	vóór 81	vanaf 81

Beschrijving van de installatie	Zie bijlage
---------------------------------	-------------

Aantal verdeelborden	2
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 63A - type A
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	OK
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK
Type aardelektrode	Baar
Weerstand aardelektrode (Ω)	12
Isolatiemeting ($M\Omega$)	>5Mohm


Besluit**BESLUIT : CONFORM**

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.

Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentieële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema(s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.

Handtekening van de inspecteur

Atlas Controle
Boulevard Lambertmont 127
1030 Bruxelles

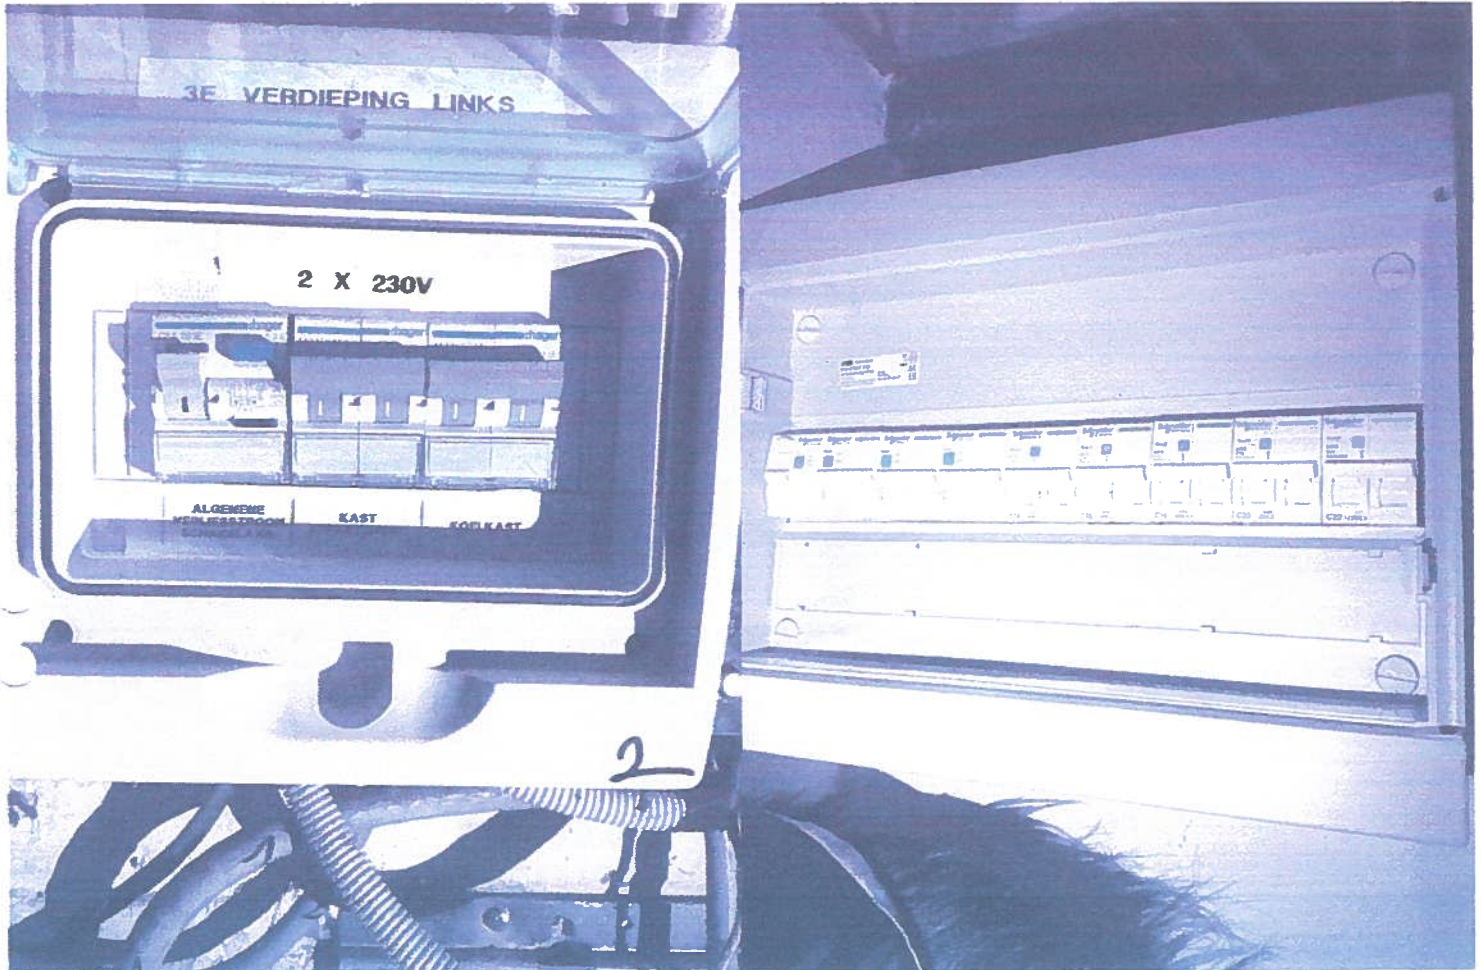

Verdeelbord 1

Verdeelbord 2

Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
Geen inbreuken	RDE1
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.	RDE5
Bewoordingen	Foto

Elektrisch Dossier

EAN:

230V

02/05/2024

Installatie Adres


bisschoppenhoflaan 134 136
2100 deurne

Installateur

DINY BV
heilstraat 300
2610 wilrijk
info@antwerpseklusdienst.be
BE 0758.785.864

Legende	p.1
Situatieschema	p.2
Eéndraadschema	p.3-p.4
Tabel.....	p.5

appartement 3B

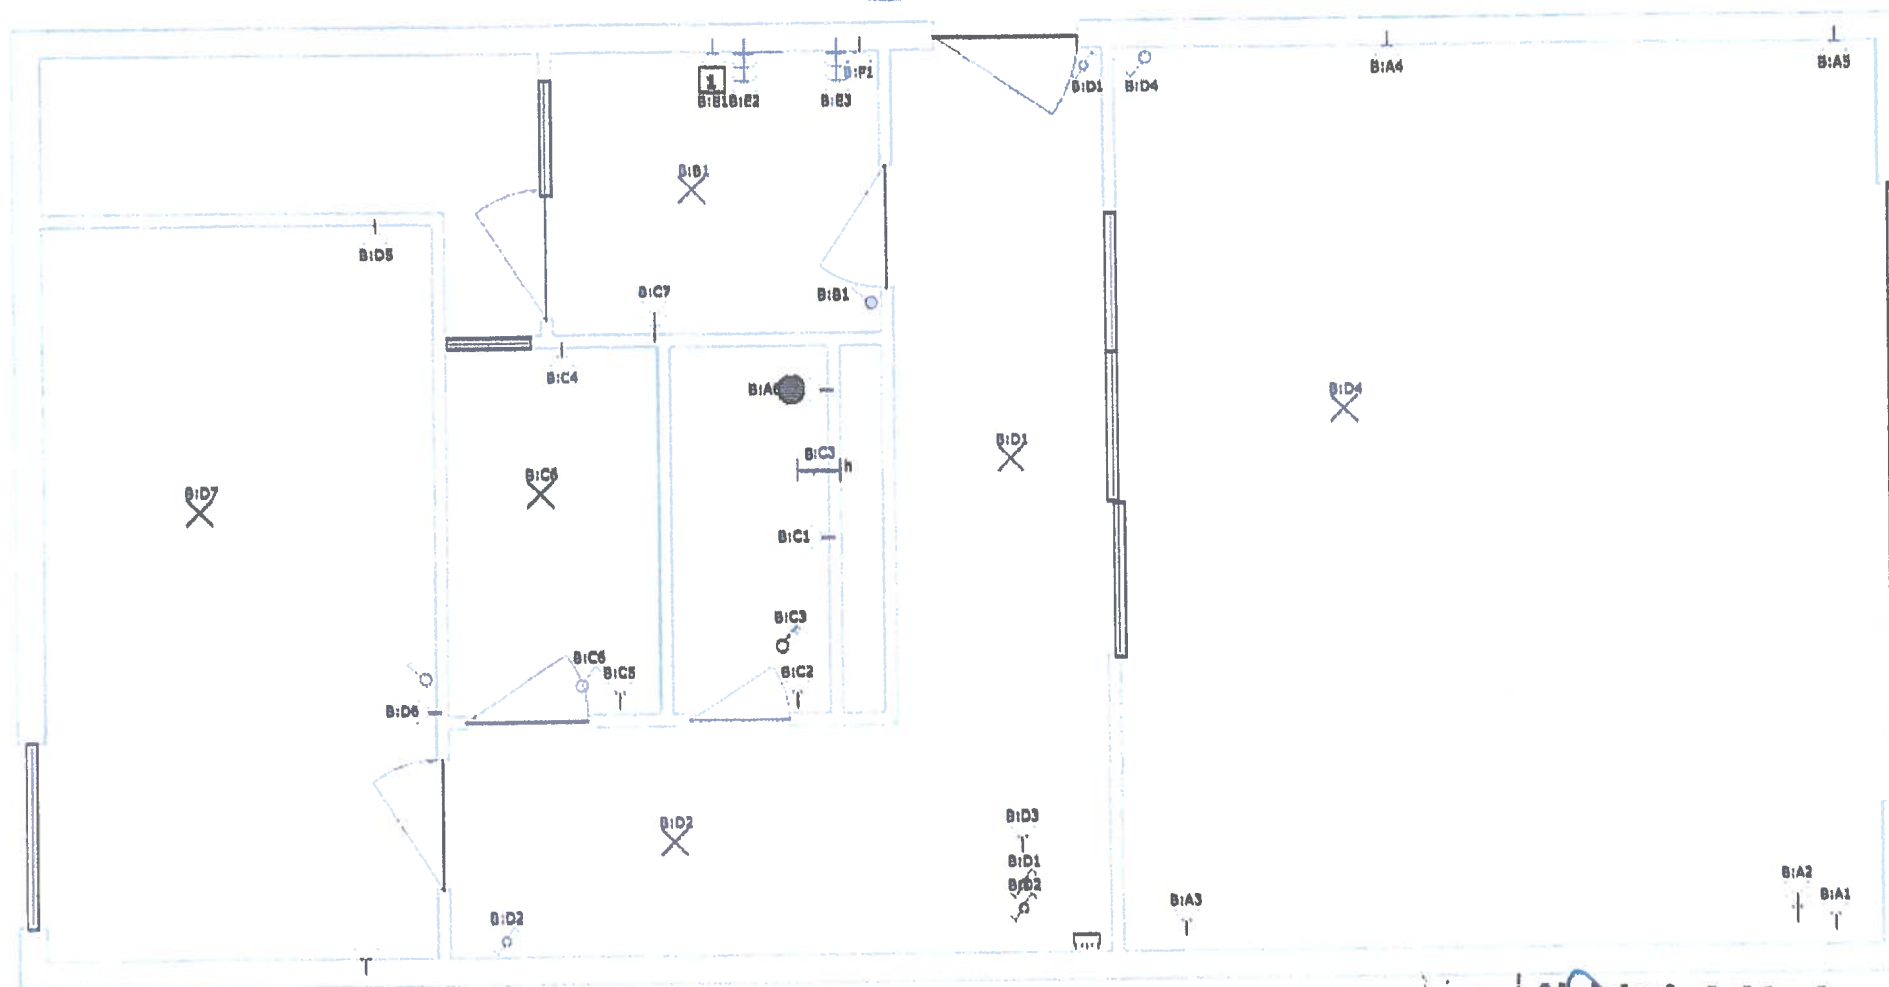

Installatie Adres

Naam:
Adres: bisschoppenhoflaan 134 136
Adres: 2100 deurne

Installateur

Naam: DINY BV
Adres: helstraat 300
Adres: 2010 wilrijk

E-Mail: info@antwerpseklusdienst.be
BTW nr.: BE 0758.785.864

Handtekening Installateur

Abdelaziz Achbari

02/726.34.04

www.atascentrole.be

TVA: BE-0732.536.476

63-INSP

Controleur

Numer:
Verslag Nummer:
Handtekening:

02/05/2024


Béन्द्रaadechems

35
Verdeelkast ~~3p~~ kast kelder...1

BAN:

230V

3/5

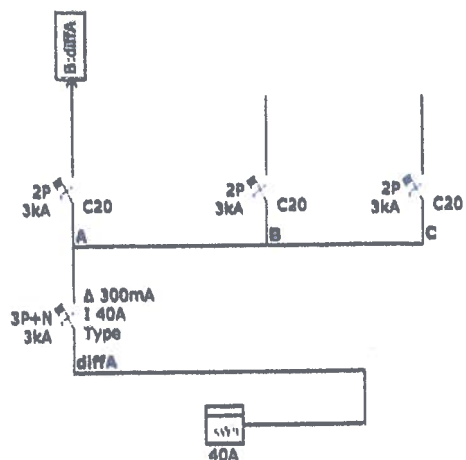

Atlas
Control

Abdelaziz Achbari

02/726.64.04

www.atlascontrol.be

TVA : BE 0732.536.476

663-INSP

Installatie Adres

Naam:
Adres: bisschoppenhoflaan 134 136
Adres: 2100 deurne

Installateur

Naam: DINY BV
Adres: heistraat 300
Adres: 2610 wilrijk

E-Mail: info@antwerpseklusdienst.be
BTW nr.: BE 0758.785.864

Handtekening Installateur

Controleur

Numer:
Verslag Nummer:
Handtekening:
