




N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL
 Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Eandis
 Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : UTP
 N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 93079913EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek : 1840 Lou de Beel Haan 7812
 Lieu du contrôle :

Eigenaar : Hermans - Piessens
 Propriétaire : Adres : idem
 Adresse :

Installateur : FelcoDatum van het onderzoek : 6-7-2019

Date du contrôle :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur : HaelewatersOnderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : 400+N Meter / bord verbinding : XUB 4X10 Max. beveiliging : 40A
 Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : P05 Isolatie : 408 Mohm Aantal verdeelborden : 1
 Electrode de terre : 2259 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	B7 - B92 / 41 - A8		☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐
40	30	A	B1 - B92		☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK Indirecte aanraking : OK NOK
 Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐ Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
 Raccordements : Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

geen opmerkingen

Besluit / Conclusion

De installatie is — plm — conform met het AREI
 en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — indien — blijven.
 L'installation est — plm — conforme au RGIE
 et peut — pas — temporairement — être mise en service — si — en service.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het éénraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
 stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont

conforme avec l'installation.

Geen tekortkomingen ont bij het AREI met een onderverzekering de versien worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken
 te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen
 gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Het is uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être
 exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en de maintien en service des installations les infractions ne
 constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard 12 mois après la date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 6-7-2020
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
 o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.P.E.T. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
 La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du P.C.T.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de la vente.



voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :



Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	 /
☐	☒	☐	☐	 /
271 AK		271 HK		 /
☐		☐		 /
276 AK		271 HK		 /
☐		☐		 /







ELECTRO-TEST
 Roger HAELEWATERS
 Inspecteur
 Gsm : 0475 30 07 82

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'intervention dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation de signaler les infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le maître de l'installation agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie pour la haute surveillance des installations électriques domestiques.

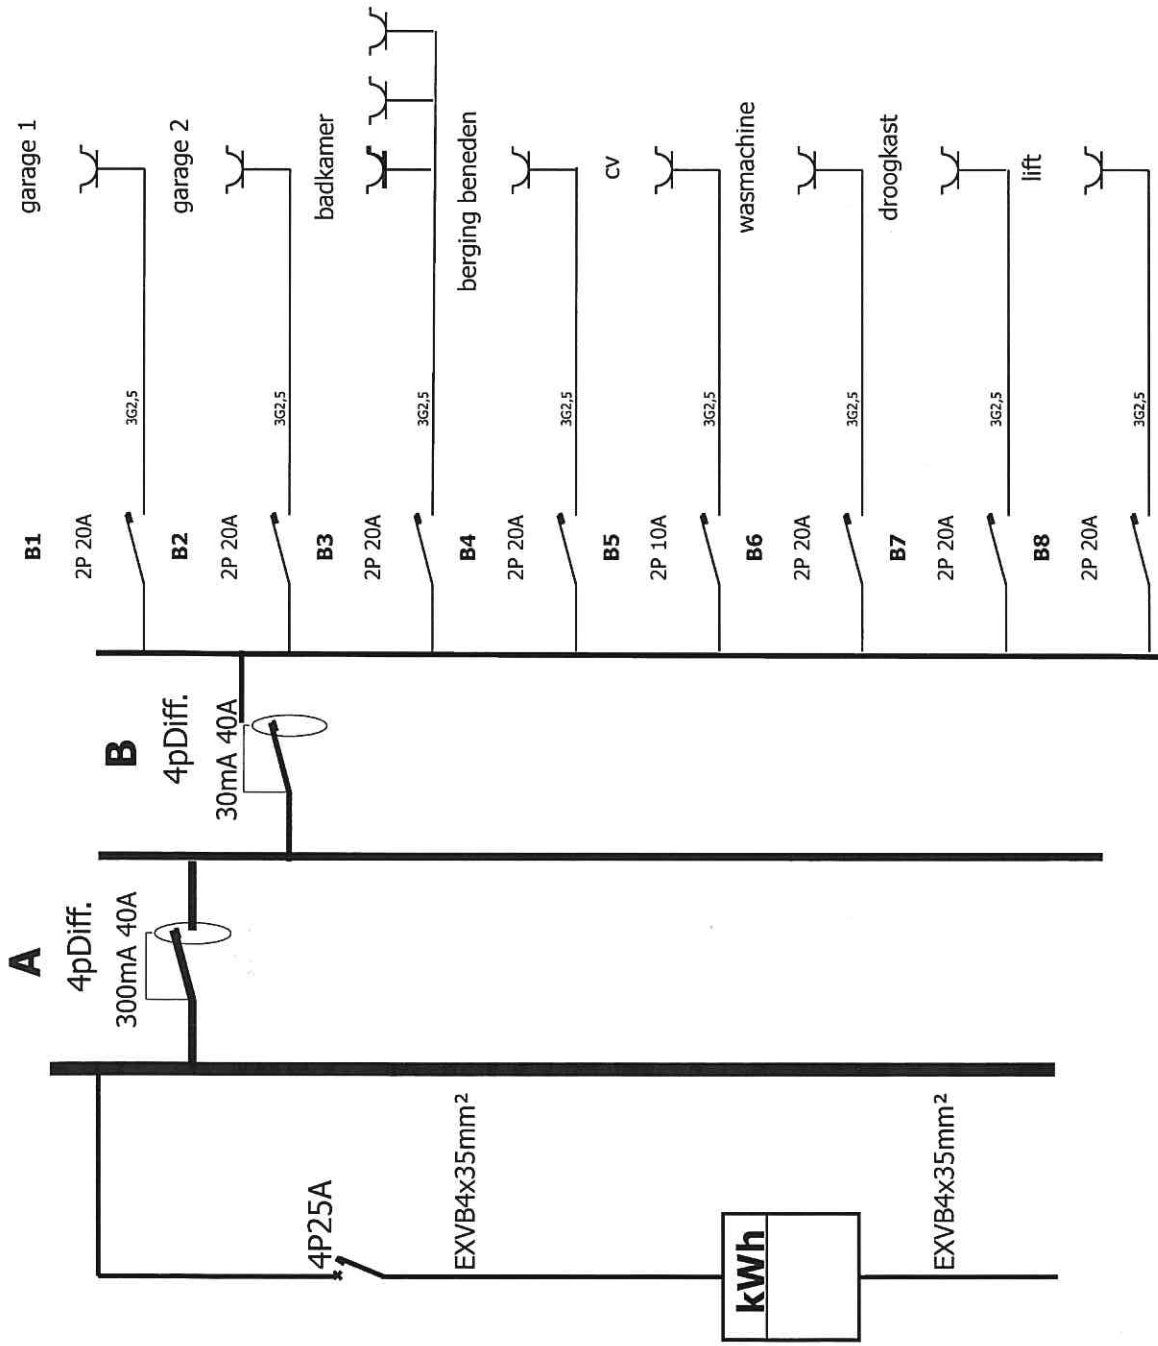

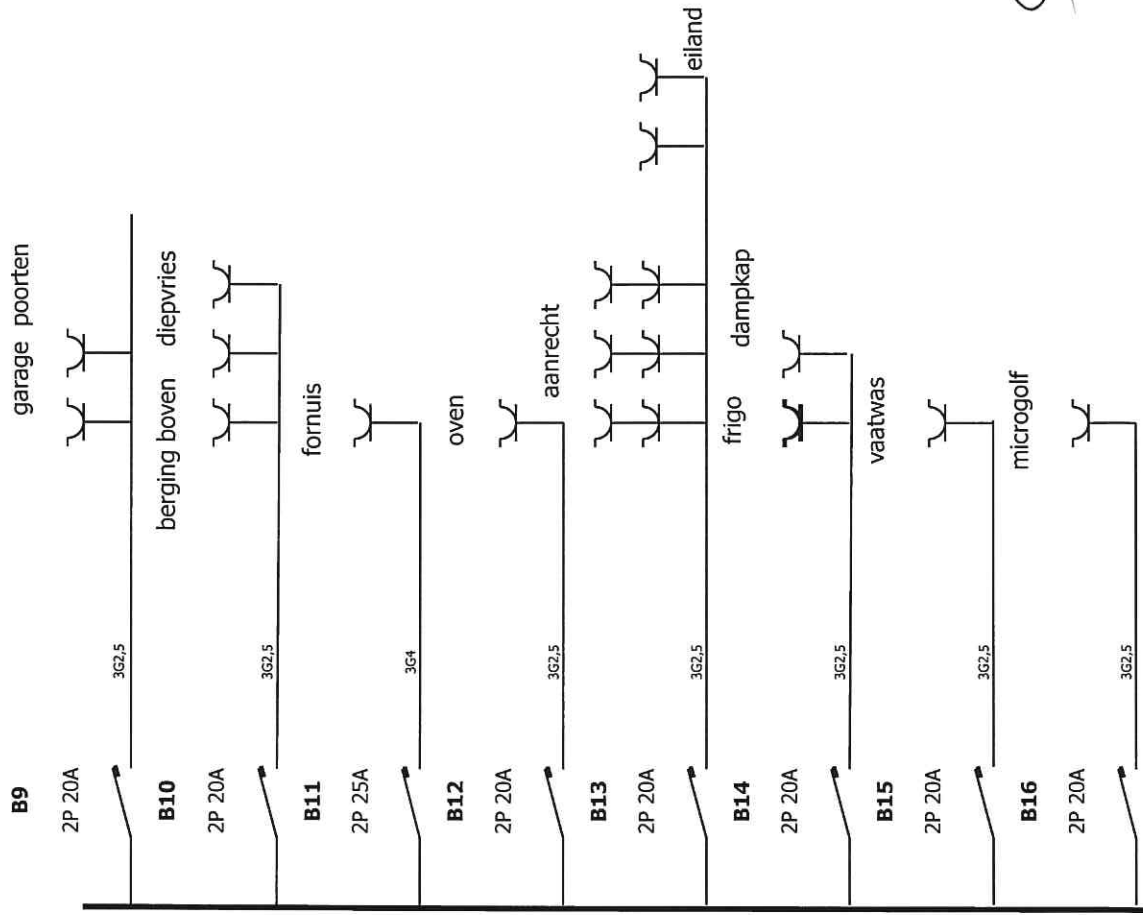

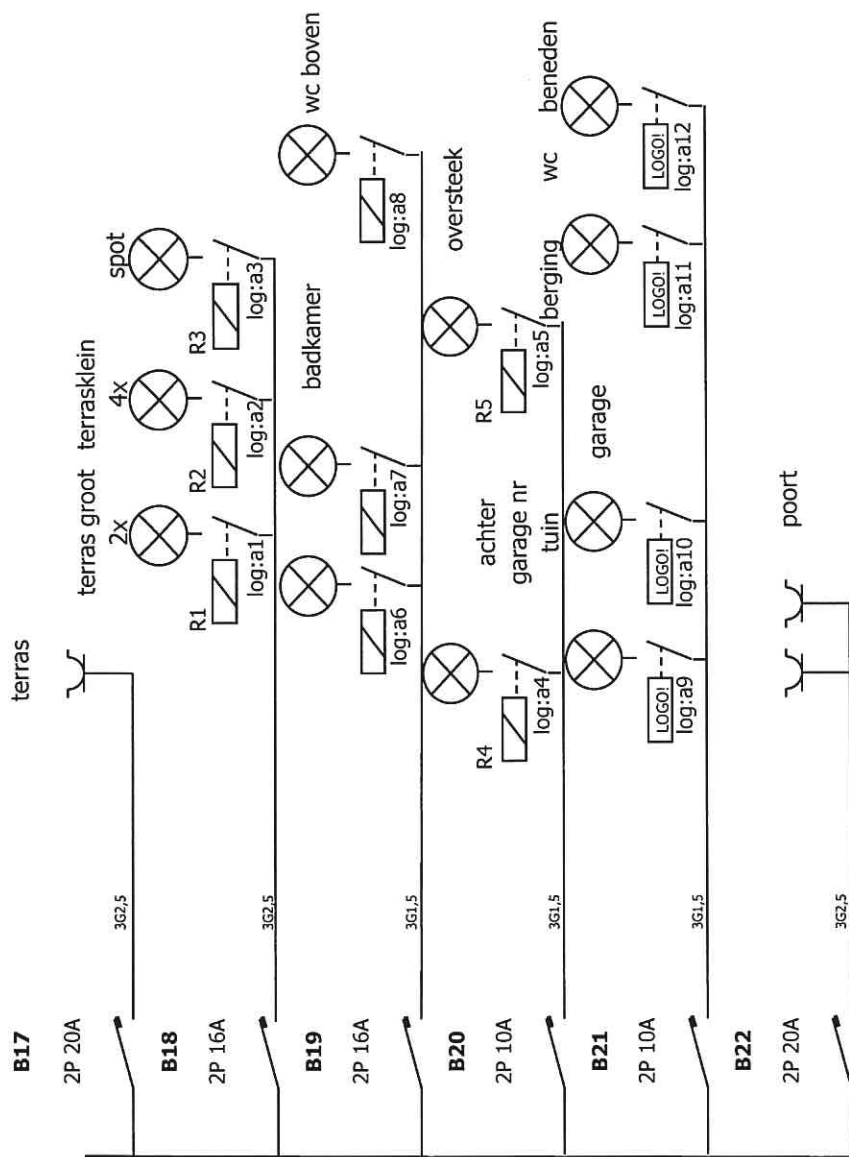

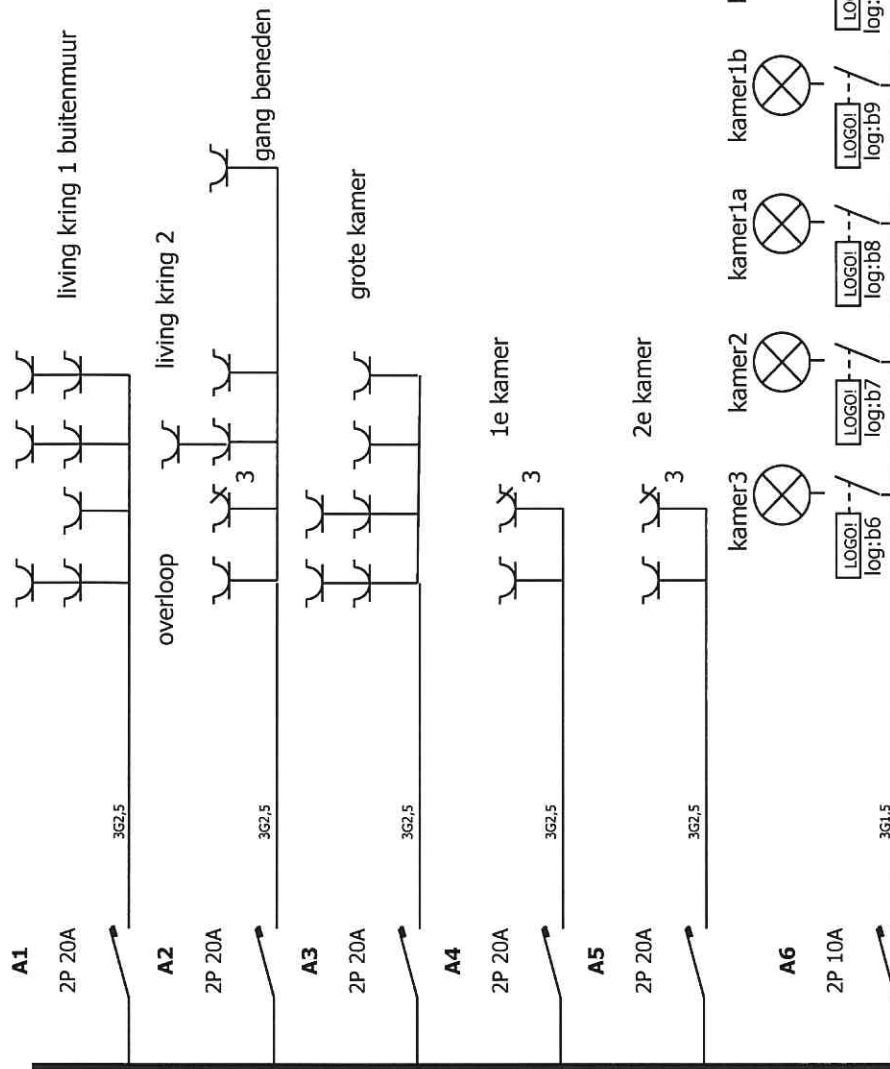


logo! B

- 1 nachthall
- 2 keuken
- 3 living
- 4 eetplaats
- 5 wc boven (bruin)
- 6 bureau (bruin)
- 7 kinderkamer (bruin)
- 8 nachtlamp M (bruin)
- 9 nachtlamp J (zwart)
- 10 kamer groot (grijs)
- 11 berging boven (bruin)
- 12 gang beneden (grijs)
- 13 gang boven overloop
- 14
- 15
- 16 gang boven overloop (bruin)

logo! A

- 1 terras R1
- 2 schuifraamR2
- 3 spot tuin R3
- 4 Spot achter garage R4
- 5 oversteek R5
- 6 badkamer meubel
- 7 badkamer alg
- 8
- 9 garage1
- 10 garage2
- 11 berging beneden
- 12 wc beneden



LOGO!

I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	I16	I17
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

