

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : Elia

Nr teller : N12
N° comp : N12

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 30/2016/10/27/3

EAN code : N12

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. ☐
Genre de contrôle : RGIE ART		☐	☐	☒	☐	☐		

Plaats van het onderzoek : Lavendelweg 2D 0204 (Res Schubert)
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Detrach Adres : Honingstraat 34 9310 Melsbroek (D.V.L)
Propriétaire : Adresse :

Installateur : ElekTis Van den heede BTW / TVA : N12
Datum van het onderzoek : 27/10/2016 Ik. / C.I. : N12
Date du contrôle : Inspecteur : Mengon M

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 0204

Spanning : 3N400V Meter / bord verbinding : XV.D 4x10mm Max. beveiliging : 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : Aandelen Isolatie : >5 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 2 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :		Test ΔIn		I ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
40	300	A	Algemeen kringen A-I 13x		☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
40	30	A	bghomende n A'-D'n		☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
		1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐ Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM :**
Opmerkingen/Remarques : Datum/date :
- Geen tekorten vastgesteld

Resultat / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☐ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : 27/10/2017

☒ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.



☐ Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

☐ La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur : [Signature]

Rapport des prescriptions réglementaires : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'honneur dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

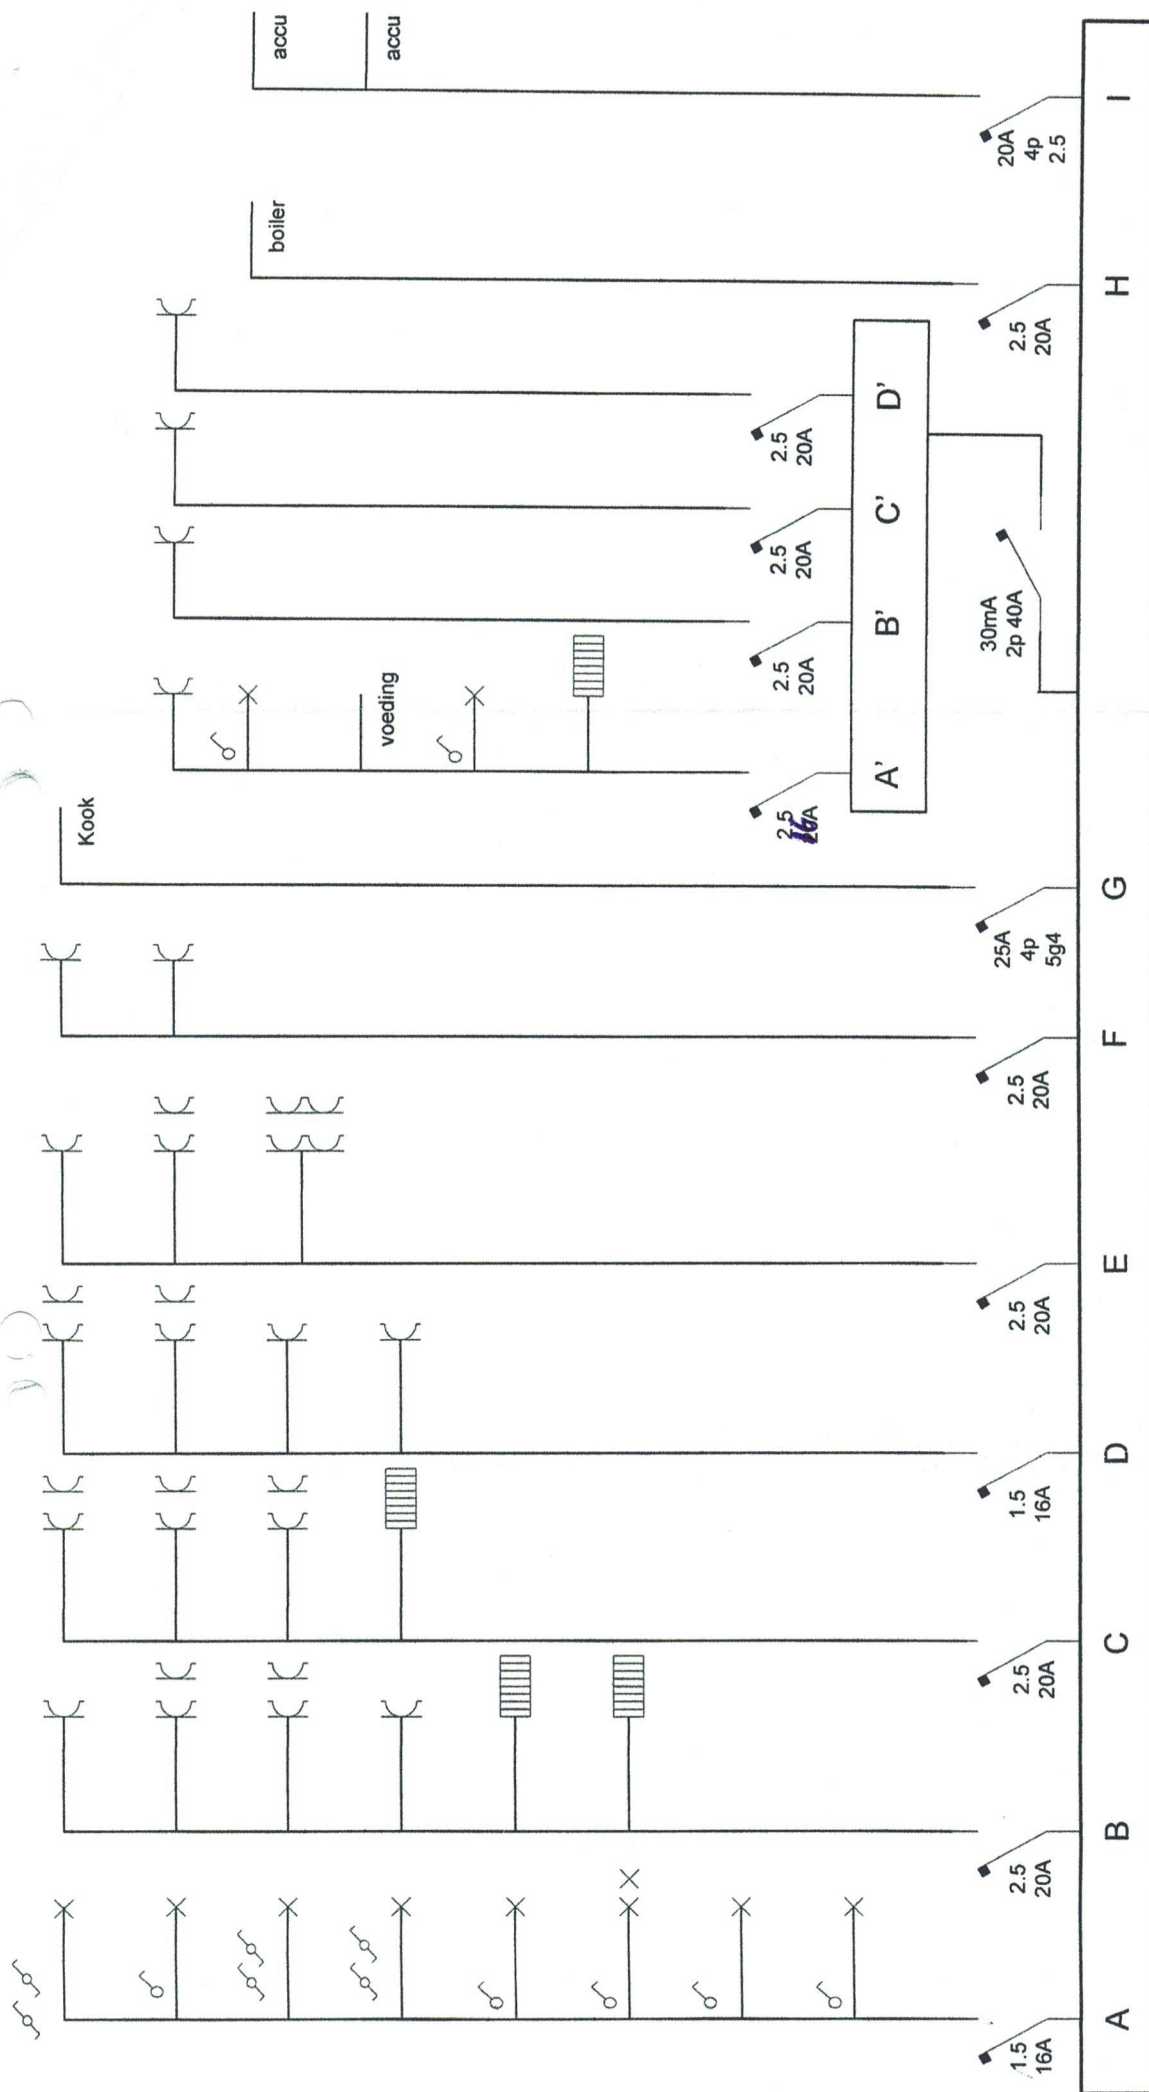

300mA
4p 40A

2

SC 2.2

KEURINGSORGANISME

OVV
27-10-2016
2016-10-27
2016-10-27

INSTALLATEUR

DVDA ELEKTRO VANDENHEEDE
PETEGEMSTRAAT 40
3670 MACHELEN-ZULTE
TEL. 09 386 36 11

EIGENAAR

ELEKTRISCH SCHEMA APPARTEMENT

ET
Meynke

27-10-2016

SPANNING 3x400V + N

Schubert 2.4
Lavendelweg
Middelkerke

Blz 1: Lay-out verdeelbord

Blz 2: Eendraadschema

Blz 3: situatieschema

De verantwoordelijke voor de
uitvoering van het werk

Het keuringsorganisme

LAYOUT VERDEELBORD

G	KOOKFORNUIS 25A	A	B	C	D	E	F
		Verlichting	Stopcontacten Hal + slaapkamer 1	Stopcontacten slaapkamer 2	Stopcontacten keuken + eethoek	Stopcontacten zithoek	Stopcontacten frigo + oven
		16A	20A	20A	20A	20A	20A

H	BOILER 20A	I					
		ACCUMULATIE verwarming					
		20A					

	VERLIESSTROOM- SHAKELAAR 300mA 40A	VERLIESSTROOM- SHAKELAAR 30mA 40A		A'	B'	C'	D'
				Badkamer	Stopcontact wasmachine	Stopcontact droogkast	Stopcontact vaatwasmachine
				20A	20A	20A	20A

ET
Meyers
