

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 28/08/2020 **Inspecteur:** Bruno Castelli **Mentor:** **Installateur:** Vrolix bvba
ID-label: Installateur: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3. EK1.06 **Klantreferentie:**
B.T.W. nr.: BE 417 543 329

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serie Nr.: 19120286

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Joseph Smeetslaan
Huisnummer: 1
Busnummer: 52
Postcode: 3630
Gemeente: Maasmechelen
Land: België

Naam contactpersoon: Vrolix bvba
Telefoon: 0486276716
Gsm nr. (SMS):

Type : appartement

EAN : 541449200006171619

Eigenaar

Naam: Swennen
Straatnaam: Joseph Smeetslaan
Huisnummer: 1
Busnummer: 52
Postcode: 3630
Gemeente: Maasmechelen
Land: België

Installateur

Naam: Vrolix bvba
BTW nr.: BE 417 543 329
Telefoonnummer: 0486276716
E-mail: Frederik@vrolixklima.be

Teller Nr.: : 1SAG1100091106

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS **Spanning:** 1~230V **Meter / bord verbinding:** 10 mm² **Max beveiliging:** 40 A
Aantal borden: 1 **Aantal kringen:** 10 **Isolatie:** >5 MΩ
Aardelektrode: Aardingslus RE: 6,25 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	-	-
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
7	C	20		2	2,5
3	C	16		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen) OK NOK **Directe aanraking** OK NOK **Indirecte aanraking** OK NOK
Aansluitingen OK NOK **Correcte schema's** OK NOK **schema in bijlage door Aceg vzw**
Equipotentiale verbindingen OK NOK niet van toepassing in afwachting
Continuïteit OK NOK **Verlichting / toestellen** OK NOK NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 28/8/2045
 De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.




- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bruno Castelli



Bruno Castelli - ACEG #93

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 28/8/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

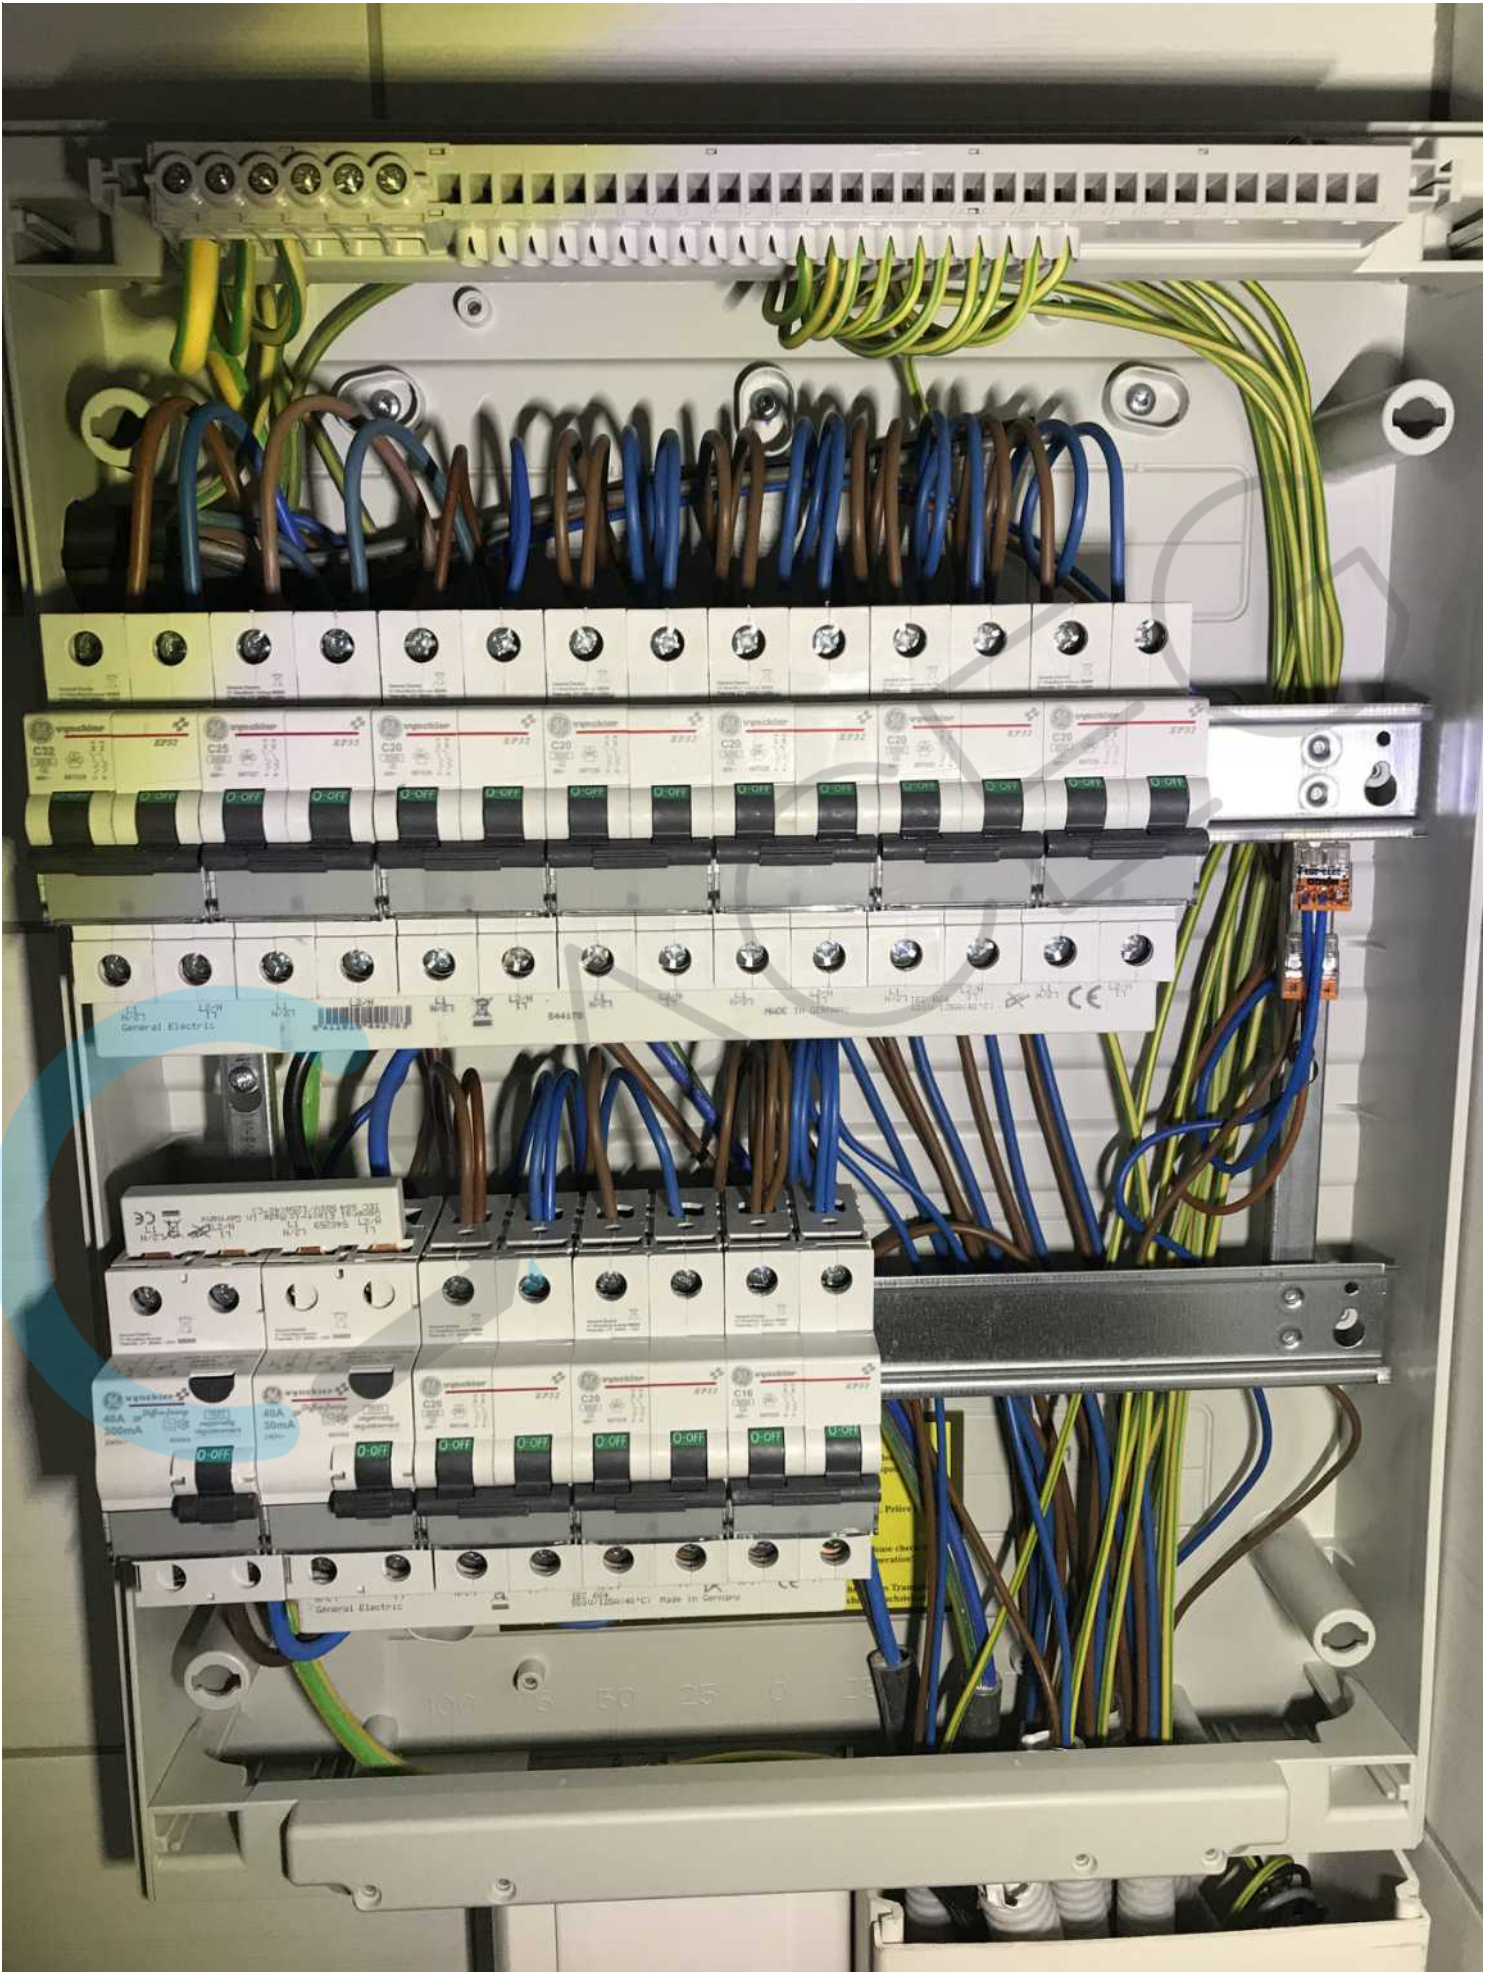

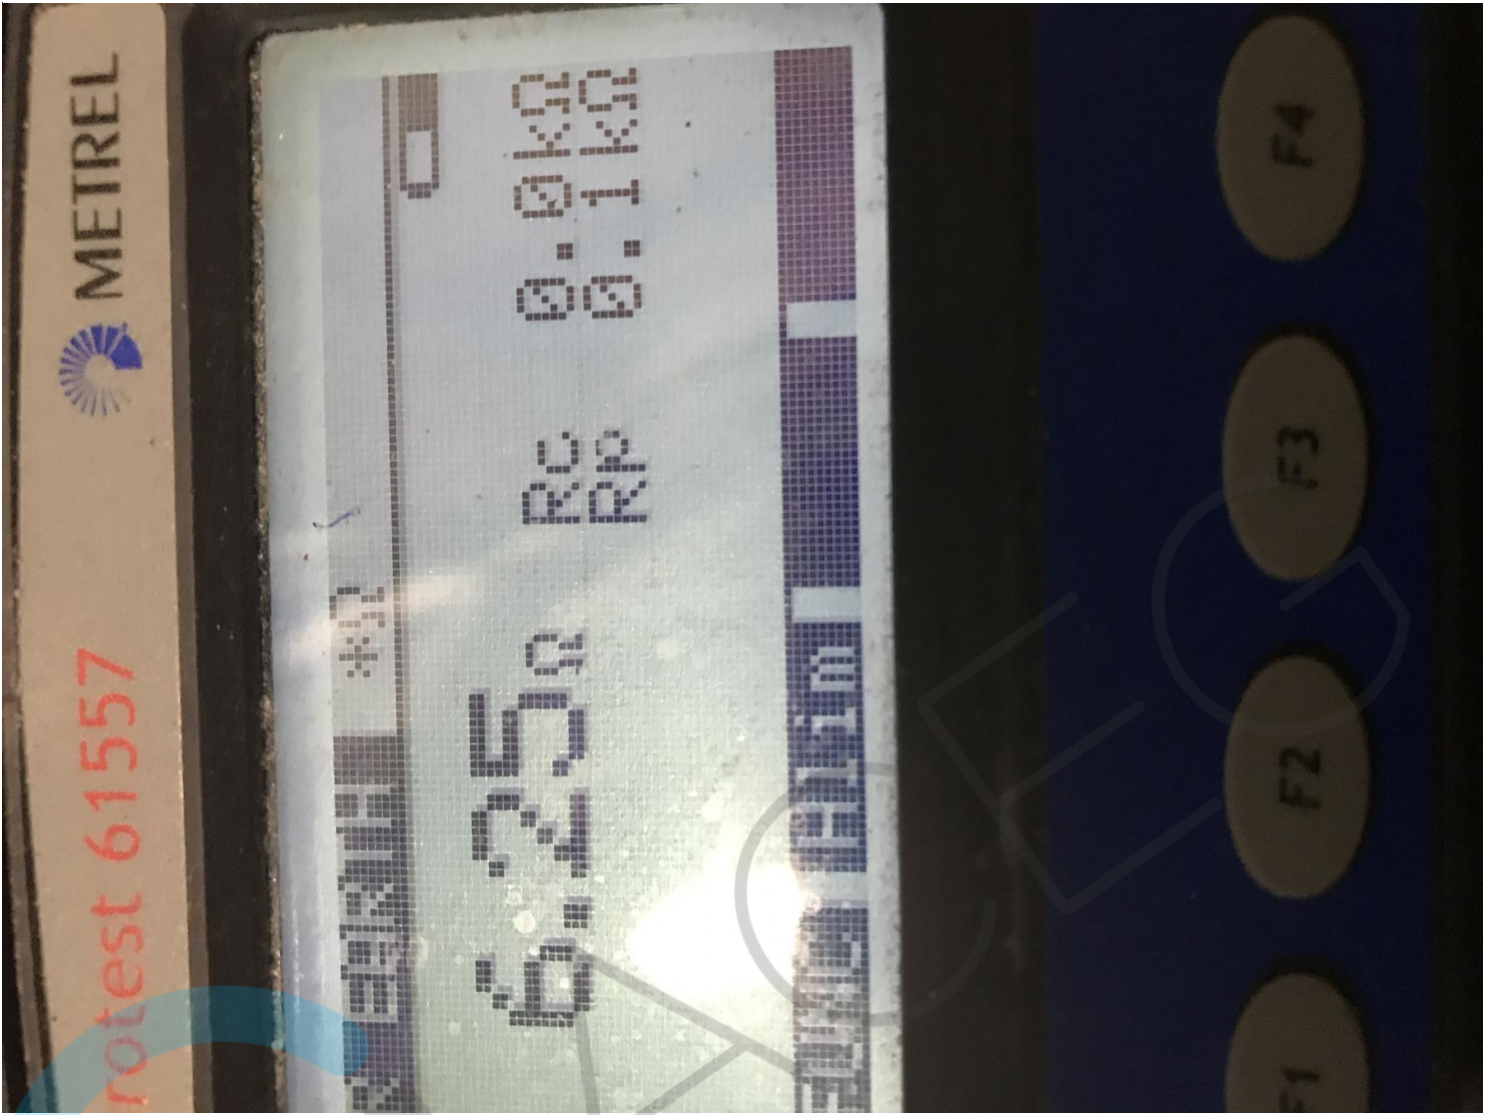

METREL

rotest 61557

*0

0.25g

0.12g

0.00g

F1

F2

F3

F4



VROLIX B.V.B.A.
Kaarbaan 5a
3600 GENK
Tel : 089/35.03.17
Fax : 089/35.75.10

KASTBESCHRIJVING
J. Smeetslaan 1 BUS 52

- | | |
|----|---|
| A. | Differentieelschakelaar 300mA |
| B. | Elektrische vuur |
| C. | Warmtepomp binnenunit |
| D. | Warmtepomp buitenunit |
| E. | Stopcontacten aanrecht en microgolfoven |
| F. | Stopcontacten aanrecht en dampkap |
| G. | Stopcontacten leefruimte en terras |
| H. | Stopcontacten slaapkamer |
| I. | Differentieelschakelaar 30mA |
| J. | Stopcontacten badkamer en ventilatie |
| K. | Verlichting |
| L. | Reserve |



Atgev. erkend organisme 28/08/2020 Eigenaar SWENNEN Joseph Smeetslaan 1 BUS 52 3630 Maasmechelen	Verantw. uitvoering 27/08/2020	VROlix Dvba VANDERPOORTEN EN VERMILTE ALKONDE ELEKTROTECHNISCHE EN GIEFTALREBIJLIDING Kaarbaan 5A 3600 GENK BTW: BE 417.543.329 TEL: 089/35.03.17 FAX: 089/35.75.10
---	-----------------------------------	--

