

**DE INSTALLATIE IS CONFORM**

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Limburg, KOERSELSESTEENWEG 226, 3582 KOERSEL  
T: 011 42 18 34, E: [btv.limburg@btvcontrol.be](mailto:btv.limburg@btvcontrol.be)

Verslagnummer: 0180-200518-16 Datum van het onderzoek: 18/05/2020  
Extra controledatums:

## ALGEMENE GEGEVENS:

**ADRES INSTALLATIE:** URSULINENHOF b201  
URSULINENHOF 4/2.03  
3500 HASSELT

**EIGENAAR:** URSULINENHOF b201  
Adres: URSULINENHOF 4/2.03  
3500 HASSELT

**OPDRACHTGEVER:** E.L. SYSTEMS  
Adres: SENATOR A. JEURISSENLAAN 1032  
3520 ZONHOVEN

**INSTALLATEUR:** E.L. SYSTEMS  
Adres: SENATOR A. JEURISSENLAAN 1032  
3520 ZONHOVEN

## Visualisatie van de installatie



## BTW of IK:

EAN: Teller nr. Index:

## ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie:	Nieuwe Installatie	Type der lokalen:	Appartement
Begin werken fundering:	Na 01/10/1981	Elektrische installatie:	Na 01/10/1981
Aansluiting spanning:	Mono 230V	AREI art.:	86
Voedingskabel hoofdbord:	XVB 4 x 10 mm <sup>2</sup>	Bescherming van de aansluiting:	max 40 A
Type van de aardelektrode:	Lus	Alg. schakelaar: type:	2p 40A/300mA
Aantal borden:	1	Aantal eindstroombanen:	16
Uitwendige invloedsfactoren:		Schema:	TT





Beter gekeurd  
Bien vérifié

## PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

### ONDERZOEK:

Onderzoek volgens: AREI art. 270  
Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek

### METINGEN:

RA: 1,2 Ohm RI tot.: 10 MOhm

### BESCHRIJVING:

### VASTGESTELDE INBREUKEN:

Geen

### NOTA'S:

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 2 De hoofdequipotentiale verbindingen zijn voorzien maar zijn nog aan te sluiten na de invoer van gas-, waterleidingen.
- 3 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.

**BESLUIT:** De installatie is conform.  
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.  
De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/05/2045 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,  
0180 MARNIK VAN DINGENEN

voor De Directeur,

### UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271):

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
- b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
- c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
- e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
- g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

VMA - 49  
Verslagnummer 0180-200518-16



2 / 3



Beter gekeurd  
Bien vérifié

## PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

### WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3



Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 18/05/2045.

STAP 4

BTV Limburg staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.



**AFDEKPLAATJES van alle schakelaars, stopcontact, etc. in het WIT**

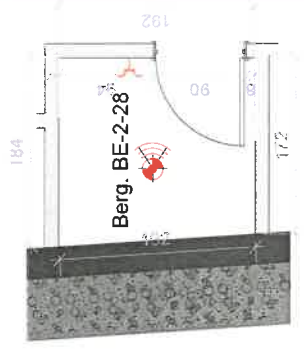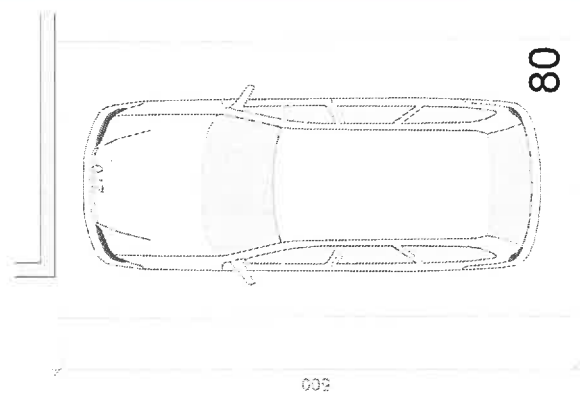

**APP B2.01 - Huisnr. 4/2.03 AANPASSING**

App. B2.01/K028/P080	datum: 14/05/2019	schaal: 1:50
Residentie "Ursulinhof" Groenplein 3500 Hasselt	Delcon BVBA Valkehoeve 9 2390 Diest	voor akkoord datum
Elektricien: EM Tpl. 011 / 27 07 10 3500 Hasselt - info@esbergis.com	14/05/14 GOEDEKEURING 12/06/14 GOEDEKEURING 08/07/21 AS-BUILT	aanpassing extra lichtpunt keuken + schakelaar
H. 30 cm	elektriciëel: basis	
H. 110 cm	symboolkleur: rood	
	elektriciëel: supplement	
	Centrische hoogtes: symboolkleur: blauw	
alle maten na te meten op de werf		

lichtpunt terras:  
armatuur en positie worden  
bepaald door de architect
