



VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME -
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com
 Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL BRABANT**
Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 / B-1800 Vilvoorde
Tel: - Fax : - E-Mail :
Contactpersoon: Johnny Boden

• Onze gegevens
Verslag nr.: AUD / 19 / 70032539 / 00 / NL / 000
Klantref.: BTOCAUD
Contractref.:

• Uw gegevens
Ref.:

• Interventiegegevens
Plaats: Brusselsestraat, 228 3000 Leuven
Datum: 29/03/2012
Uitgevoerd door: AV4266 - VERBESSEM SVEN

Arnaud Nelissen

Brusselsestraat, 228
3000 Leuven
België

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Nelissen Grade Voornaam: Arnaud
Adres: Brusselsestraat, 228 Post nr.: 3000 Stad: Leuven
Tel:

- **Eigenaar of beheerder**
idem
- **Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk**
Naam: Nelissen Grade Voornaam: Arnaud
- **Plaats type**
Woonenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 276bis: verkoop van een woonenheid
- Art 86
- Art 271 bis
- Art 278
- 2de controle na verkoop

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 29/03/2037.(*)

(* De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

Wij raden U aan om het (de) situatieschema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

Ing. J. Wijnendy
Directeur Generaal

Datum van afdruk: 17/04/2012
Aantal biz.: 2
Bijlage(n): 1



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 2.5 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 20 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN: 541448820059536145
kWh meter nr.: 2419224
Meterstand dag: 43326

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 230 V
Maximale nominale stroom: 40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type: VOB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 2*16 mm²
Type aardelektrode: Bestaand

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40A/300mA
Aantal borden: 1
Aantal eindstroombanen: 7
Situatieschema('s): zie bijlage(n)
Ééndraadsschema('s): zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN


- Nieuwe installatie

- Bestaande installatie

R-O-F Nihil

ANDERE BIJLAGE(N)

EAN 541448820059536145

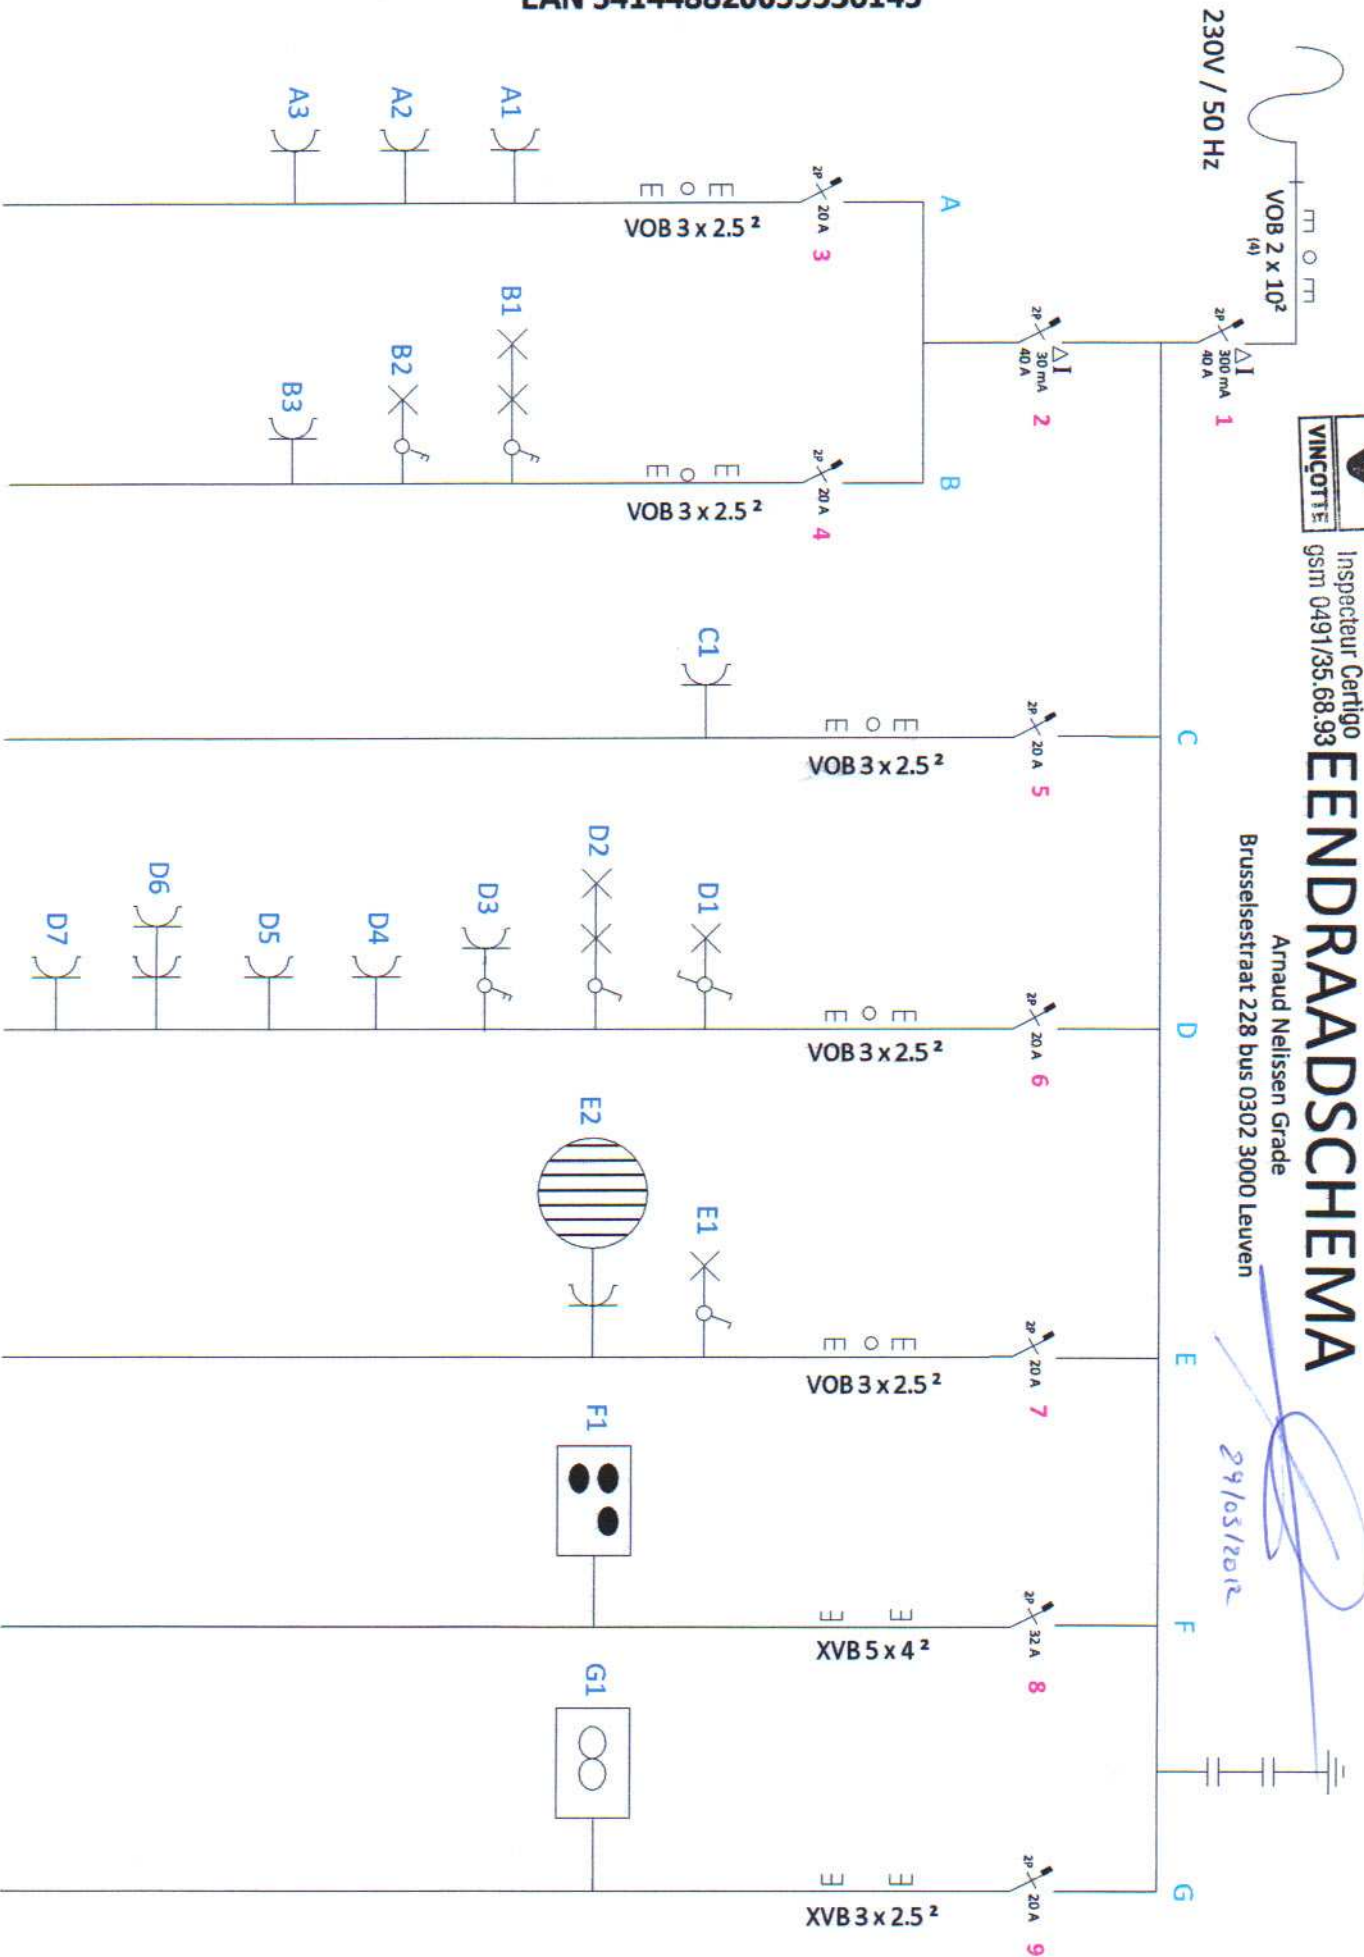

Sven VERBESSEM
nr. 4266
Inspecteur Getuigo
gsm 0491/35.68.93

EENDRAADSCHEMA

Arnaud Nelissen Grade
Brusselsestraat 228 bus 0302 3000 Leuven

29/05/2012

SITUATIESCHEMA

Arnaud Nelissen Grade
Brusselsestraat 228 bus 0302 3000 Leuven

Gelijkvloers



Sven VERBESSEM
nr.4266
Inspecteur Certifigo
gsm 0491/35.68.93

Sven Verbessem
19/08/2016

Mezzanine

