

Opdracht: 7511
Klant / Bedrijf: BG ELECTRO bvba, AV-Solutio

Klantnr.:
Adres: Pastoor de Herdtstraat 7, 2580 Putte
Putte
Voorl.verslagnr.:

Contactpersoon:
BTW: BE0896939105
Uitgiftedatum: 2020-09-30

Verslagnr: 2020-09-30-01

ORIGINEEL EXEMPLAAR

VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE L.S en Z.L.S INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Nieuwe installatie
Plaats van onderzoek: Mechelbaan 665 C/102 2580 Putte
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4.
Inspectiedatum: 28-09-2020
Inspecteur: Peter RAL
Eigenaar: Schelfout Christiaan
Cont.Pers.:
Startdatum van de werken: voor 06/2020

Type lokalen: Appartement
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname
Andere reglement:
Volgende controle op: 28-09-2021 of binnen de: 299 maanden
Installateur: BG ELECTRO bvba, AV-Solutio
B.T.W.: BE0896939105
tel.:
Referentie documenten:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS
EAN nr.: 541448860019383310

Teller:
1SAG3100106951

Merk: Dims

Type stroom: Wisselspanning

Stand I:

Stand II:

Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Dienstspanning: 3N400V

I max. aansluiting: 40A

Bescherming van de hoofdaansluiting:
aut.4p 32A

Aantal geleiders: 4

Doorsnede:

Meter-bordverbinding:

Kabeltype:

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Geviseerd en conforme schema's : JA

Beschrijving installatie:

☒ zie schema in bijlage

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde

Inventaris van d uitwendige invloedsfactoren aanwezig en ondertekend: n.v.t.

Bescherming tegen elektrische schokken:

Differentiële testen per testknop: in orde

Foutlus controleren: in orde

Aardelektrode:

type: Pennen

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Materiële en externe invloedsfactoren: n.v.t.

Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA

Verzegeld door een vulling: in orde

Nog niet geplaatst:

Aantal borden: 1

Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: In orde

Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde vld aardspreidingsweerstand: In orde

☒ eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend

Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): In orde

Rechtstreekse aanraking: in orde

Onrechtstreekse aanraking: in orde

Algemene isolatieweerstand: 5 Mohm

Doorsnede: 16 mm²

Spreidingswaarde: 12.1 Ohm

Bijkomende differentieel: 4p 40A/30mA

Aantal eindkringen : 18

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk van Boek 1 (I) - Afwijking (D) - de nummers die verwijzen naar de standaard intrekken

N11 - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

N12 - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak, toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

N13 - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

KEURINGSORGANISME
IBAN:
<http://www.inspectbelgium.be>

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel, 6 - 1300 WAVRE

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be
Schalhoevedreef, 20 T 2800 Mechelen



Opdracht: 7511
Klant / Bedrijf: BG ELECTRO bvba, AV-
Solutio

Klantnr.:
Adres: Pastoor de Herdtstraat 7, 2580
Putte
Voorl.verslagnr.:

Contactpersoon:
BTW: BE0896939105
Uitgiftedatum: 2020-09-30

Verslagnr: 2020093015860460

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA


ORIGINEEL EXEMPLAAR

ADVIES

Volgens de onderafdeling 6.4.6.4.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren: a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;

b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;

c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

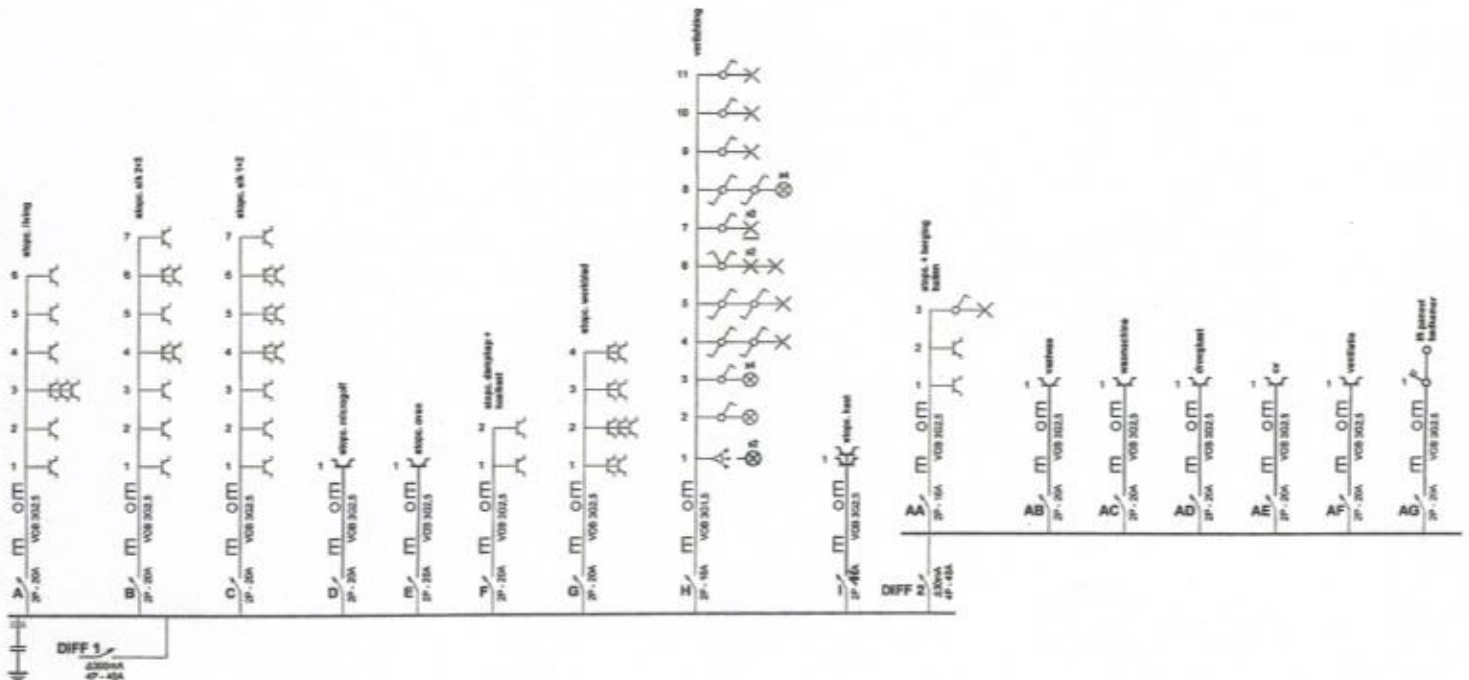

Installation controleur par:
installatie gecontroleerd door:




Avenue Elise, 8 - 1300 Melle - 010/550 577
Inspecteur: RAL Peter
Date / Datum:
PV n°:
Signature / Handtekening:

Plaats van de elektrische installatie
schakelkast christiaan
Michielbaert **665C /102**
2500 putte

Installateur
RD Electro bv
Pastoor de Hondtstraat 7
2500 Putte
Tel.: 010 43 65 72
e-mail: info@rd-electro.be
BTW BE 0206.935.105

p. 1/4
Landelrekening
3 x 400V - N - 50Hz



Insulation certificate per:
Installatie gecombineerd door:



Avenue Ethel, 2 - 1300 Wavre - 016/296 677
Inspecteur: RAL Peter
Date / Datum:
PV n°:
Signature / Handtekening:

[Signature]


Plaats van de elektrische installatie
aansluiting elektrisch
Middelgroot: **665C / 102**
2000 p.u.

[Signature]

Installateur
BO Electro bv
Parc des Herbivores 7
4000 Melle
Tel.: 015 63 65 72
e-mail: info@bo-electro.be
BTW BE 0896 936 106

[Signature]

p. 2/4
Sandozdrichem
3 x 400V - N - 50Hz

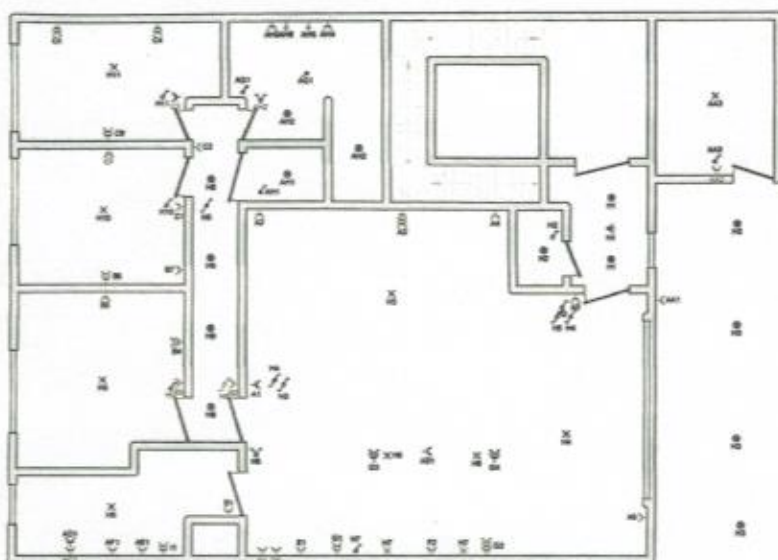

Installation controleur par :
 installatie gecontroleerd door:



Avenue Eiffel, 3 - 1300 Willebroek - 010/280 5177
 Inspecteur : RIAL Peter
 Date / Datum :
 PV n° :
 Signature / Handtekening :

Punts van de elektrische installatie
 schakelbus chassis
 Michaelsson 2500 putte

665C/ 102

Installateur
 800 Breinse bu
 Paccor de Hendrikse 7
 2500 Putte
 010/280 5177
 e-mail: info@paccor.be
 BTW BE 0556 938 125

p. 3/4
 Bladzijde

3 x 400V + N - 50Hz

DIFF 1

- A stopc. living
- B stopc. shk 2+3
- C stopc. shk 1+2
- D stopc. microgolf
- E stopc. oven
- F stopc. dampkap + koelkast
- G stopc. verfbad
- H verlichting
- I stopc. kast

DIFF 2

- AA stopc. + berging buiten
- AB verlies
- AC wasmachine
- AD droogkast
- AE cv
- AF ventilatie
- AG 01 panel bedkamer
- AH verlichting wc + badkamer
- AI reserve

Installatie controle per:
Installatie gecontroleerd door:



Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010080 577
Inspecteur: RAL Peeter
Date / Datum:
PV nr:
Signature / Handtekening:

[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie
aantal meterkasten
2500 putte

665C / 102

[Handwritten signature]

Installateur
S&S Electric bv
Polder de Herdelaan 1
2040 Putte
Tel: 015 63 63 72
E-mail: info@sas-electric.be
BTW BE 0886 235 105

[Handwritten signature]

p. 44
Lijst Koningen
3 x 400V + N - 50Hz
